

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

• Programado: 90.03%

• Semanal: 1.00%

• Real: 91.0%

• Financiero: 36.54%

- 

Inversión total 2025-2026: 630 mdp
Meta total: 1.2 km (puente, accesos y vialidades complementarias)
- 

Inversión 2025: 230.23 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 0.68 km **(56.55% del puente (subestructura y accesos))**
Inversión 2026: 399.77 mdp
Meta 2026: 0.52 km **(43.45% del puente (superestructura y accesos))**

- 

Inicio: 03-Julio de 2025
Término: Abril de 2026
Término meta 2025: Diciembre
Término meta 2026: abril

- 

157,048 habitantes beneficiados

- 

1,890 empleos generados


- 

15 min ahorro en tiempo

Beneficios Reducción de tiempos de traslado al poder realizar el cruce de las vías del tren, evitando tiempos de espera prolongados y “cuellos de botella”, así mismo, permitiendo agilizar el tránsito local.

Paso superior con 2 cuerpos y 3 carriles por sentido


Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: 2026 NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN, CONTRATO 2025 FINALIZADO 31-DIC-2025

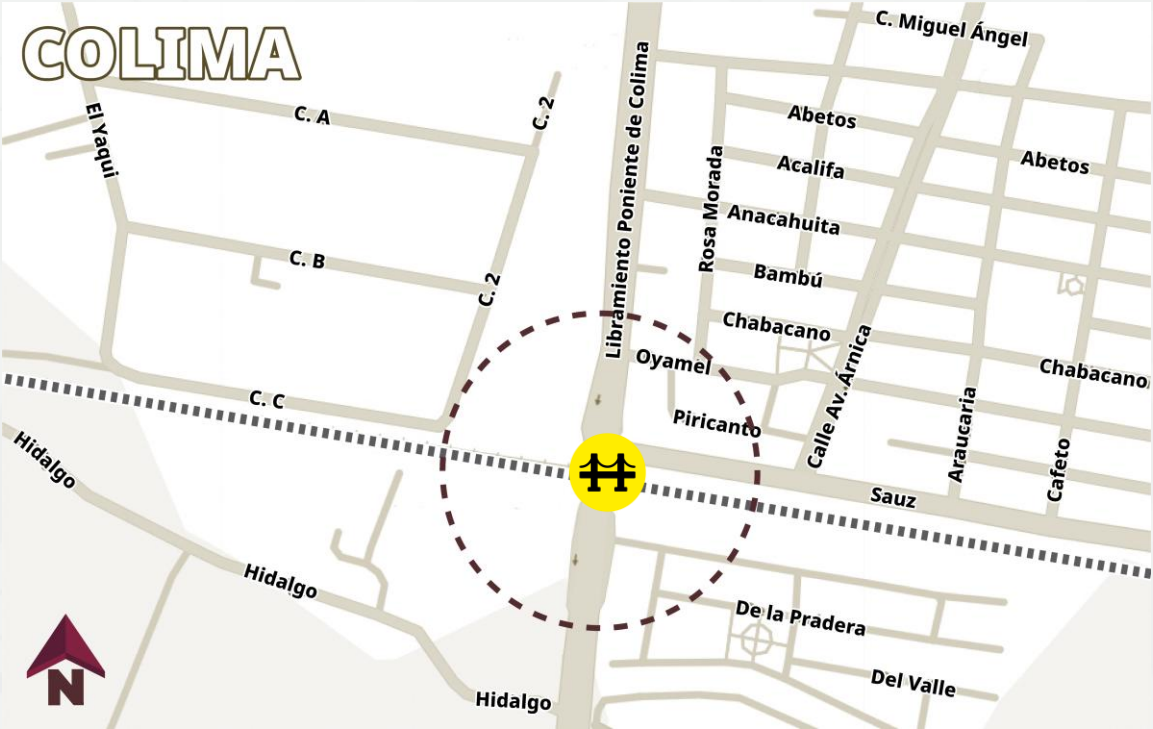

PSF Arco Sur

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

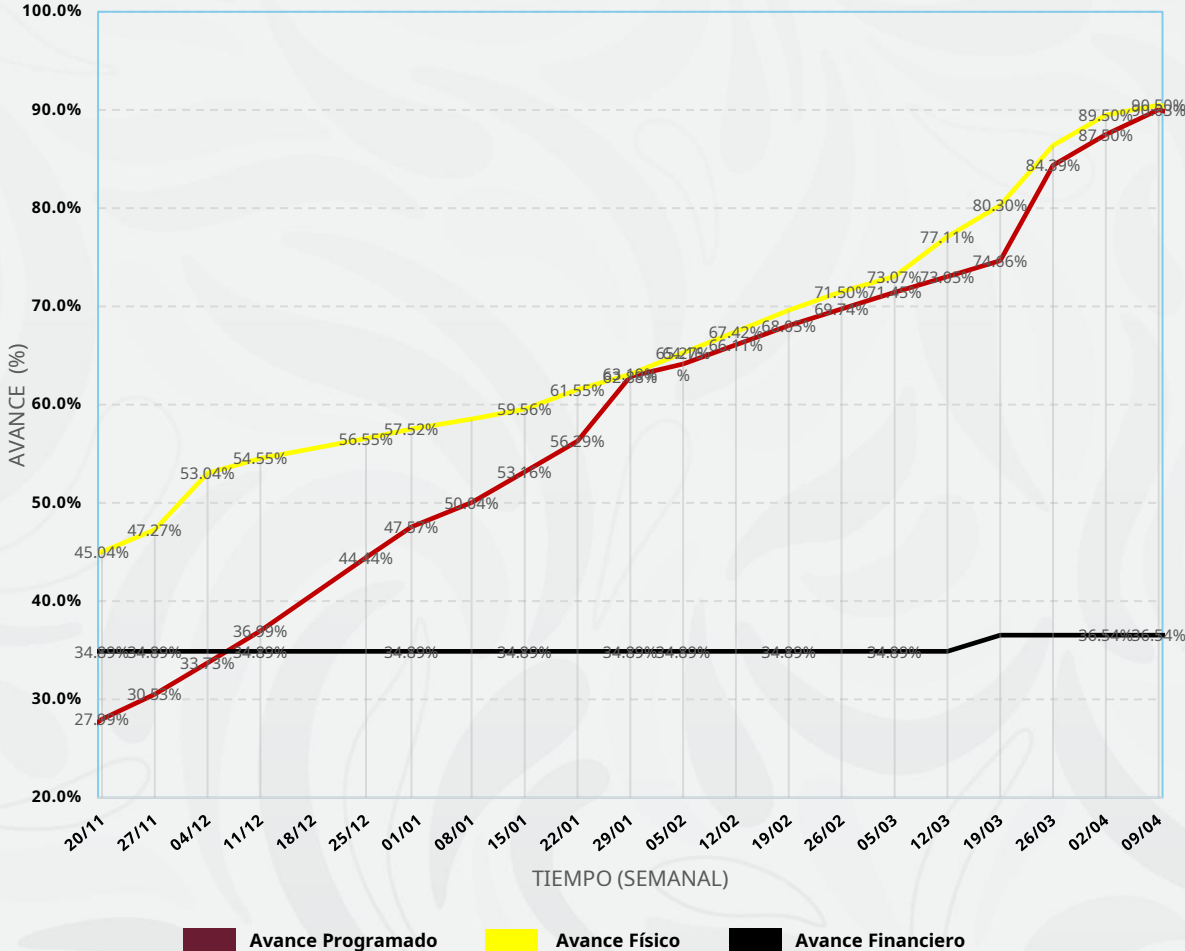

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	03/04/2026 al 09/04/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2,477.55	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Puente lateral (pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida.
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	994.56	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	790.42	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Accesos al PSF						
Terracerías (m3)	7,319.03	7,319.03	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Base Hidráulica (m3)	5,568.82	5, 568.82	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Carpeta asfáltica (m3)	1,909.32	1909.32	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Muros MME						
Muro MME (m2)	2,842.74	2,842.74	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Carpeta asfáltica (m3)	1,402.30	1,262.07	140.23	8.33	243.75	
Guarnición MME (m)	944.47	755.57	188.90	96.31	45.57	
Subestructura PSF						
Pilas (pza)	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Columnas (pza)	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida

	27 de marzo al 02 de abril	03 al 09 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	153	153
Maquinaria	26	32
Fuerza de trabajo	11	11
