

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 79.3%
 - Real: 85.79%

(Concluido, se trabajan vialidades laterales)
- Semanal: 1.4%
 - Financiero: 60.13%

- 

Inversión total 2025-2026: 404.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total
- 

Inversión 2025: 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km
- 

Inicio: 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales
- 

862,037 Habitantes beneficiados
- 

1,215 empleos generados
- 

20 min ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
 - Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

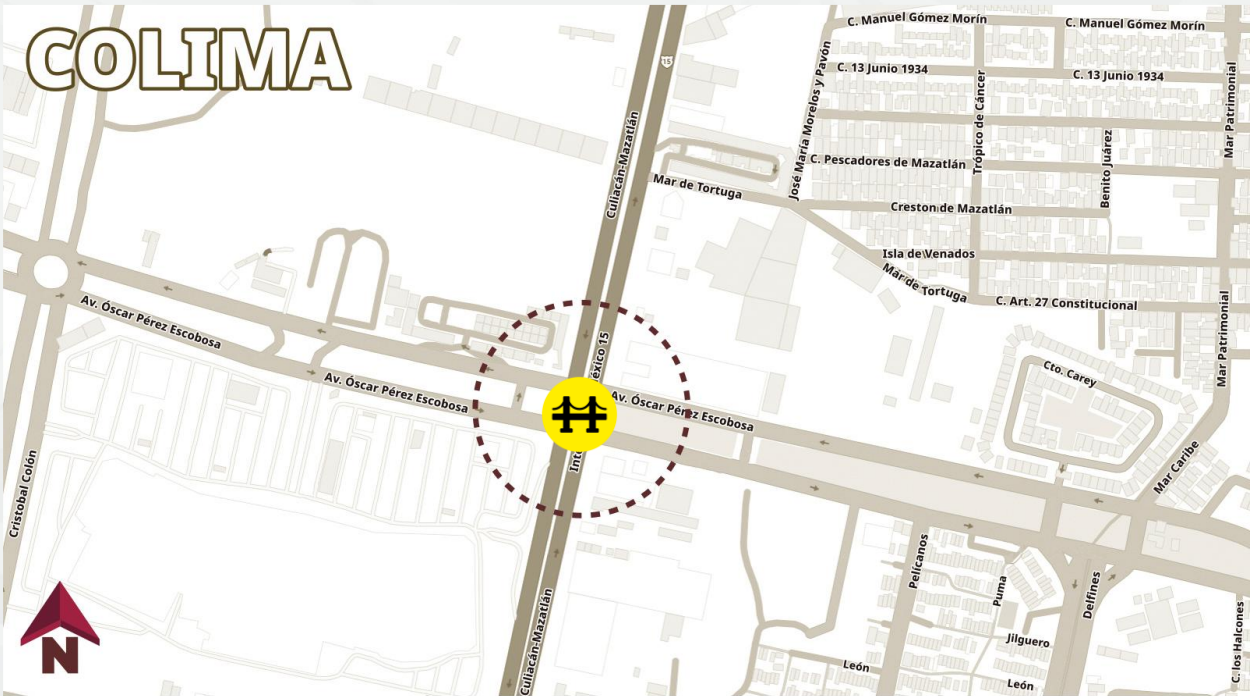

Nivel de Servicio C



Situación actual


Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 03/04/2026 al 09/04/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	-	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	-	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico Accesos	Pieza	3	3	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Parapeto	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	1	50.0%	1	0.5	0.0	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Alumbrado	Actividad	2	2	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Señalamiento	Actividad	2	0.25	12.5%	2	0.3	0.0	En proceso
Semaforización	Actividad	1	1	100.0%	0	-	0.0	Concluido
Barrera Central	m	587.0	587.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,291.9	38.8%	2,037.91	416.2	30.2	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,243.9	38.8%	1,962.21	356.2	29.0	En proceso
Tuberia P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	300	38.8%	473.25	85.9	7.0	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	2,334.0	46.4%	2,698.0	0	225.0	En proceso
Relleno Fluido	m3	2,174.0	1,094.0	50.3%	1,080.0	0	0.0	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	4,368	18.7%	19,052.0	0	0.0	En proceso
Banqueta	m2	6,922.0	2,128.0	30.7%	4,794.0	0	540.0	En proceso
Relleno	m3	692.0	464.0	67.1%	228.0	0	0.0	En proceso

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

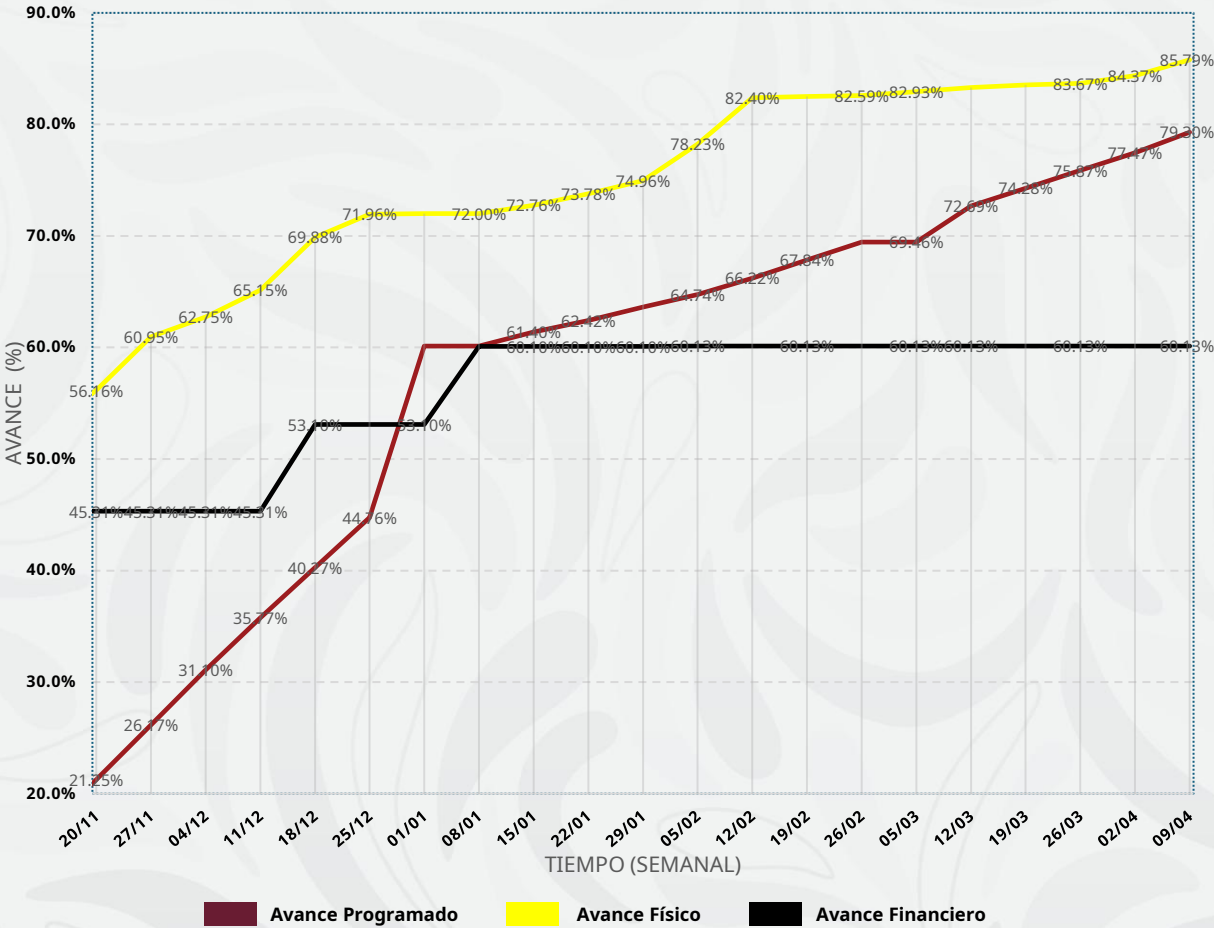

	Del 27 de Marzo al 02 de Abril	Del 03 de Abril al 09 de Abril
Personal	83	83
Maquinaria	14	14
Frentes de trabajo	7	7
