

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala



Avance global

- Programado: 38.57%
- Semanal: 0.00%
- Real: 47.30%
- Financiero: 24.10%




Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)






Meta 2025: 38% de 1 Distribuidor Vial

Inversión 2026: 600 mdp

Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial




Término meta 2025: Diciembre 2025
Término meta total: Julio de 2026



Beneficios Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.

Paso superior con dos carriles por sentido


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	- Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., - Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

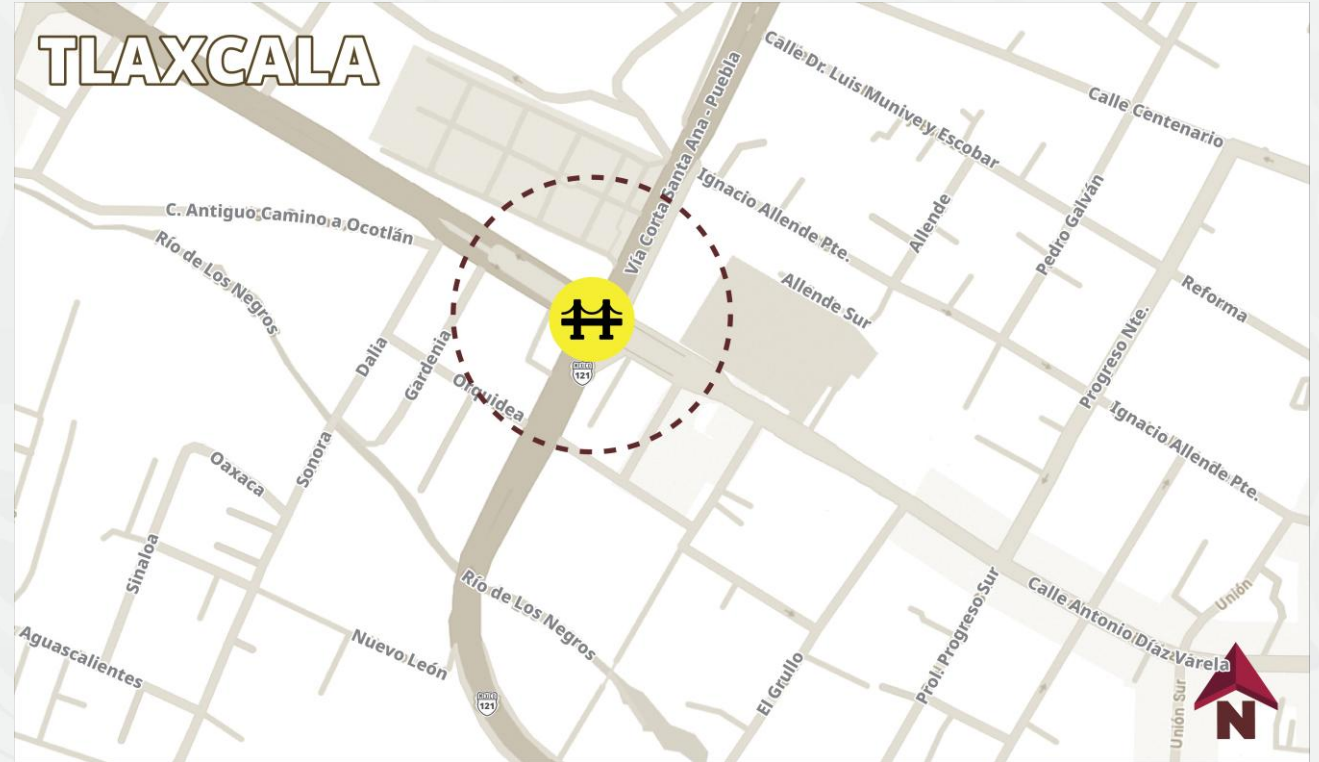

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	Del 03-04-26 al 09-04-26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribui dor Vial	47.30% 1 Distribuidor Vial	52.70% de 1 Distribuidor Vial	1.72%	0.00%	Se trabaja en: cabezales metálicos (arandelas y tuercas) descimbra en losas y construcción de columnas de 1.50 m de f.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

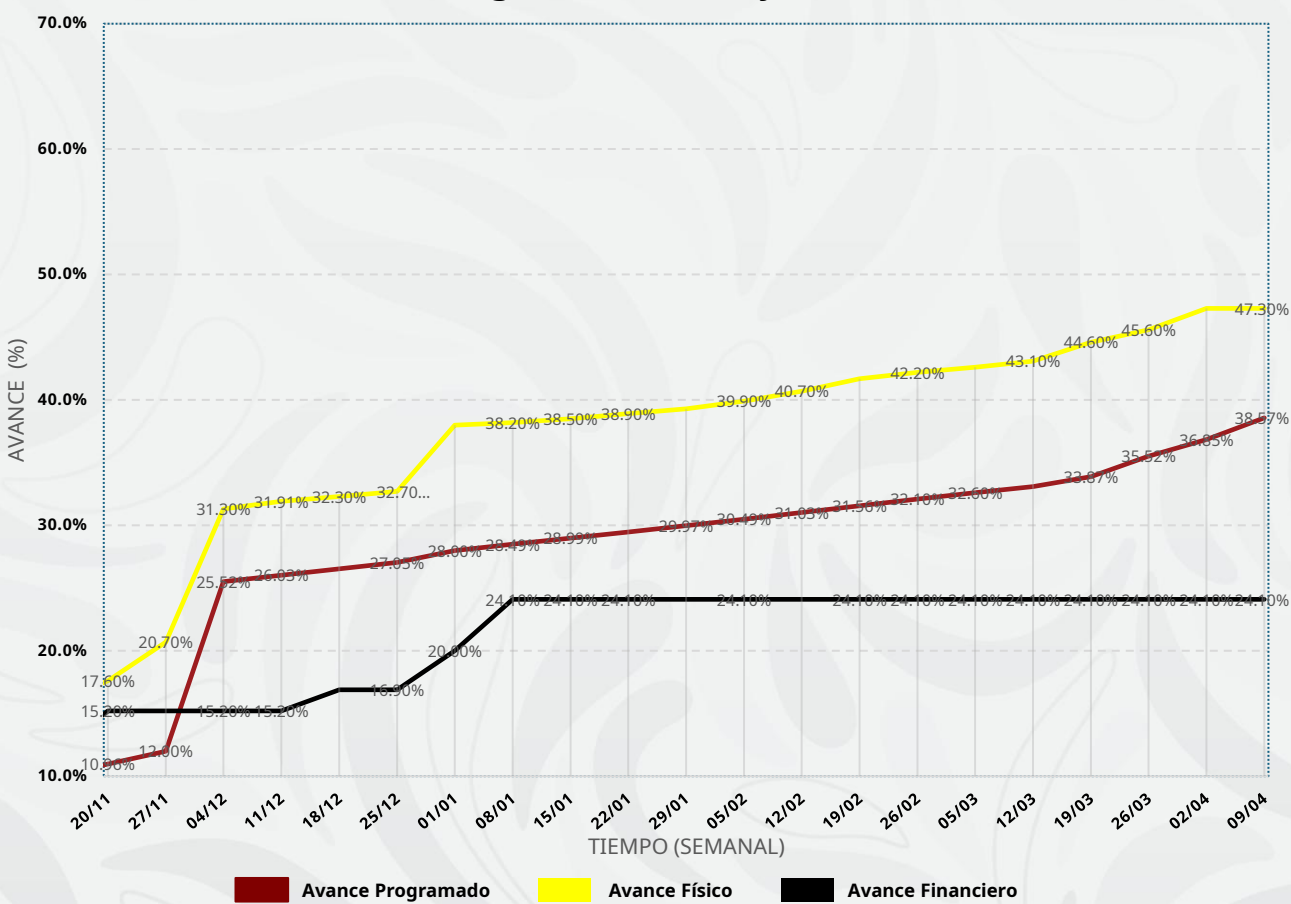

	27 de marzo al 02 de abril	03 al 09 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	53	40
Maquinaria	15	10
Frente de trabajo	7	6
