

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco




Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 43.52%
- Real: 69.86%
- Semanal: 2.02%
- Financiero: 40.7%

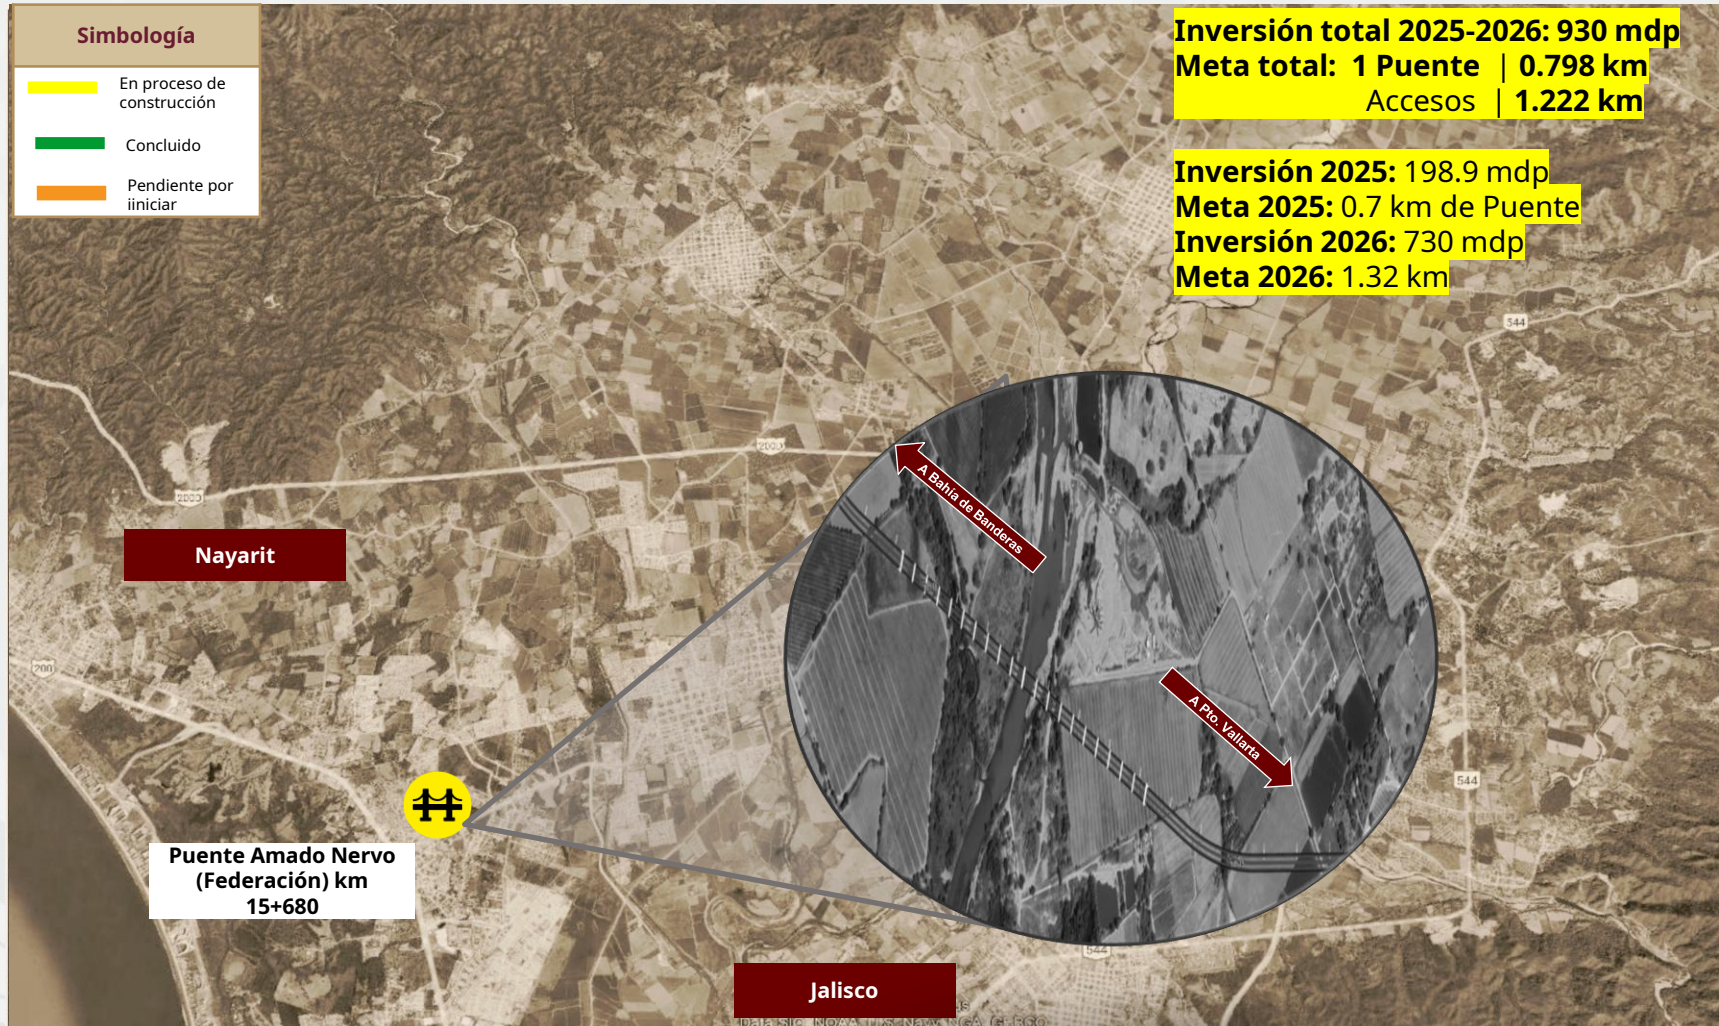

De acuerdo al cierre de SHCP 2025



Inversión total 2025-2026: 898.9 mdp
Meta total: 1 Puente | 0.798 km
Accesos | 1.222 km



Inversión 2025: 198.9 mdp
Meta 2025: 0.7 km de Puente
Inversión 2026: 700.0 mdp
Meta 2026: 1.32 km



Inicio: 14 de julio de 2025
Término: Julio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026



479,471 habitantes beneficiados



2,790 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios

Se crea una vía alterna que permita agilizar el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Empresas


- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Avance Programado - Físico - Financiero (%)

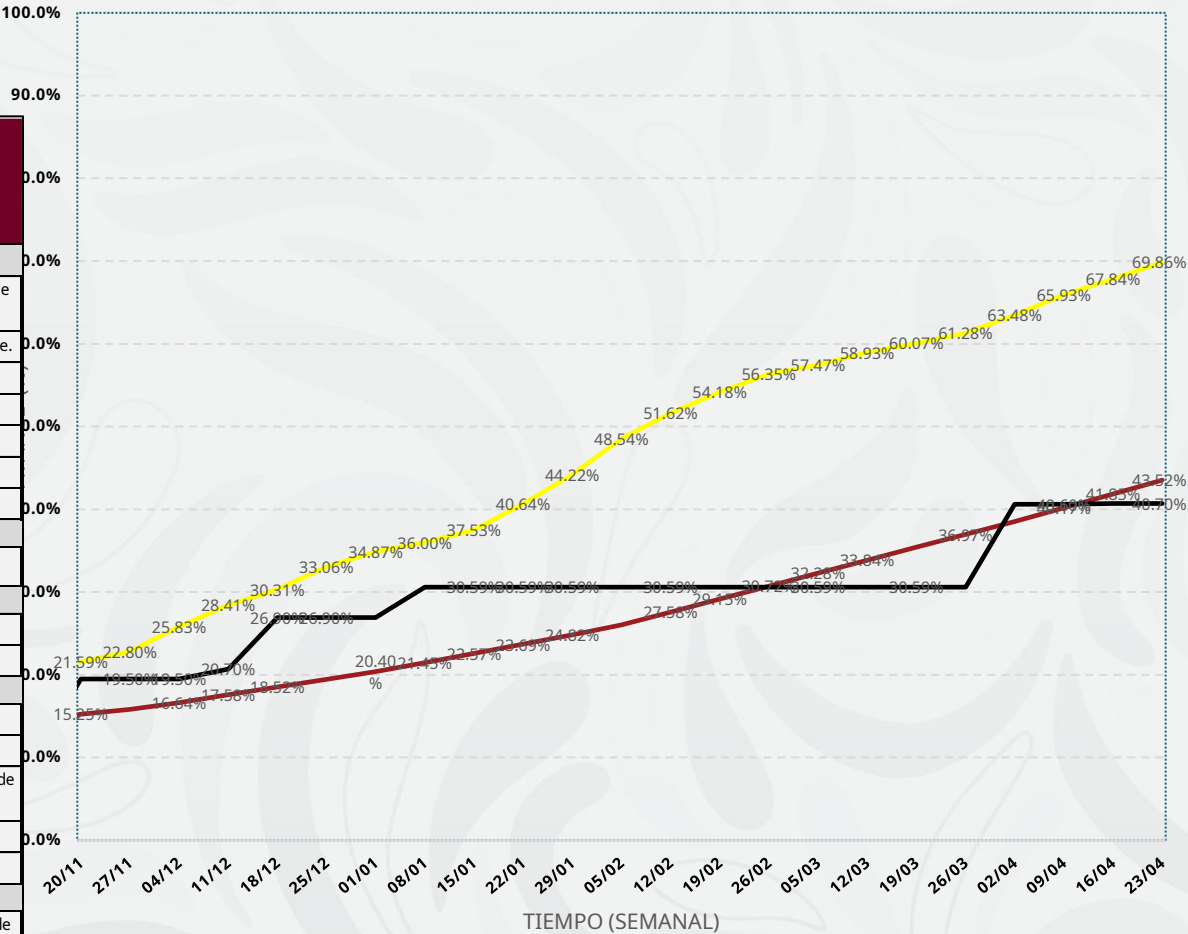

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	10 de Abril al 16 de abril	17 de Abril al 23 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	118	120
Maquinaria	23	23
Frentes de trabajo	6	6

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 17 al 23/04/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Se tienen detenidas las actividades de accesos.
Despalme	m3	14,042.0	11,770.0	83.8%	2,272.0	3,014.00	742	Se reanuda parcialmente el despalme.
Cortes	m3	10,823.0	0.0	0.0%	10,823.0	5,411.50	0	Sin actividades
Terraplenes	m3	161,117.0	82,242.6	51.0%	78,874.4	4,054.10	8,761	Se tienen detenidas las actividades.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	309.60	0	Sin actividades
Carpeta de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	484.80	0	Sin actividades
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	11.00	0	Sin actividades
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	126	100.0%	0	-	-	Concluidos
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	126	100.0%	0	-	-	Concluidos
Cabezales	pza.	21	21	100.0%	0	-	-	Concluidos
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	160	100.0%	0	-	-	Concluidos
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	160	100.0%	0	-	0	Concluidos
Losas y Diafragmas	m3	4,918.00	2,945.6	59.9%	1,972.40	278	471	Se tienen coladas 7 losas y 29 líneas de disfragmas
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	399	0	Sin actividades
Obras de Drenaje	pza.	4.00	2.3	57.5%	1.70	2	0	Sin actividades
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	1.7	85.0%	0.30	0.4	0	Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	Sin actividades
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	Sin actividades
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	Sin actividades
