

Puente El Chical

Colima

CONCLUIDA

Avance global

- Programado: 100.0 %
- Real: 100.0%
- Semanal: 3.18 %
- Financiero: 76.35 %

 **Inversión total 2025-2026:** 137.0 mdp
Meta total: 0.736 km (0.360 km estructuras y 0.376 km accesos)

 **Inversión 2025:** 21.4 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 71.12 % del Puente
Inversión 2026: 115.6 mdp
Meta 2026: 28.88 % del Puente


 **Fecha de inicio:** 11 de agosto 2025
Fecha de término: 23 abril 2026

 **4,053** habitantes beneficiados

 **411** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

Beneficios: La obra representa una mejora significativa en la seguridad vial y una reducción de riesgos durante eventos pluviales, garantizando además la conectividad permanente del poblado El Chical con el municipio de Coquimatlán y las zonas cercanas. Asimismo, contribuye a la reducción de los tiempos de traslado para habitantes y usuarios de la vía, facilita un mayor acceso a servicios básicos como hospitales, escuelas y comercios, e impulsa el desarrollo social y económico de la región mediante una infraestructura más confiable y segura.

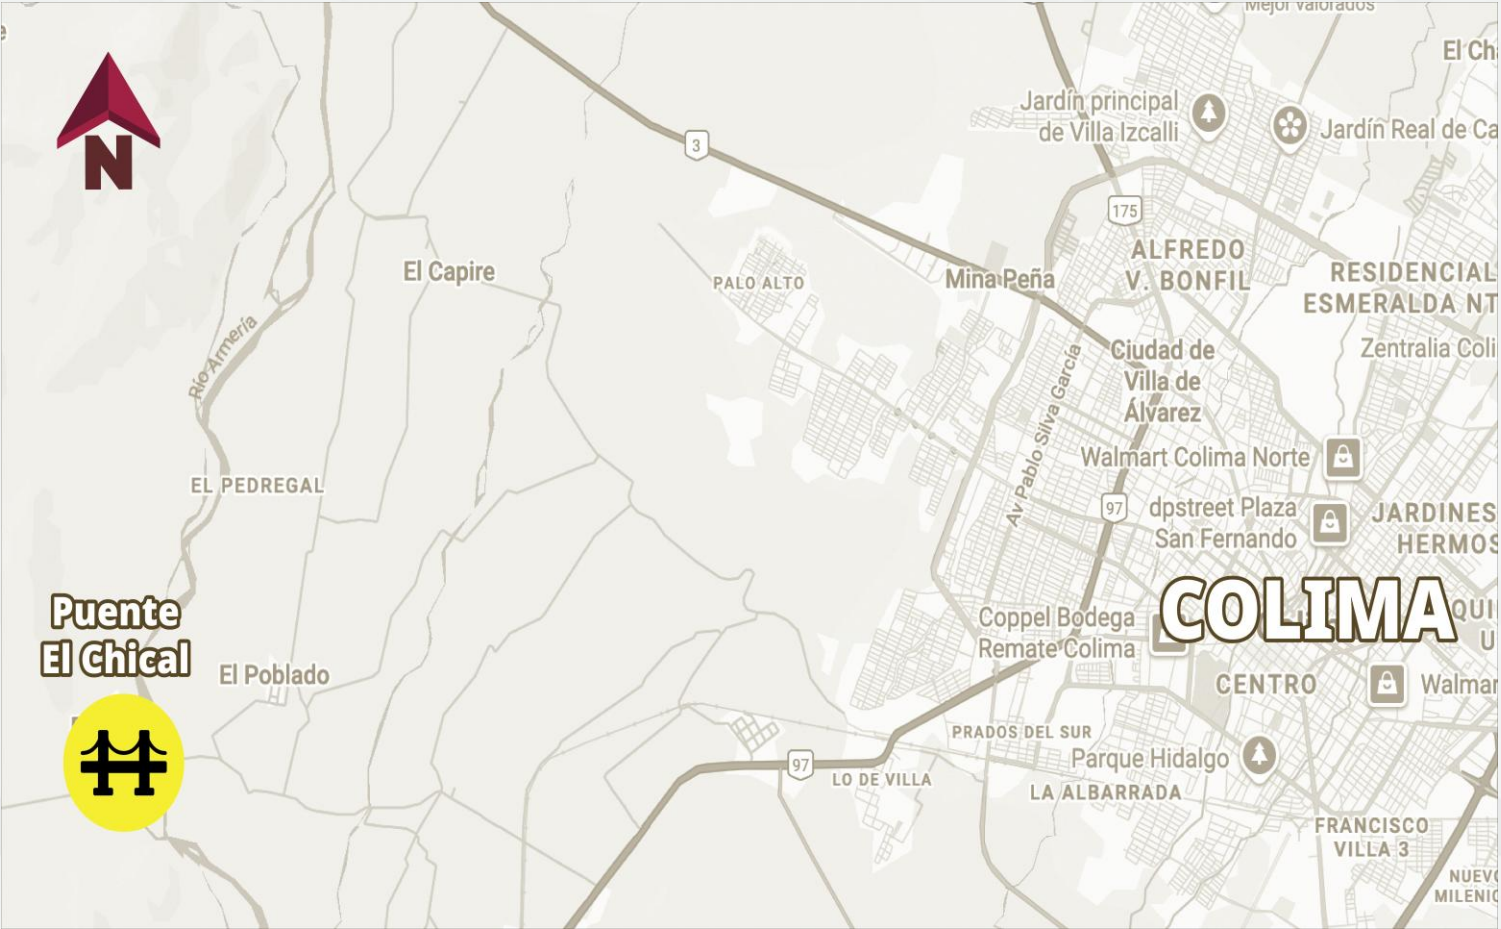

Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLA COMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERIA, S.A DE C.V

Puente El Chical

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	17/04/26 al 23/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Columnas (Pza)	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Montaje de trabes (Pza)	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	648.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Carpeta Asfáltica (m3)	416.8	416.8	0.0	416.8	416.8	Trabajos concluidos
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	720.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	139.0	0.0	78.0	78.0	Trabajos concluidos
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	125,000.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

