



PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 84.12%
 - Real: 87.44%
 - Semanal: 0.41%
 - Financiero: 81.4%
- (Concluido, se trabajan vialidades laterales)



Inversión total 2025-2026: 404.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total



Inversión 2025: 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km



Inicio: 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales



862,037 Habitantes beneficiados



1,215 empleos generados



20 min ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

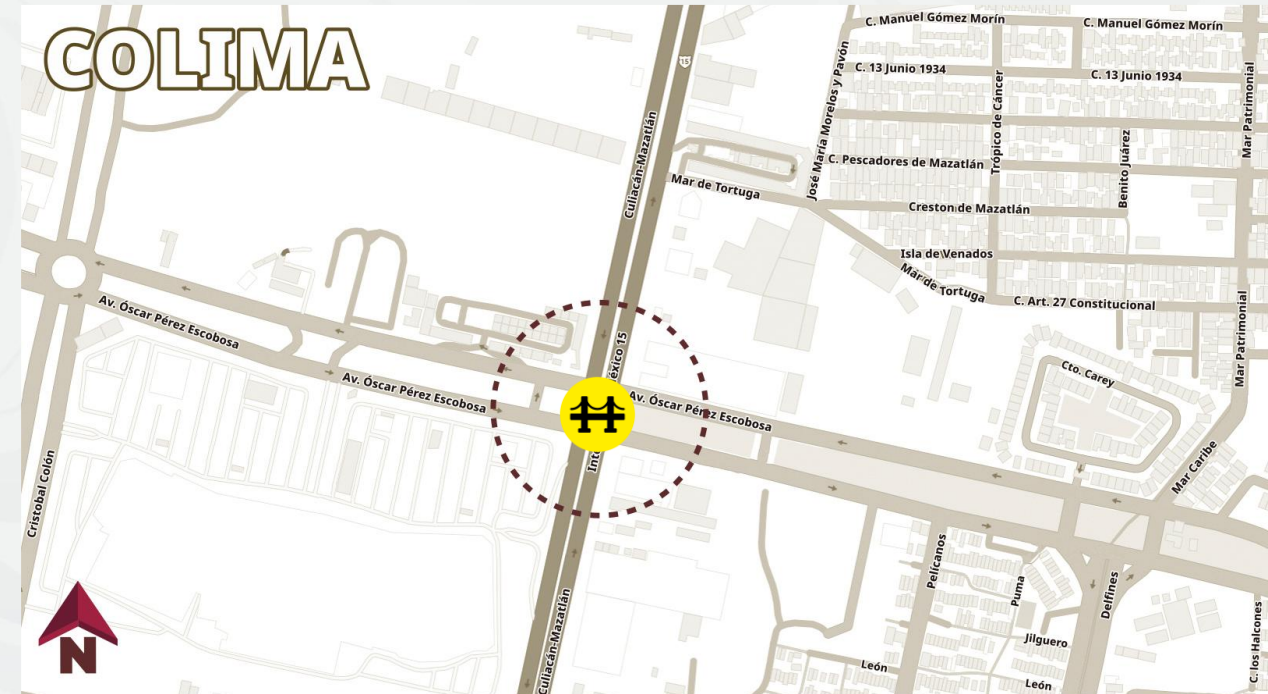


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

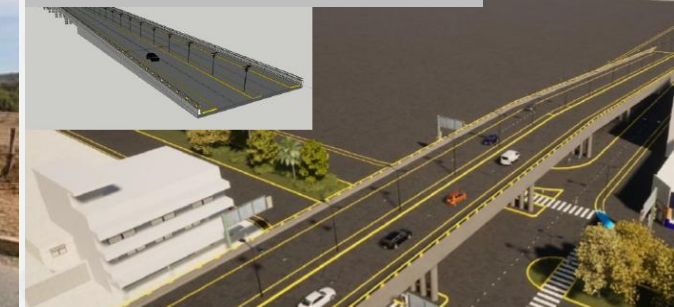


Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa



Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

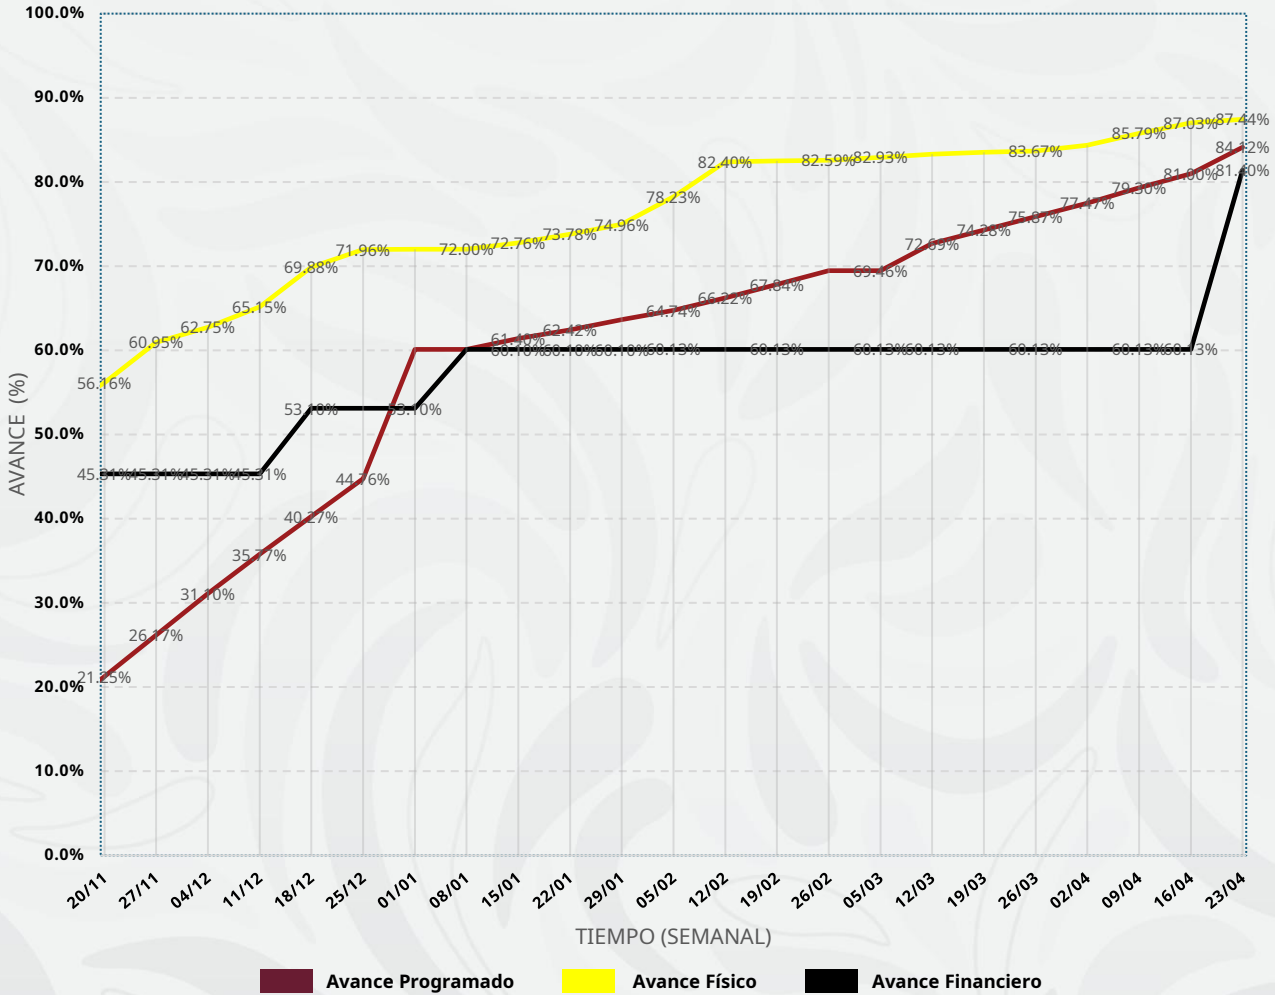

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 17/04/2026 al 23/04/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	1	50.0%	1	0.5	0.0	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Alumbrado	Actividad	2	2	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Señalamiento	Actividad	2	0.25	12.5%	2	0.3	0.0	En proceso
Semaforización	Actividad	1	1	100.0%	0	-	0.0	Concluido
Barrera Central	m	587.0	587.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,291.9	38.8%	2,037.91	416.2	0.0	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,243.9	38.8%	1,962.21	356.2	0.0	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	300	38.8%	473.25	85.9	0.0	En proceso
AGUA POTABLE								
Excavación	m3	1,041.50	588	56.5%	453.06	130.2	588.2	En proceso
Relleno	m3	975.80	551	56.5%	424.48	122.0	551.1	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado aguas negras, serie 20 de 31.5cm de Diam.	m	1,030.10	582	56.5%	448.10	128.8	581.8	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	2,742.0	54.5%	2,290.0	0	183.0	En proceso
Relleno Fluido	m3	2,174.0	1,094.0	50.3%	1,080.0	0	0.0	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	7,468	31.9%	15,952.0	0	0.0	En proceso
Banqueta	m2	6,922.0	3,429.0	49.5%	3,493.0	0	0.0	En proceso
Relleno	m3	692.0	464.0	67.1%	228.0	0	0.0	En proceso

	Del 10 de Abril al 16 de Abril	Del 17 de Abril al 23 de Abril
Personal	83	84
Maquinaria	14	15
Frentes de trabajo	7	7
