


Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance global

- Programado: 29.15%
- Real: 54.18%

- Semanal: 2.56%
- Financiero: 30.59%

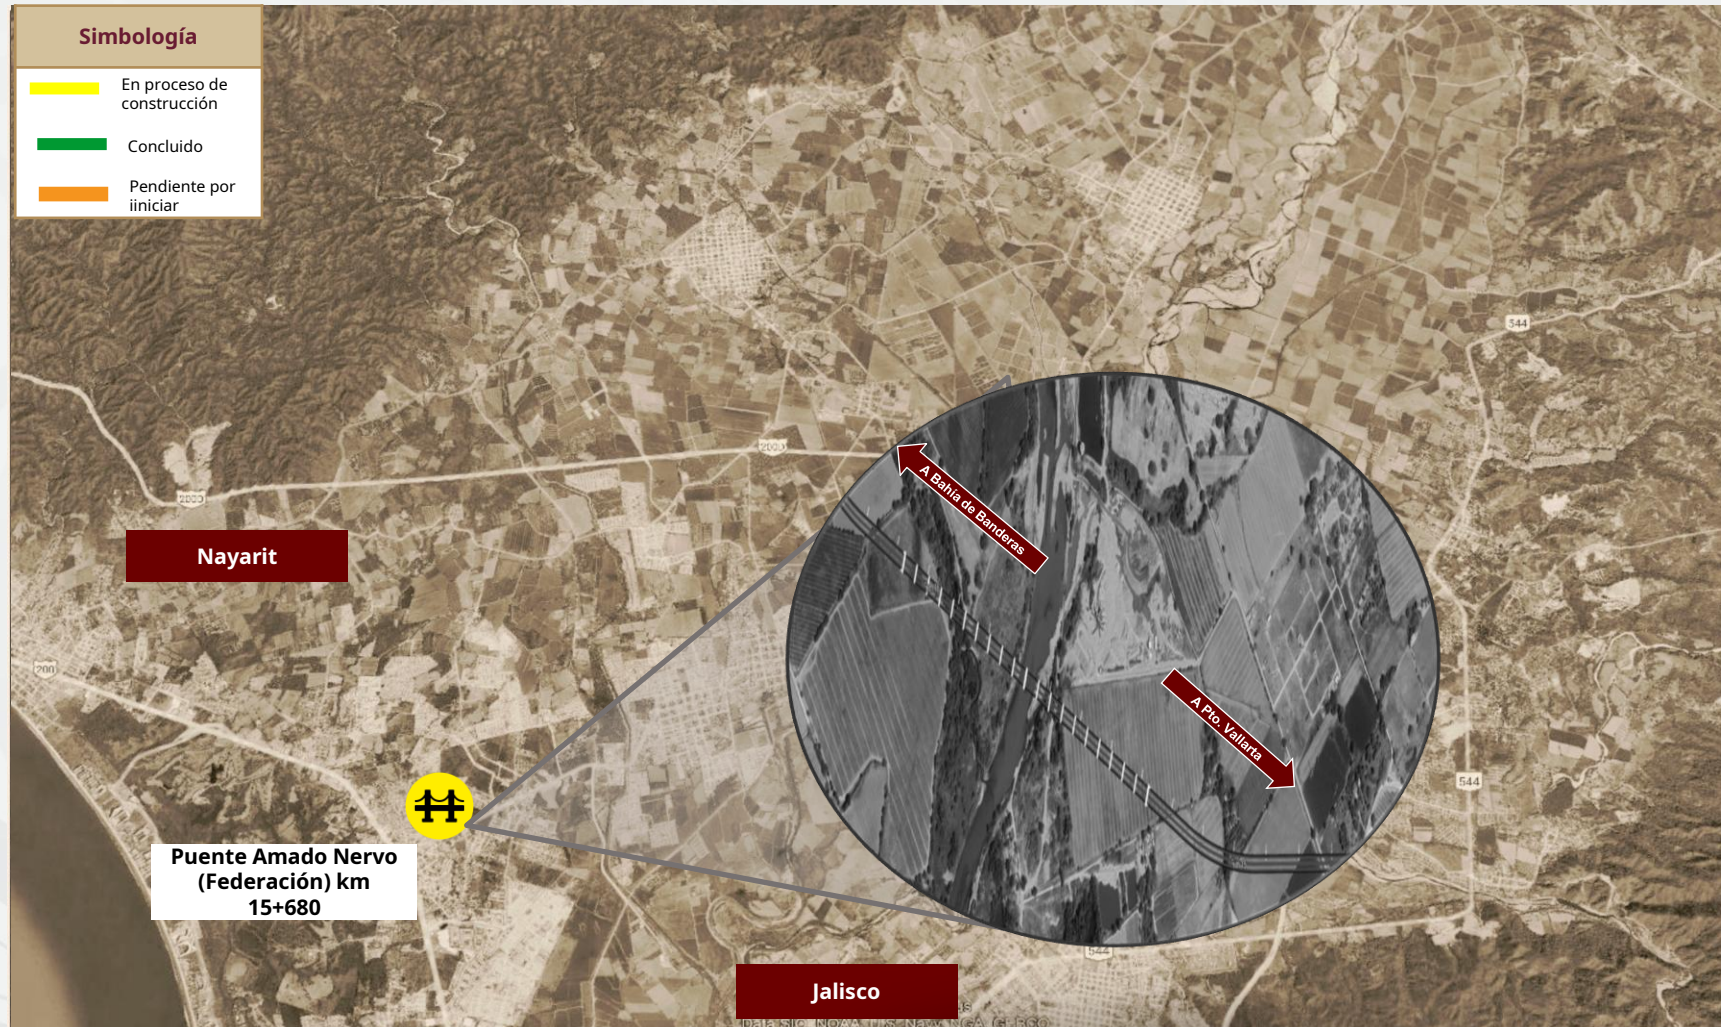

 **Inversión total 2025-2026:** 930.0 mdp
Meta total: 1 Puente | 0.798 km
Accesos | **1.222 km**

 **Inversión 2025:** 230.0 mdp
Meta 2025: 0.7 km de Puente
Inversión 2026: 700.0 mdp
Meta 2026: 1.32 km

 **Inicio:** 14 de julio de 2025
Término: Septiembre de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

 **479,471** habitantes beneficiados

 **2,700** empleos generados

 **25 min** ahorro en tiempo

Beneficios

Se crea una vía alterna que permita agilizar el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.


Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 13 al 19/02/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	10,866.0	77.4%	3,176.0	3,176.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco
Cortes	m3	10,823.0	0.0	0.0%	10,823.0	10,823.00	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	52,698	32.7%	108,419.0	3,872.10	0	Se continuan trabajos de pedraplén en lado Jalisco.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	309.60	0	
Carpeta de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	484.80	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	11.00	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	126	100.0%	0	0	0	Concluidos
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	126	100.0%	0	0	0	Concluidos
Cabezales	pza.	21	20	95.2%	1	1	0	Se tienen colados 18 cabezales de los apoyos 1 al 6, 8, 9 y 12 al 21
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	143	89.4%	17	6	11	Se tienen coladas 114 trabes y se trabaja en los armados de 2 adicionales.
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	104	65.0%	56	8	16	Se tienen montados los claros 5-6, 14-15 , 16-17, 18-19 y 19-20. Se encuentran en proceso 4-5 y 17-18
Losas y Diafragmas	m3	4,918.00	324.0	6.6%	4,594.00	278	164	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	399	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	2.3	57.5%	1.70	2	0	Se continúa el acomode de cajones de concreto prefabricados en el lado Jalisco.
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	1.5	75.0%	0.50	0.5	0	Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

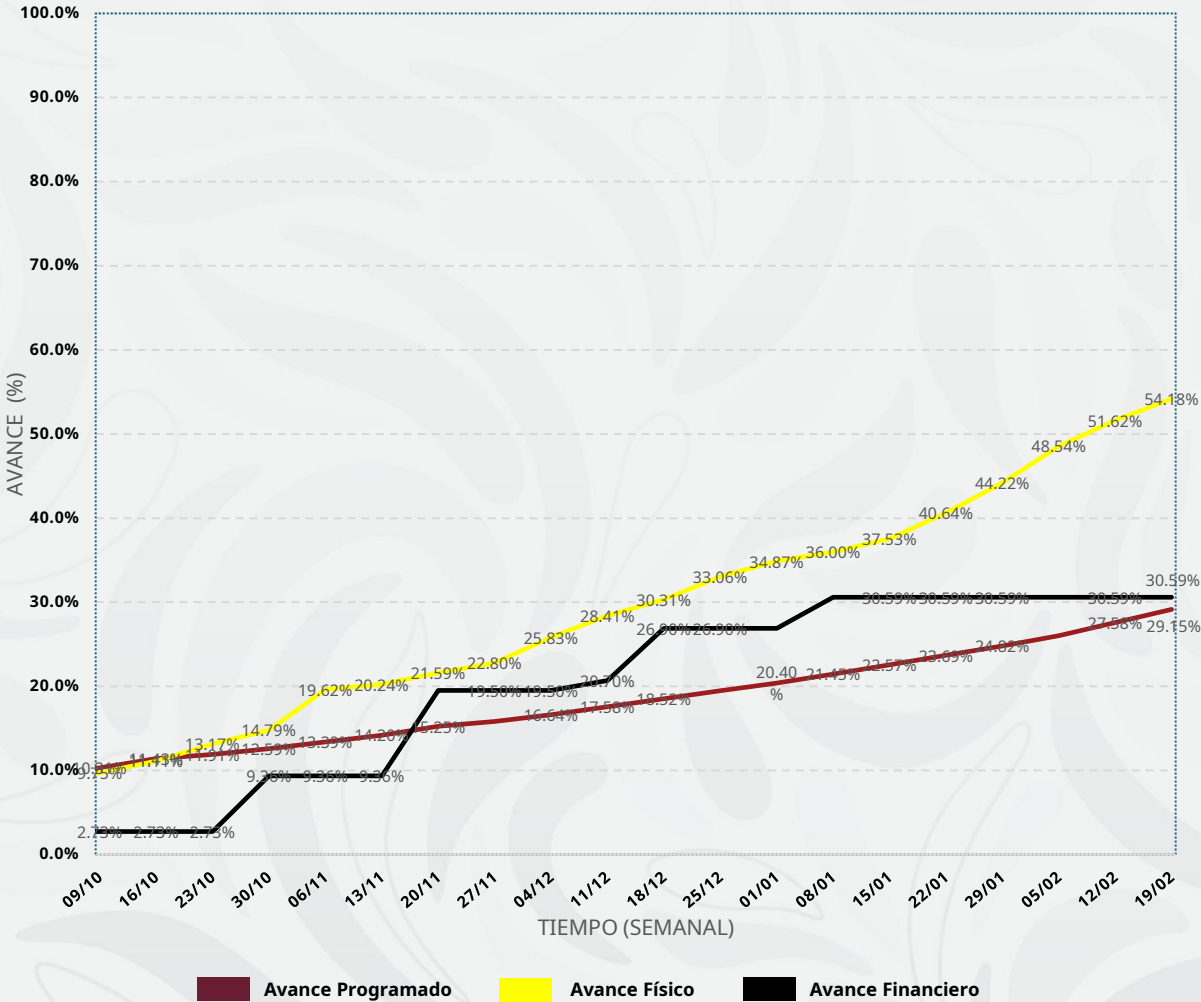

	30 al 05 de Febrero	13 de Febrero al 19 de Febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	95	87
Maquinaria	21	21
Frentes de trabajo	5	5
