

# PSF Arco Sur

## Colima

**Avance global**


- Programado: 68.05%
- Real: 69.62%
- Semanal: 2.2%
- Financiero: 47.22%

-  **Inversión total 2025-2026:** 630 mdp
  - Inversión 2025:** 280 mdp
  - Inversión 2026:** 350.0 mdp
-  **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)
  - Meta 2025:** 0.55 km (46% del puente (subestructura y accesos))
  - Meta 2026:** 0.65 km (54% del puente (superestructura y accesos))
-  **Inicio:** 03-Julio de 2025
  - Término:** Abril de 2026
  - Término meta 2025:** Diciembre
  - Término meta 2026:** Abril

-  **157,048** habitantes beneficiados
-  **1,431** empleos generados
-  **15 min** ahorro en tiempo

**Beneficios** Reducción de tiempos de traslado al poder realizar el cruce de las vías del tren, evitando tiempos de espera prolongados y “cuellos de botella”, así mismo, permitiendo agilizar el tránsito local.


| Tramo        | Empresas                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PSF Arco Sur | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> COCONAL S.A P. I DE C.V</li><li>• <b>Supervisión:</b> NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN CONTRATO FINALIZADO 31-DIC-2025</li></ul> |

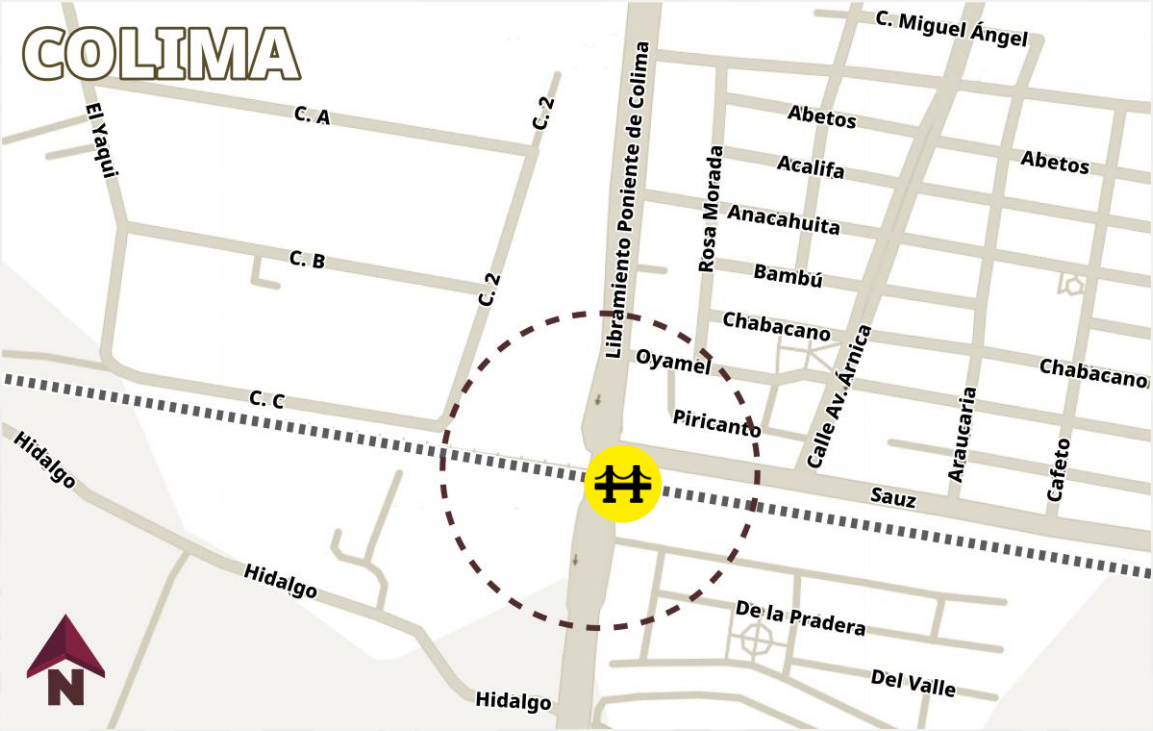

# PSF Arco Sur

## Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

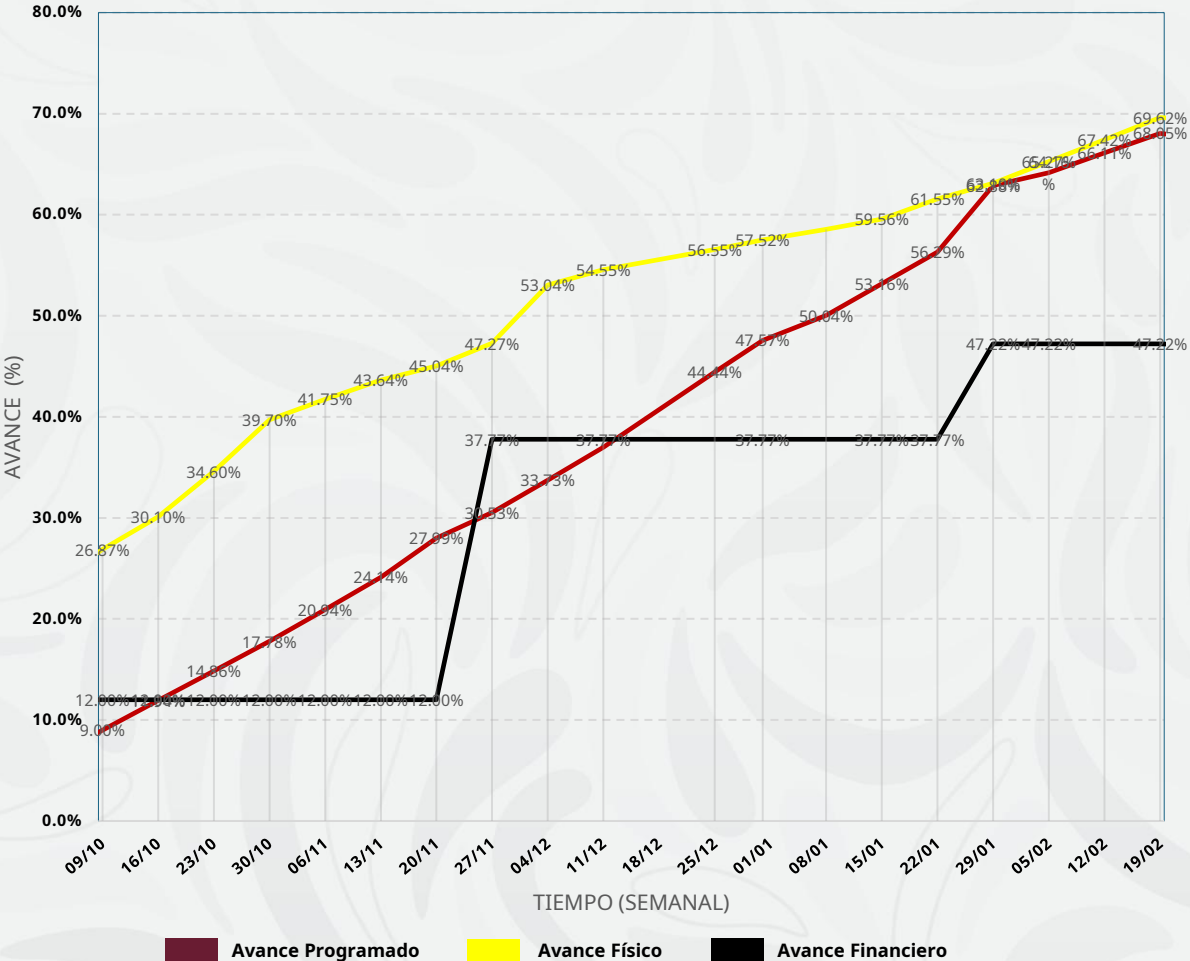

| Elemento                               | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante | 13/02/2026 al 19/02/2026 |           | Observaciones      |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------|
|                                        |              |                     |          | Programado               | Ejecutado |                    |
| Trabajos diversos (pzs)                | 254.00       | 254.00              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Reubicación de obras inducidas (m)     | 2,477.55     | 2, 477.55           | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Construcción de cruce prov. FFCC (pza) | 223.00       | 223.00              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Puente lateral (pza)                   | 4.00         | 4.00                | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida. |
| Adecuación lateral no. 1 (m3)          | 994.56       | 994.56              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Adecuación lateral no. 2 (m3)          | 790.42       | 790.42              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Accesos al PSF (m)                     | 896.00       | 536.93              | 359.07   | 41.89                    | 19.17     |                    |
| Subestructura PSF                      |              |                     |          |                          |           |                    |
| Pilas (pza)                            | 104.00       | 104.00              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Zapatas (pza)                          | 20.00        | 20.00               | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Columnas (pza)                         | 40.00        | 40.00               | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Cabezales (pza)                        | 24.00        | 24.00               | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Apoyos (pza)                           | 168.00       | 8.00                | 160.00   | 8.40                     | 1.48      |                    |

|                              | 05 al 12 de febrero | 13 al 19 de febrero |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 173                 | 171                 |
| Maquinaria                   | 43                  | 44                  |
| Fuerza de trabajo            | 10                  | 12                  |
