


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 43.20%
- Real: 43.18%
- Semanal: 0.71%
- Financiero: 39.0%

Reprogramación de avances 2026 por parte del CSCT Ver

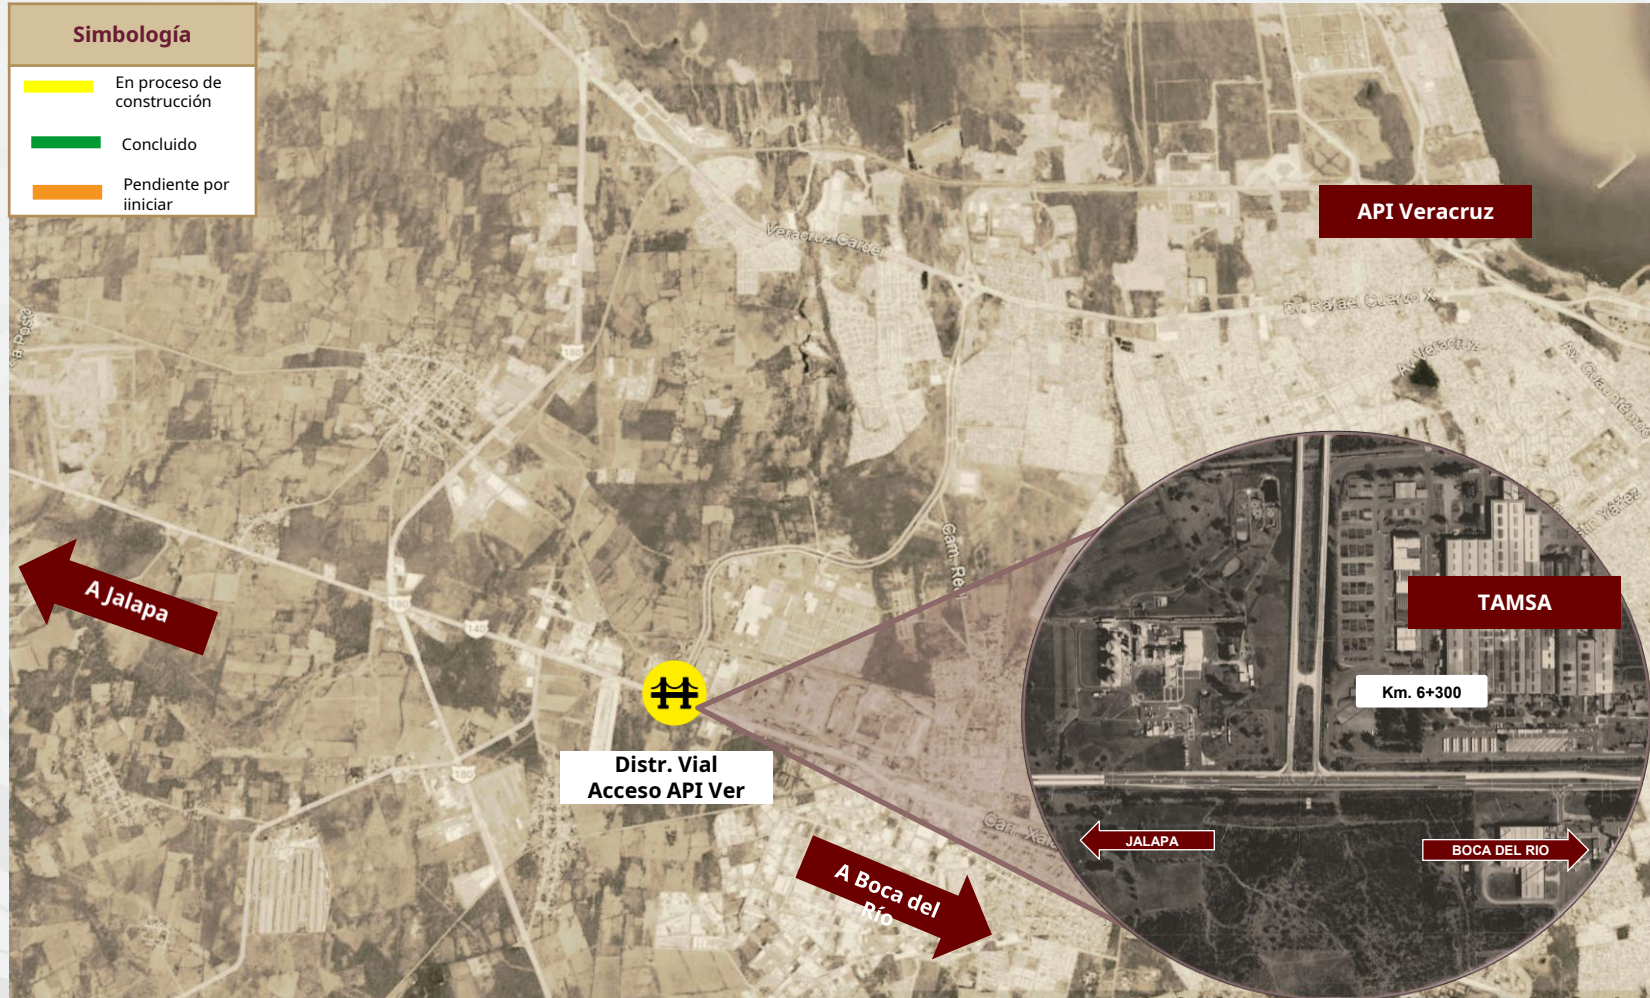

 **Inversión total: 826 mdp 867.3 mdp**
Meta total 2025-2026: 1.97 km

 **Inversión 2025: 326 mdp 367.3 mdp**
Meta 2025: 0.78 km de PSV
Inversión 2026: 500 mdp
Meta 2026: 1.18 km de PSV

 **Inicio: 14 de julio de 2025**
Término meta total: junio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

 **780,441** habitantes beneficiados

 **2,602** empleos generados

 **25 min** ahorro en tiempo

Beneficios

Agiliza el funcionamiento vial en la intersección con el Boulevard de acceso al Puerto de Veracruz en el Entr. TAMSA.

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 13 al 19/02/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.00	622.50	0.0	Concluido en el cpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.09	0.0	
Excavaciones	m³	52,059.00	44,796.0	86.0%	7,263.00	7,263.00	8,225.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	27,530.0	75.1%	9,120.00	9,120.00	0.0	
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	1,377.9	90.0%	153.10	153.10	0.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0.0	0.0%	4,384.00	4,384.00	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	983.0	31.8%	2,107.00	2,107.00	0.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	1.00	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Montaje de trabes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Diafragmas	pza.	110	95	86.4%	15	15	0.0	
Losa (claro)	pza.	22	20	90.9%	2	2	1.0	Se tienen concluidas las losas del 16 al 22 y del claro 7 al 9 y en proceso de construcción 2 losas

