

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)

Avance global

- Programado: 62.87%
 - Real: 71.36%
- Semanal: 0.71%
 - Financiero: 45.43%



Inversión total 2025-2026: 700 mdp
Meta total: 1 Deprimido (1.5 km) y Gasas (4.1 km)



Inversión 2026: 380 mdp
Meta 2026: 0.22 km de Deprimido y 3.83 km de gasas



Inicio: 12 de mayo de 2025
Término: marzo de 2026



351,000 habitantes beneficiados



2,100 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios: Ofrecerá flujo continuo a los usuarios que circulan entre Cabo San Lucas y San José del Cabo y reducirá la probabilidad de accidentes al evitar entrecruzamientos a nivel con el tránsito que circula sobre la carretera federal MEX-001 Cabo San Lucas – La Paz.

Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.




Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)

Avance: Programado, Físico y Financiero

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	13/02/26 al 19/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Reforzamiento Puente Peatonal (lote)	1.0	0.4	0.6	0.25	0.1	
Terracerías y Pavimentos						
Terracerías (m3)	14,112.0	7,990.4	6,121.6	0.0	0.0	
Excavación núcleo (m3)	100,069.2	78,598.0	21,471.2	0.0	1,150.0	
Base hidráulica (m3)	11,840.0	7,447.0	4,393.0	1,315.6	0.0	
Base asfáltica (m3)	5,545.0	868.5	4,676.5	616.1	208.6	
Carpeta asfáltica (m3)	1,992.0	142.1	1,849.9	0.0	0.0	
Relleno fluido (m3)	1,680.0	24.0	1,656.0	336.0	24.0	
Pavimento rígido (m3)	3,552.0	0.0	3,552.0	507.4	0.0	
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas (pzas)	12.0	12.0	-	-	-	Concluido
Muros de 2 a 7 m (pzas)	12.0	12.0	-	-	-	Concluido
Trabes de liga (m)	1,123.6	809.2	314.4	0.0	60.2	
Contratrabes Metálicas (pza)	29.0	0.0	29.0	4.8	0.0	
Limpieza de pilas (m2)	7,000.0	70.0	6,930.0	1,166.7	70.0	
Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	52.0	-	-	-	Concluido
Losas de acceso (m2)	609.8	509.0	100.8	0.0	0.0	
Losas puentes (m2)	1,642.8	1,642.8	0.0	0.0	359.2	Concluido
Parapeto (m)	1,725.2	538.9	1,186.3	0.0	201.9	
Guarnición (m3)	375.0	90.5	284.5	0.0	13.4	
Banquetas (m3)	3,304.2	184.6	3,119.6	0.0	42.1	
Drenaje Pluvial (m)	1,600.0	669.0	931.0	320.0	399.0	
Registros Pluviales (pza)	32.0	3.0	29.0	8.0	3.0	
Semaforización y Señalamiento						
Semaforización (%)	100.0	15.0	85.0	0.0	3.0	
Horizontal (m)	29,901.7	0.0	29,901.7	0.0	0.0	
Vertical (pza)	273.0	0.0	273.0	0.0	0.0	
Obra inducida						
Alumbrado (pza)	305.0	11.0	294.0	0.0	11.0	
Reubicación de la vegetación (pza)	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	

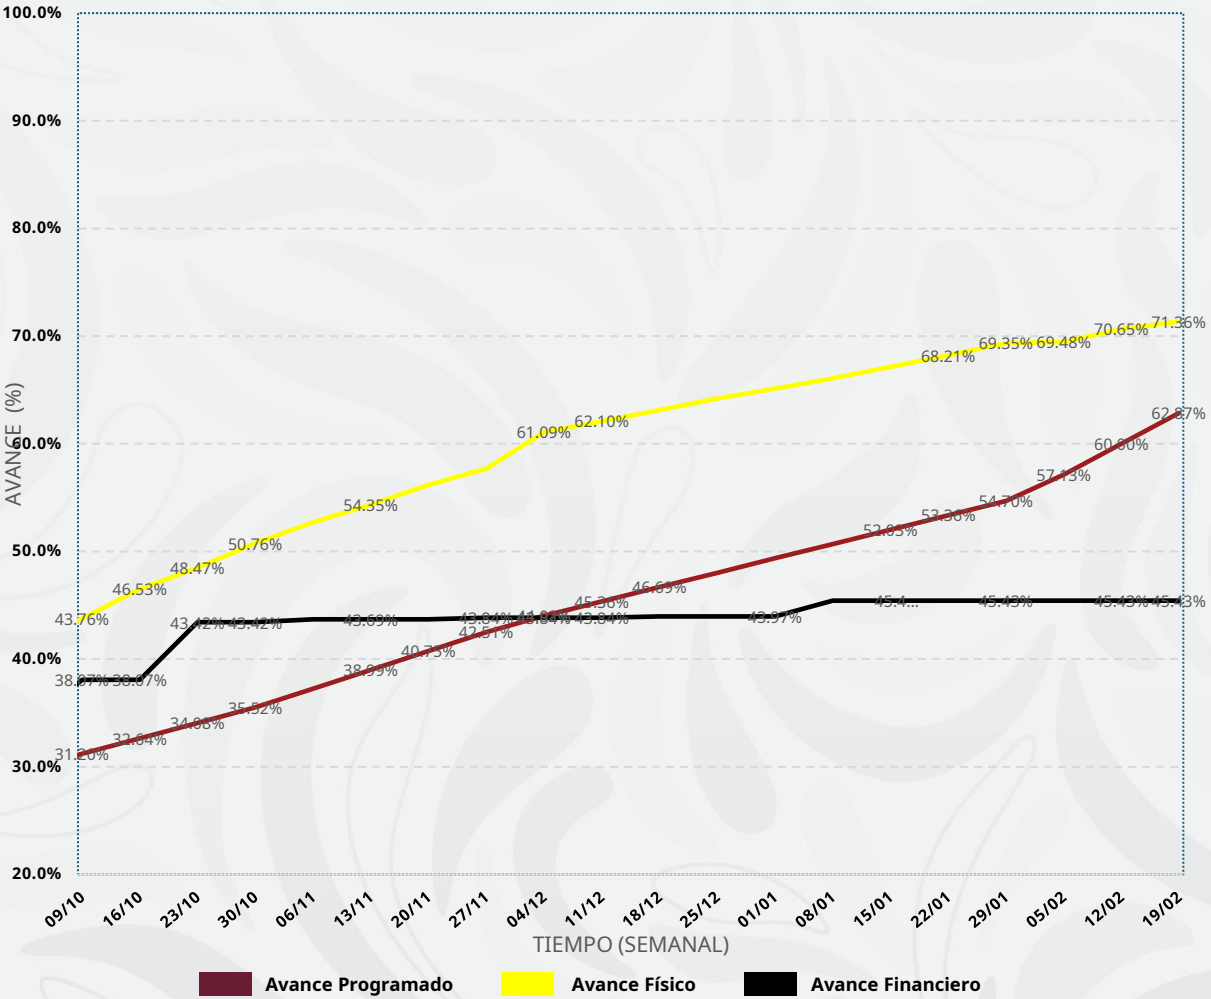

	06 de febrero al 12 de febrero	13 de febrero al 19 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	102	102
Maquinaria	18	18
Frentes de trabajo	9	9
