

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 67.84%
- Real: 82.52%
- Semanal: 0.12%
- Financiero: 60.13%

 **Inversión total 2025-2026:** 405.0 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total

 **Inversión 2025:** 225.0 mdp
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km

 **Inicio:** 18 de agosto de 2025
Término: abril 2026
La fecha de terminación contractual es agosto 2026


 **862,037** Habitantes beneficiados

 **1,140** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo

Beneficios
Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Empresas	
• Contratista:	ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
• Supervisión:	Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

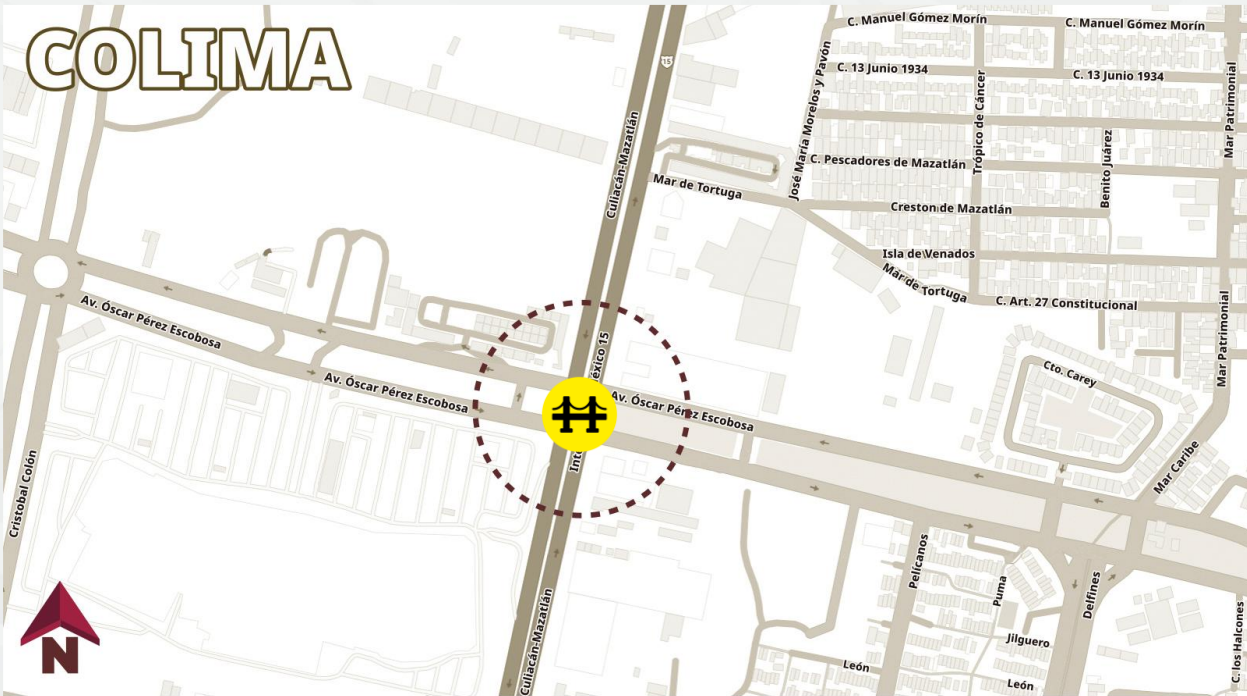


PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa



Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 13 al 19/02/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.0	0.0	Falta proyecto de semaforización y diseño
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Trabes AASHTO IV	Actividad	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Trabes Nebraska	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Trabes Nebraska NU240	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico Accesos	m3	5,266	1,017	19.3%	4,249.0	0.00	0.0	-
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	0.00	0.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	179.00	106.0	Concluido
Parapeto	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.00	0.0	Concluido
Alumbrado	Actividad	2	2.0	100.0%	0.0	0	0.2	Concluido
Señalamiento	Actividad	2	0.3	15.0%	1.7	0	0.3	
Semaforización	Actividad	1	1.0	100.0%	0	0	0.3	Concluido
Barrera Central	m	587.0	587	100.0%	0.0	0	159.0	Concluido
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	2,109.0	41.9%	2,923.0	0	195.0	
Relleno Fluído	m3	3,992.0	1,094.0	27.4%	2,898.0	0	137.0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.0	0	0.0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.0	0	0.0	
Banqueta	m2	6,922.0	380.0	5.5%	6,542.0	0	380.0	
Relleno	m3	692.0	38.0	5.5%	654.0	0	38.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

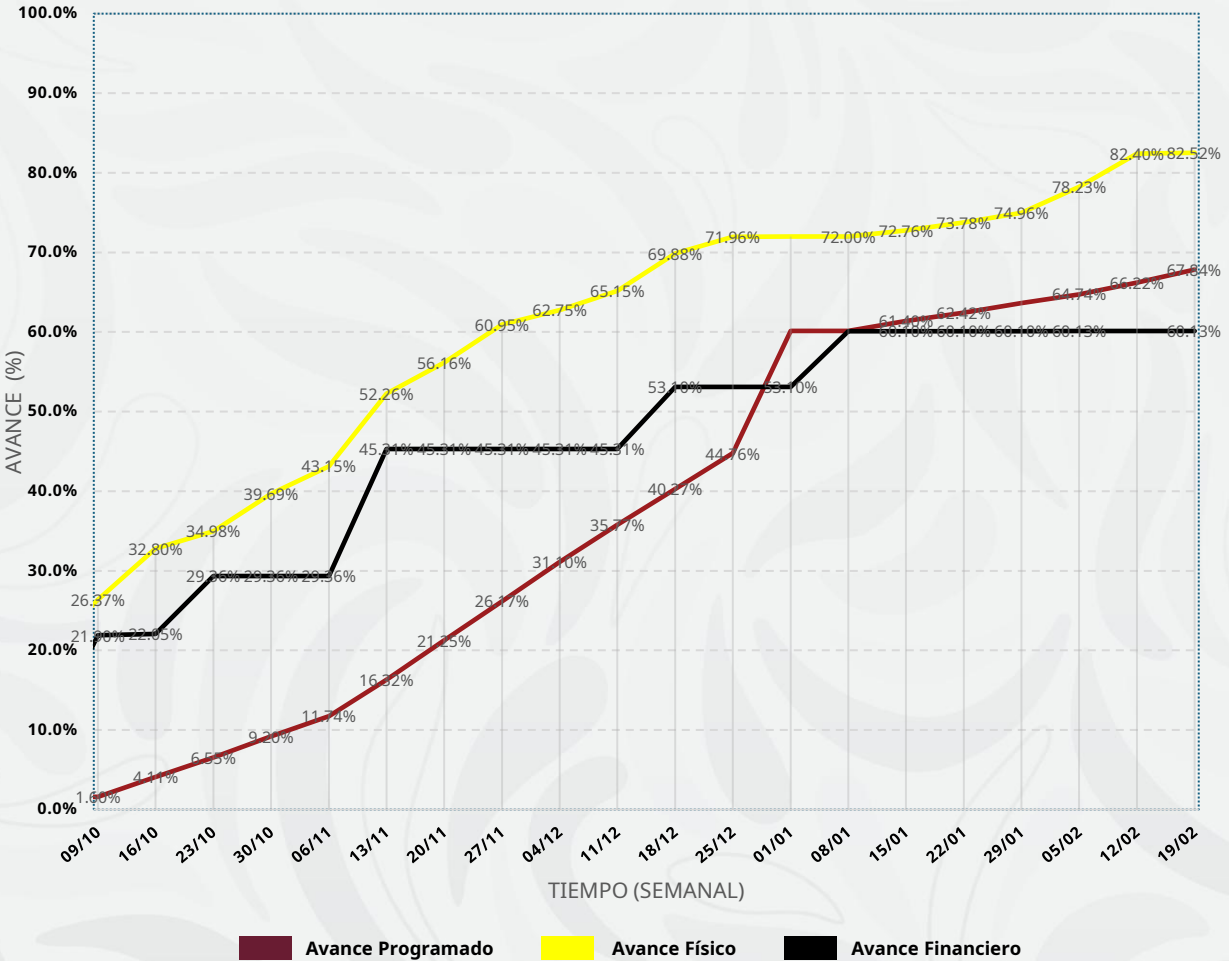

	Del 06 de Febrero al 12 de Febrero	Del 13 de Febrero al 19 de Febrero
Personal	138	163
Maquinaria	13	13
Frentes de trabajo	9	10
