

# PSF Arco Sur

## Colima



**Avance global**

- Programado: 98.61%
- Real: 98.96%
- Semanal: 0.08%
- Financiero: 70.30%

**Inversión total 2025-2026:** 630 mdp  
**Meta total:** 862 m (puente y accesos)

**Inversión 2025:** 230.23 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*  
**Meta 2025:** 0.68 km (56.55% del puente (subestructura y accesos))  
**Inversión 2026:** 399.77 mdp  
**Meta 2026:** 0.52 km (43.45% del puente (superestructura y accesos))

**Inicio:** 03-Julio de 2025  
**Término:** Abril de 2026  
**Término meta 2025:** Diciembre  
**Término meta 2026:** 15 de mayo

**157,048** habitantes beneficiados


**1,890** empleos generados

**15 min** ahorro en tiempo

**Beneficios** Reducción de tiempos de traslado al poder realizar el cruce de las vías del tren, evitando tiempos de espera prolongados y “cuellos de botella”, así mismo, permitiendo agilizar el tránsito local.

**Paso superior con 2 cuerpos y 3 carriles por sentido**


| Tramo        | Empresas                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PSF Arco Sur | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> COCONAL S.A P. I DE C.V</li><li>• <b>Supervisión:</b> 2026 NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN, CONTRATO 2025 FINALIZADO 31-DIC-2025</li></ul> |

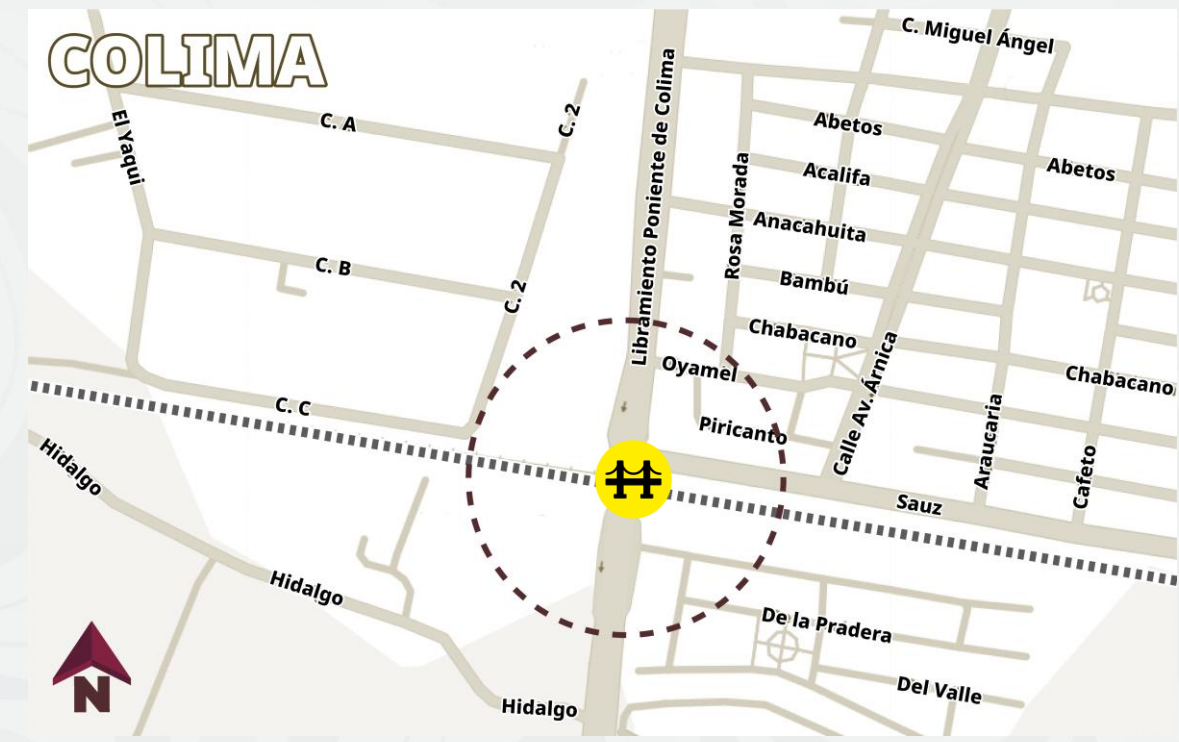

# PSF Arco Sur

## Colima

| Elemento                               | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante | 01/05/2026 al 07/05/2026 |           | Observaciones      |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------|
|                                        |              |                     |          | Programado               | Ejecutado |                    |
| Trabajos diversos (pzs)                | 254.00       | 254.00              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Reubicación de obras inducidas (m)     | 2,477.55     | 2,477.55            | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Construcción de cruce prov. FFCC (pza) | 223.00       | 223.00              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Puente lateral (pza)                   | 4.00         | 4.00                | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida. |
| Adecuación lateral no. 1 (m3)          | 994.56       | 994.56              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Adecuación lateral no. 2 (m3)          | 790.42       | 790.42              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Accesos al PSF                         |              |                     |          |                          |           |                    |
| Terracerías (m3)                       | 7,319.03     | 7,319.03            | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Base Hidráulica (m3)                   | 5,568.82     | 5, 568.82           | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Carpeta asfáltica (m3)                 | 1,909.32     | 1909.32             | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Muros MME                              |              |                     |          |                          |           |                    |
| Muro MME (m2)                          | 2,842.74     | 2,842.74            | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Carpeta asfáltica (m3)                 | 1,402.30     | 1,402.30            | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Guarnición MME (m)                     | 944.47       | 944.47              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Subestructura PSF                      |              |                     |          |                          |           |                    |
| Pilas (pza)                            | 104.00       | 104.00              | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Zapatas (pza)                          | 20.00        | 20.00               | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |
| Columnas (pza)                         | 40.00        | 40.00               | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | Partida concluida  |

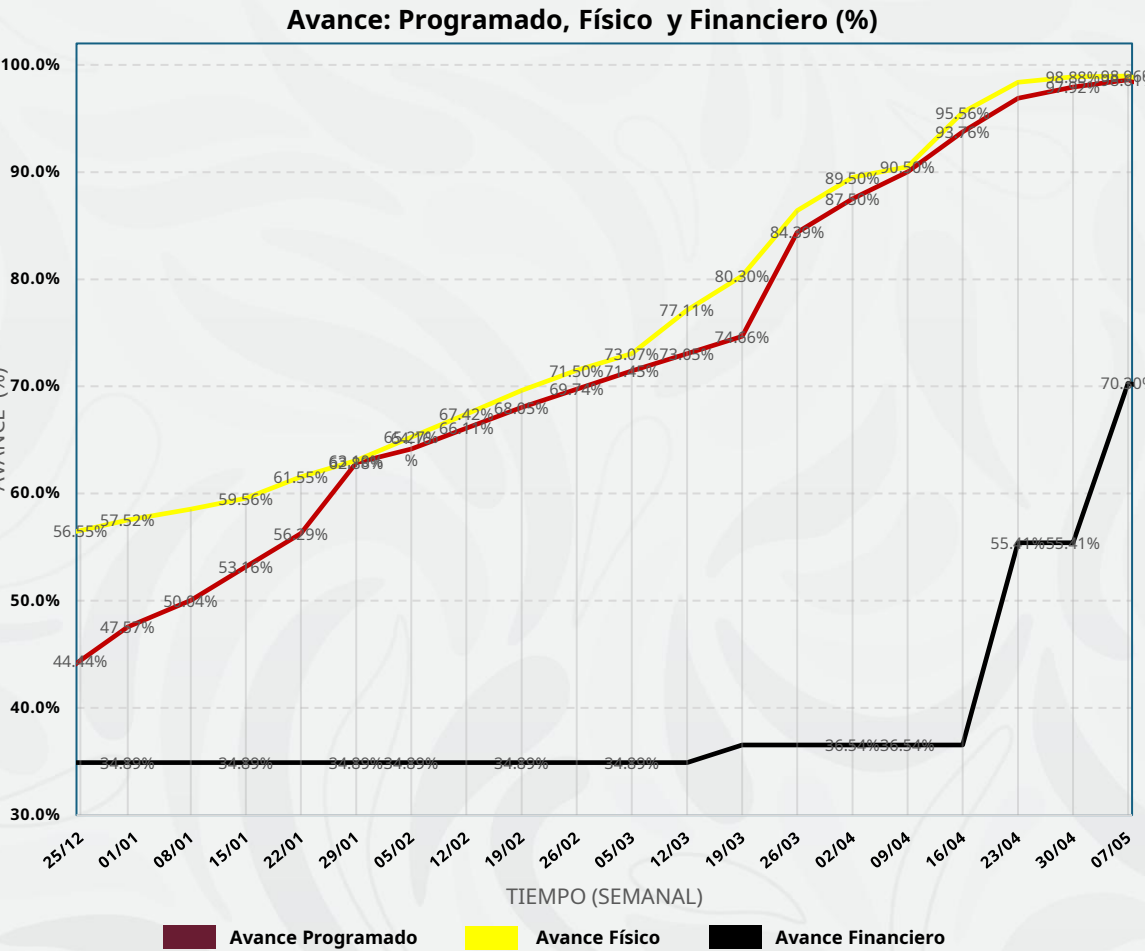

|                              | 24 al 30 de abril | 01 al 07 de mayo |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 186               | 186              |
| Maquinaria                   | 30                | 30               |
| Fuerza de trabajo            | 13                | 13               |
