




Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 57.17%
- Real: 62.5%
- Semanal: 2.54%
- Financiero: 39.0%

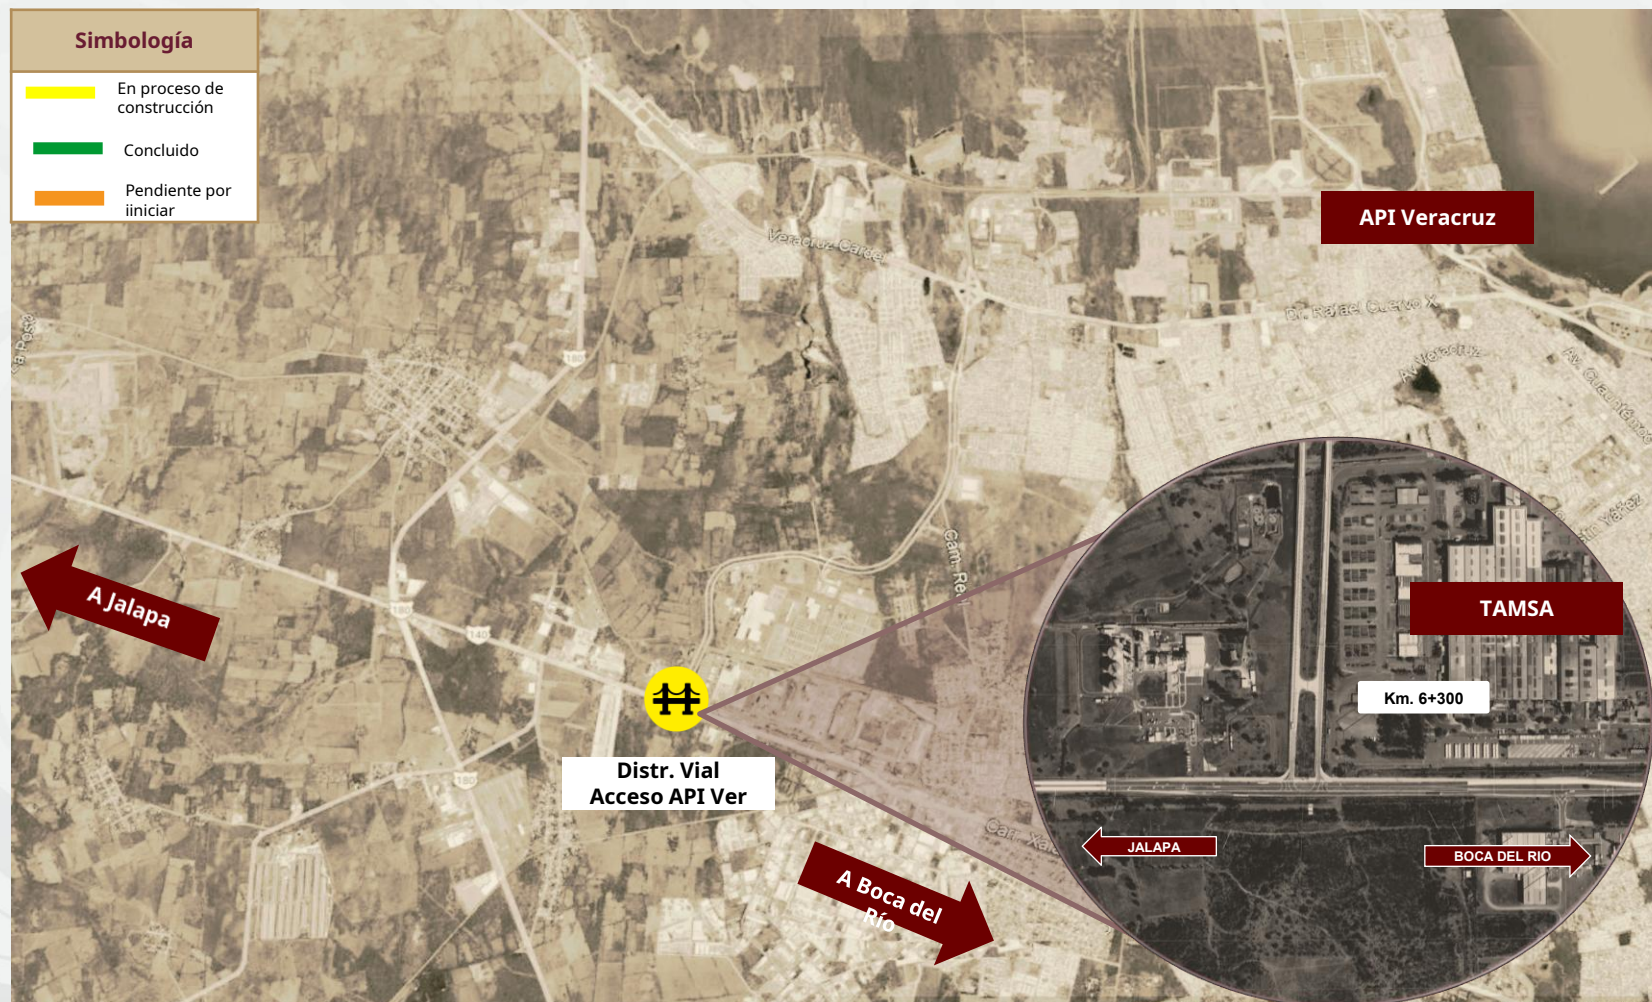

Inversión total: 819.7 mdp
Meta total 2025-2026: 1.97 km
De acuerdo al cierre de la SHCP 2026



Inversión 2025: 319.7 mdp
Meta 2025: 0.69 km de PSV
Inversión 2026: 500.0 mdp
Meta 2026: 1.28 km de PSV
Costo Paramétrico: 0.4 mdp/ml



Inicio: 14 de julio de 2025
Término meta total: 31-julio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026



780,441 habitantes beneficiados



2,601 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios

Agiliza el funcionamiento vial en la intersección con el Boulevard de acceso al Puerto de Veracruz en el Entr. TAMSA.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.




Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 01 al 07/05/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Cortes	m³	52,059.00	52,059.0	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Terraplenes	m³	36,650.00	36,650.0	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Muro Mecánicamente Relleno	m³	19,295.00	13,698.0	71.0%	5,597.0	6,843.00	8,779.0	Reprogramación
Muro Mecánicamente Escamas	m³	2,457.00	1,340.5	54.6%	1,116.5	1,116.50	807.0	Reprogramación
Base asfáltica	m³	3,731.00	3,131.0	83.9%	600.0	466.40	0.0	Reprogramación
Carpeta asfáltica	m³	2,425.00	0.0	0.0%	2,425.0	303.10	0.0	Reprogramación
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	132	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Montaje de trabes	pza.	132	132	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Losa (claro)	pza.	22	22	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Guarnición	pza.	22	22	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Barrera Central	pza.	850	336	39.5%	514	213	0.0	Reprogramación

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

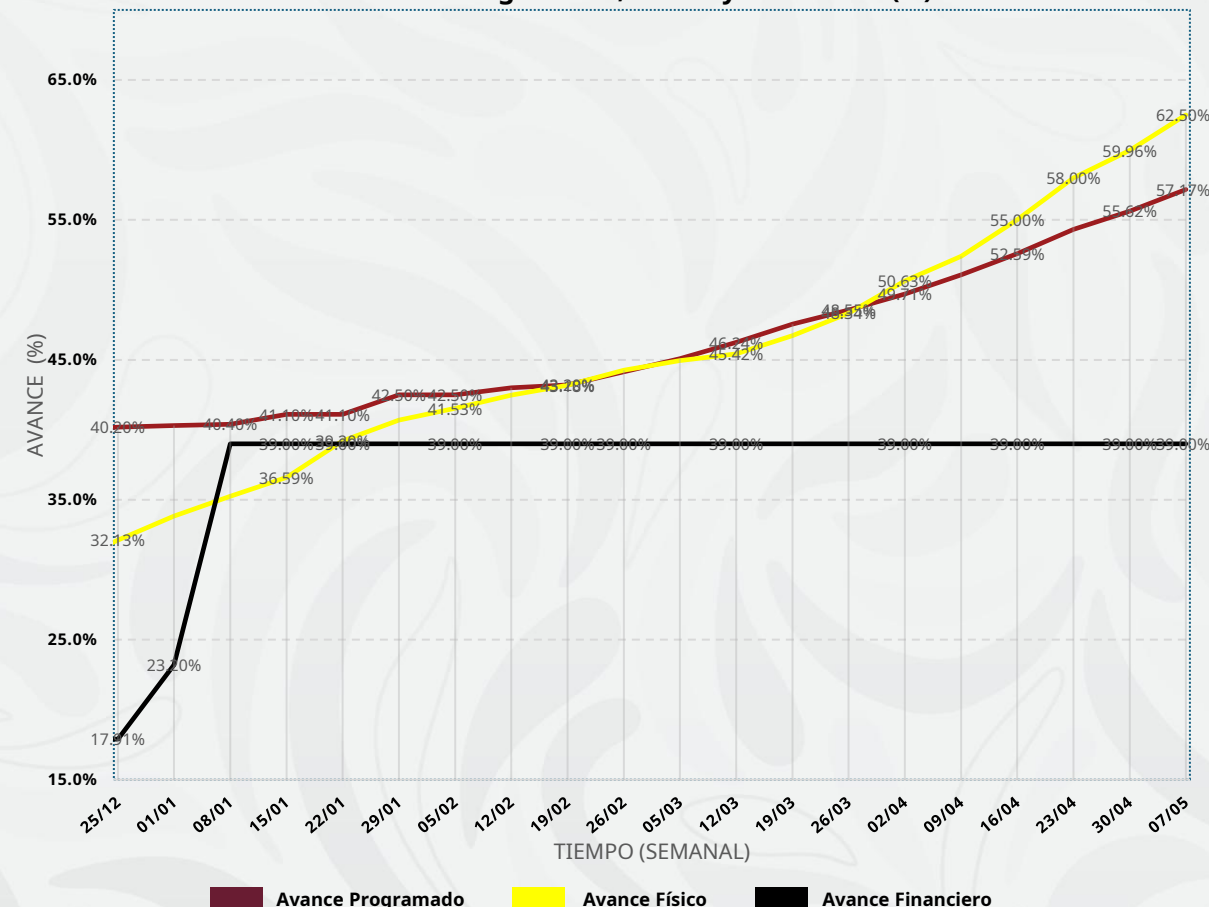

	17 de abril al 23 de Abril	24 de abril al 30 de Abril
Fuerza de Trabajo (personas)	170	168
Maquinaria	41	40
Frentes de trabajo	5	5
