



PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 88.94%
- Real: 89.40%
- Semanal: 0.59%
- Financiero: 85.64%

(Concluido, se trabajan vialidades laterales)



Inversión total 2025-2026: 404.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total



Inversión 2025: 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km



Inicio: 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales



862,037 Habitantes beneficiados



1,215 empleos generados



20 min ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

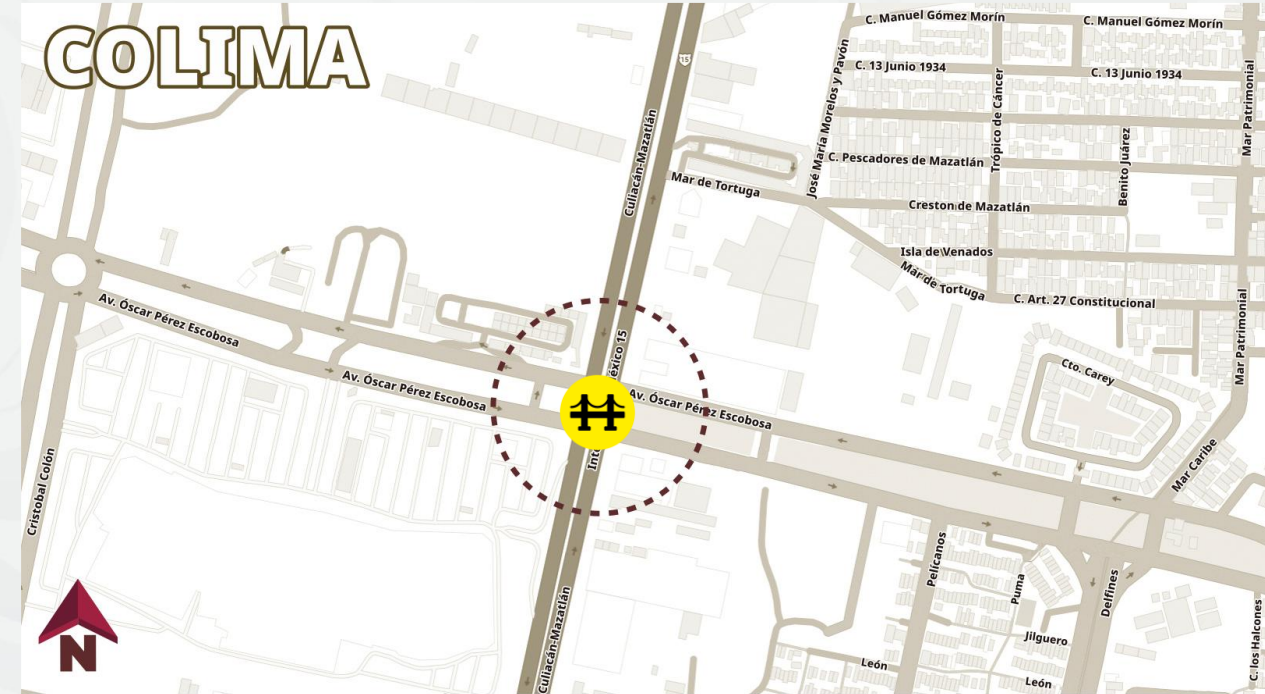


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

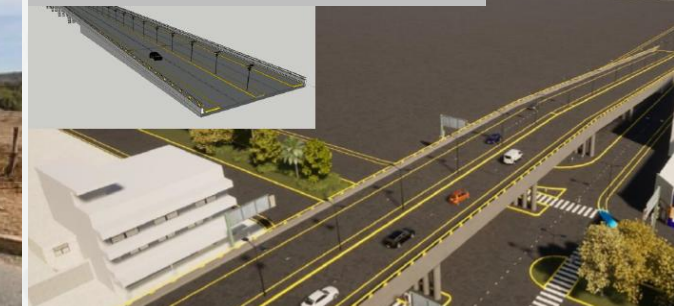

Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa
Sinaloa

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 01/05/26 al 07/05/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	1.3	65.0%	1	0.5	0.0	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Señalamiento	Actividad	2	0.25	12.5%	2	0.3	0.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL								
Excavación	m3	4,465.00	3,747.7	83.9%	717.30	446.5	389.0	En proceso
Relleno	m3	1,358.00	973.9	71.7%	384.10	135.8	102.8	En proceso
Cajón prefabricado de 1.5x1.0m HS-20	m	337.00	300.0	89.0%	37.00	37.4	72.0	En proceso
Tubo PEAD de 0.30m -0.90 m de Diam.	m	1,239.00	800.0	64.6%	439.00	123.9	60.0	En proceso
Coladera de piso y banqueta	pza	37.00	12	32.4%	25.00	1.0	8.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,291.9	38.8%	2,037.91	416.2	0.0	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,243.9	38.8%	1,962.21	356.2	0.0	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	300	38.8%	473.25	85.9	0.0	En proceso
AGUA POTABLE								
Excavación	m3	1,041.50	637	61.2%	404.50	130.2	48.6	En proceso
Relleno	m3	975.80	597	61.2%	378.80	122.0	45.7	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado aguas negras, serie 20 de 31.5cm de Diam.	m	1,030.10	630	61.2%	400.10	128.8	48.0	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	3,418.0	67.9%	1,614.0	0	265.0	En proceso
Base Hidráulica	m3	2,835.00	1,157	40.8%	1,678	567	165.0	En proceso
Riego de Impregnación	m2	12,357.0	6,323	51.2%	6,034.5	2,471	0.0	En proceso
Base Asfáltica	m3	1,862.0	529.3	28.4%	1,332.7	372	133.3	En proceso
Carpeta Asfáltica	m3	863.0	249	28.8%	614.5	0	248.5	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	9,666	41.3%	13,754.0	0	0.0	En proceso
Banqueta	m2	6,922.0	4,363.0	63.0%	2,559.0	0	119.0	En proceso
Relleno	m3	692.0	692.0	100.0%	0.0	0	0.0	En proceso

