

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance global

- Programado: 45.41%
- Semanal: 0.70%
- Real: 49.60%
- Financiero: 45.40%

 **Inversión total 2025-2026:** 740 mdp
Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)

 **Inversión 2025:** 140 mdp
Meta 2025: 38% de 1 Distribuidor Vial
Inversión 2026: 600 mdp
Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial

 **Inicio:** 16 de julio de 2025
Término meta 2025: Diciembre 2025
Término meta total: Julio de 2026

 **73,215** habitantes beneficiados


 **2,220** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo

Beneficios Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.

Paso superior con dos carriles por sentido

Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

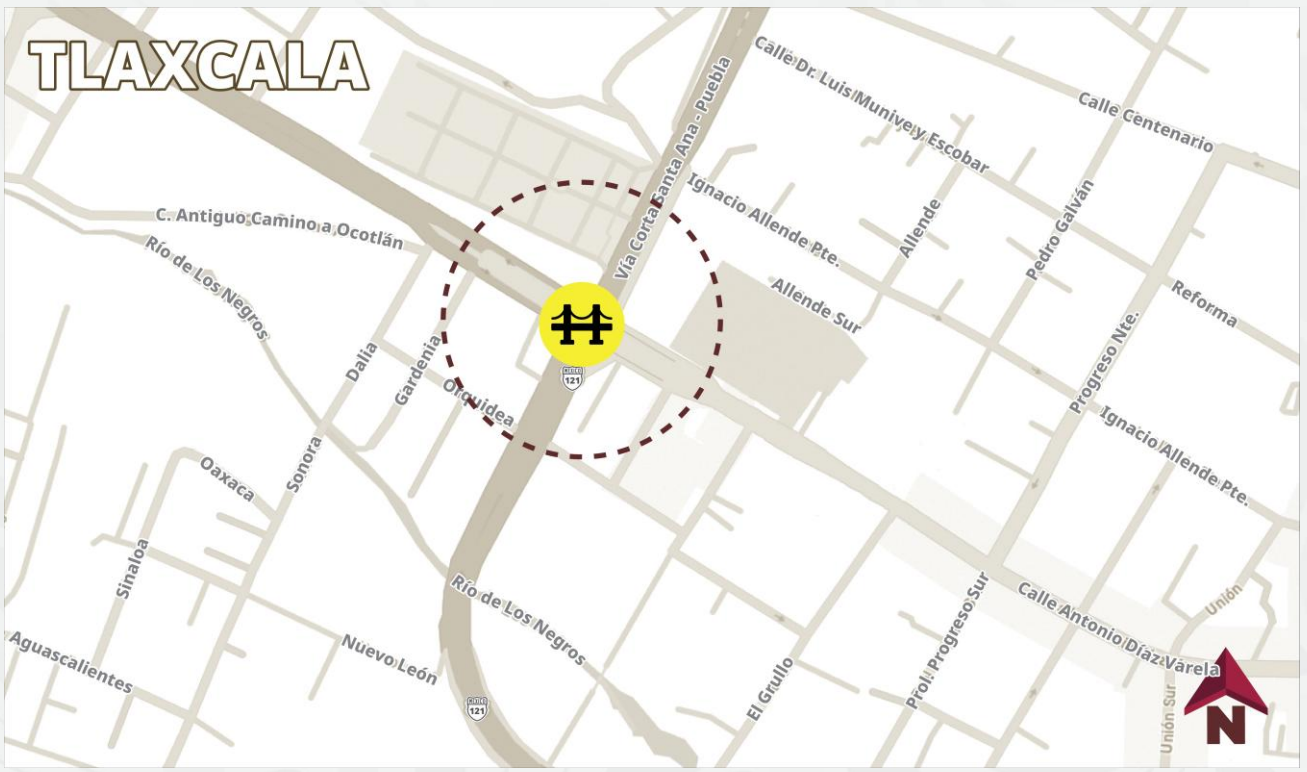

Situación actual



Proyecto


Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala



Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	Del 01-05-26 al 07-05-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	49.60% 1 Distribuidor Vial	50.40% de 1 Distribuidor Vial	1.68%	0.70%	Se trabaja en: Bancos de cabezales metálicos, montaje de trabes, diafragmas y construcción de pilas de 1.50 m de φ.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

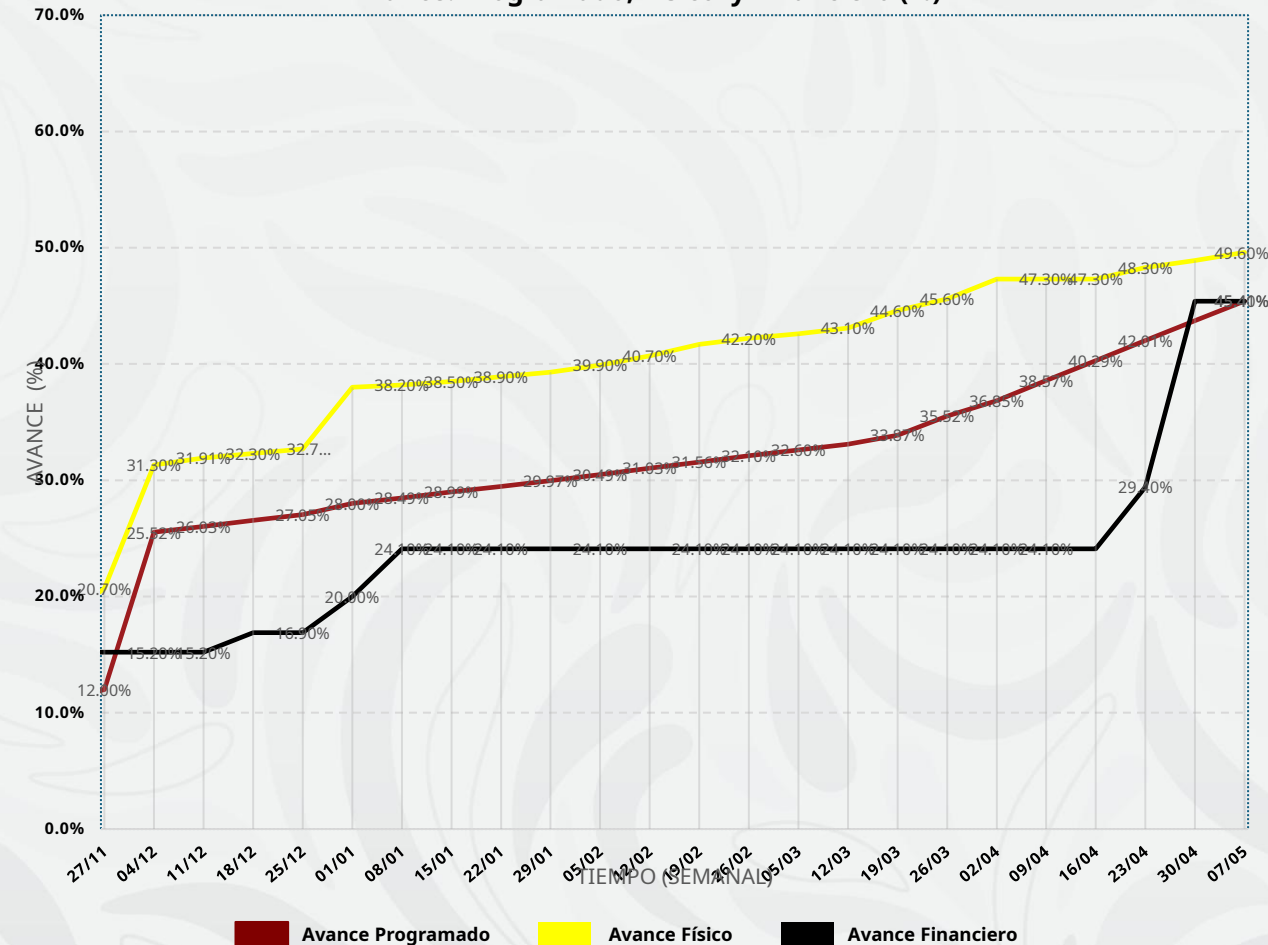

	24 al 30 de abril	01 al 07 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	53	53
Maquinaria	13	20
Frente de trabajo	5	7
