


Puente La Presa Trancas

Colima



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	01/05/26 al 07/05/26	
				Programado	Ejecutado
Preliminares					
Desmonte y Despalme (Ha)	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
Subestructura					
Pilas de cimentación (Perforación). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Armado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Colado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Columnas. Pza.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de cabezales y bancos. Pza.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Superestructura					
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Fabricación)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
Colado de diafragma y losa. M3	197.10	197.00	0.00	0.00	0.00
Carpeta asfáltica. M3.	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00
Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.	182.00	62.00	120.00	120.00	10.00

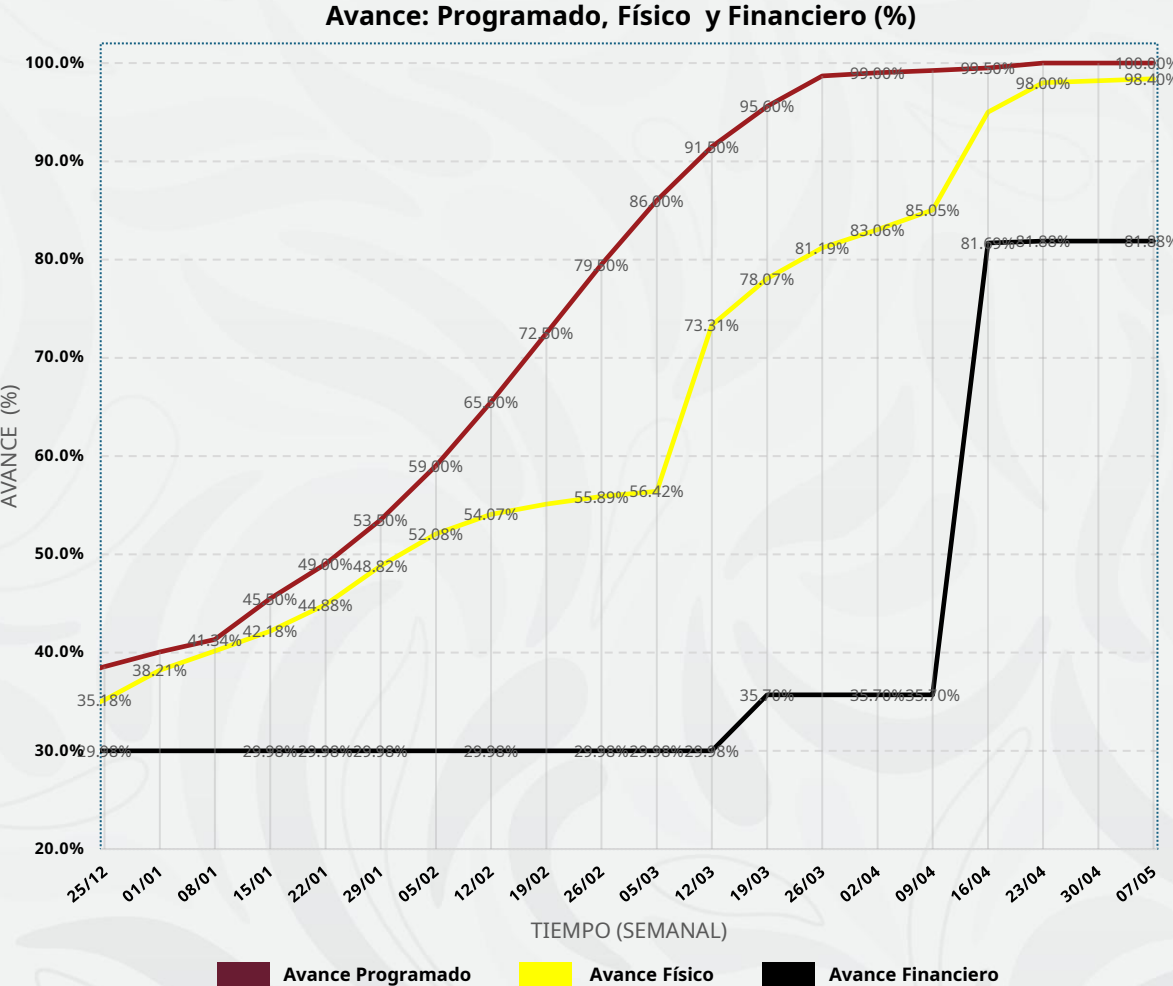

	24 al 30 de abril	01 al 07 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	29	29
Maquinaria	2	3
Frentes de trabajo	6	7
