

Puente "Las Tunas"

Colima



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 11.97%
- Real: 7.38%
- Semanal: 1.51%
- Financiero: 0%



Inversión total: 99.3 MDP



Meta total: 503 m longitud total.



Inicio: 25 de febrero de 2026

Término: 24 de Noviembre, 2026



157,048 habitantes beneficiados




235 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Beneficios:

- Comunicación ininterrumpida en época de lluvias para las comunidades.
- Acceso continuo a los servicios básicos como salud.
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

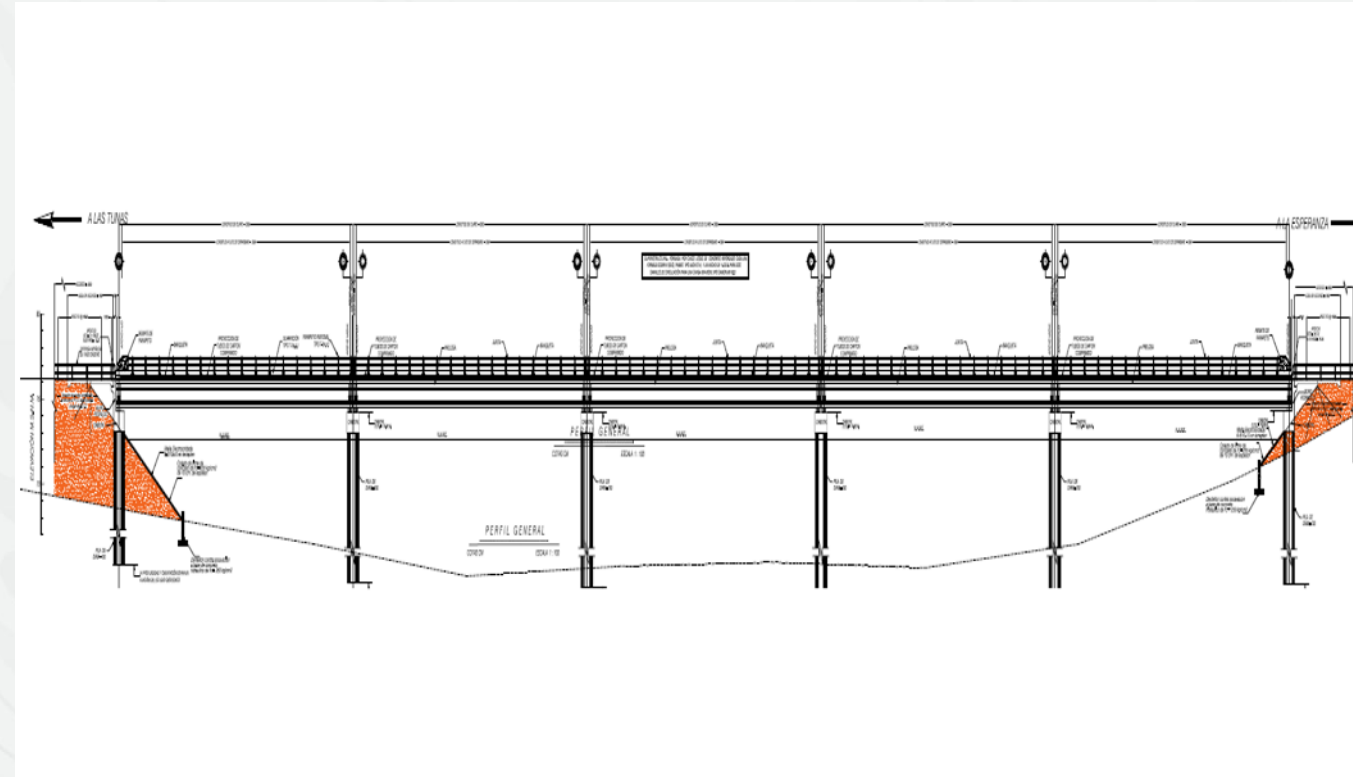

SITUACIÓN ACTUAL



IMAGEN OBJETIVO

Tramo

Empresas

Construcción
Puente Las Tunas

- **Contratista:** MARECOMSA, S.A. de C.V
- **Supervisión:** Actualmente no se cuenta con supervisión

Puente “Las Tunas”

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	13/03/26 al 19/03/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m3)	36,000.0	15,757.02	20,242.98	2, 474.36	2,620.38	
Pilas de cimentación (Perforación) (Pza)	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	
Pilas de cimentación (Armado) (Pza)	18.0	3.00	15.00	2.00	3.00	
Pilas de cimentación (Colado)(Pza)	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	
Vigas de Atado (Pza)	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	
Columnas (Pza)	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	
Construcción de cabezales y bancos (Pza)	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	
Aleros y Muro de Contención (Pza)	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	
Suministro de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	
Colado de diafragma y losa (m3)	376.81	0.0	376.81	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	55.16	0.0	55.16	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m3)	86.84	0.0	86.84	0.0	0.0	
Accesos (ml)	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	
Señalamiento (ml)	650.0	0.0	650.0	0.0	0.0	

