




Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 55.62%
- Real: 59.96%
- Semanal: 1.96%
- Financiero: 39.0%

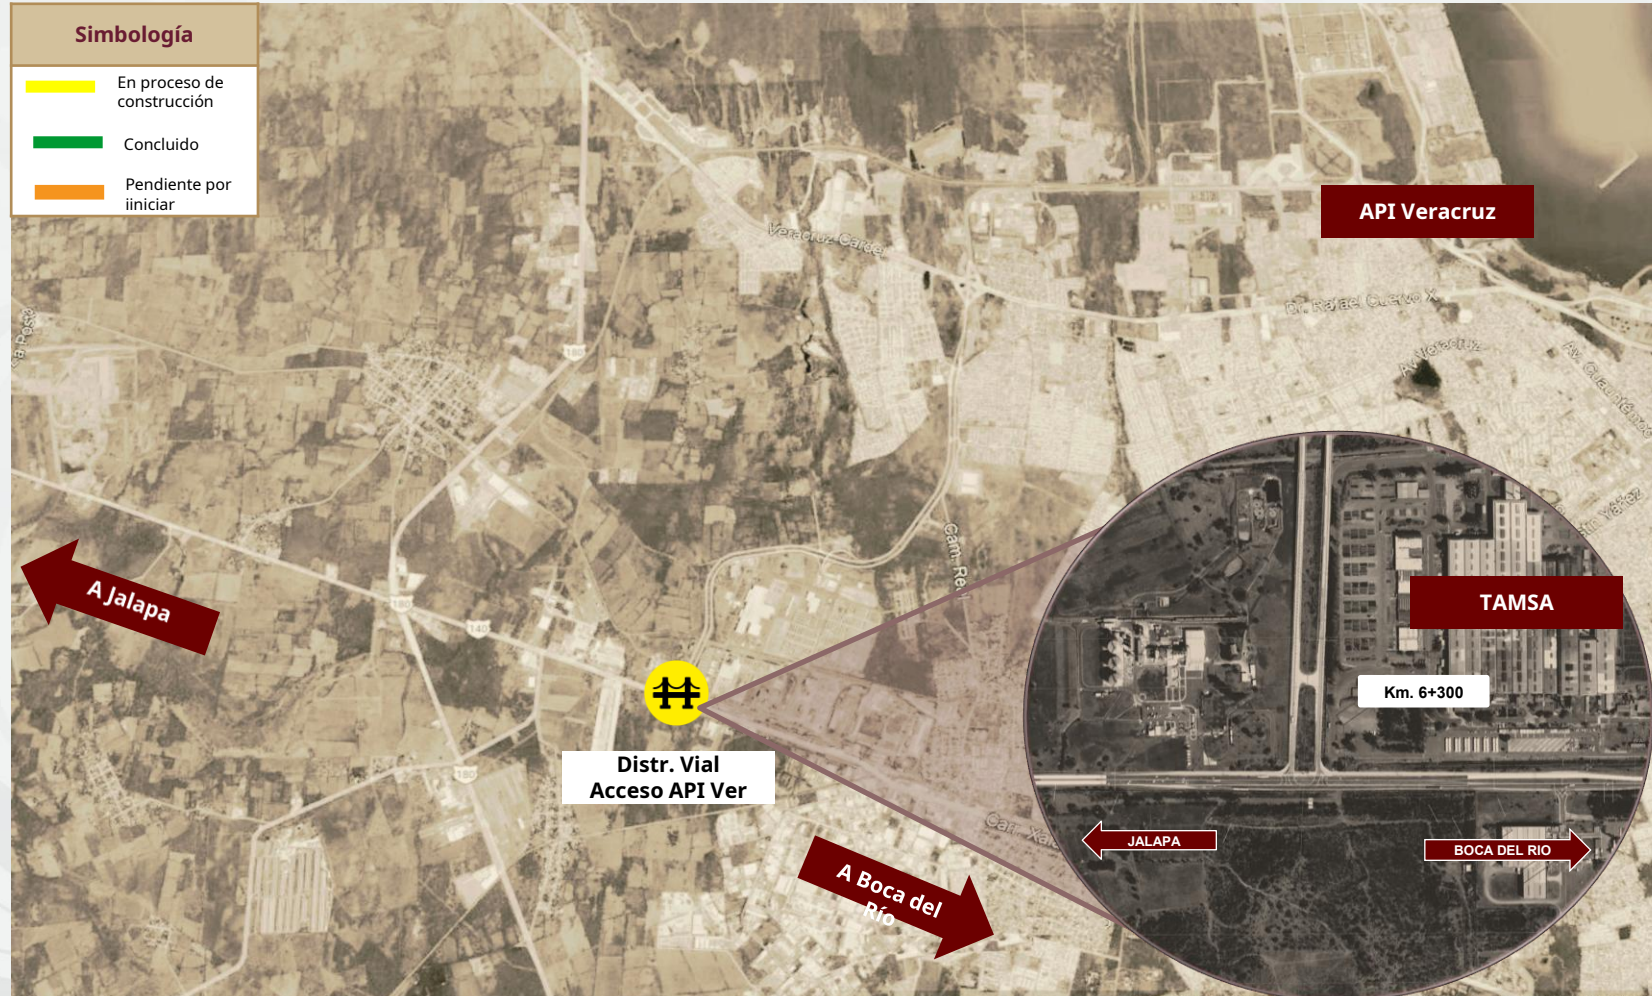

Inversión total: 819.7 mdp
Meta total 2025-2026: 1.97 km
De acuerdo al cierre de la SHCP 2026



Inversión 2025: 319.7 mdp
Meta 2025: 0.69 km de PSV
Inversión 2026: 500.0 mdp
Meta 2026: 1.28 km de PSV
Costo Paramétrico: 0.4 mdp/ml



Inicio: 14 de julio de 2025
Término meta total: 31-julio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026



780,441 habitantes beneficiados



2,601 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios

Agiliza el funcionamiento vial en la intersección con el Boulevard de acceso al Puerto de Veracruz en el Entr. TAMSA.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas


- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 24 al 30/04/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Cortes	m³	52,059.00	52,059.0	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Terraplenes	m³	36,650.00	36,650.0	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Muro Mecánicamente Relleno	m³	8,194.00	4,919.0	60.0%	3,275.0	1,020.30	3,767.0	Reprogramación
Muro Mecánicamente Escamas	m³	1,057.40	533.5	50.5%	523.9	528.50	533.5	Reprogramación
Base asfáltica	m³	3,731.00	3,131.0	83.9%	600.0	466.40	0.0	Reprogramación
Carpeta asfáltica	m³	2,425.00	0.0	0.0%	2,425.0	303.10	0.0	Reprogramación
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	132	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Montaje de trabes	pza.	132	132	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Losa (claro)	pza.	22	22	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Guarnición	pza.	22	22	100.0%	-	-	-	Concluido en el cpo B
Barrera Central	pza.	850	336	39.5%	514	213	0.0	Reprogramación

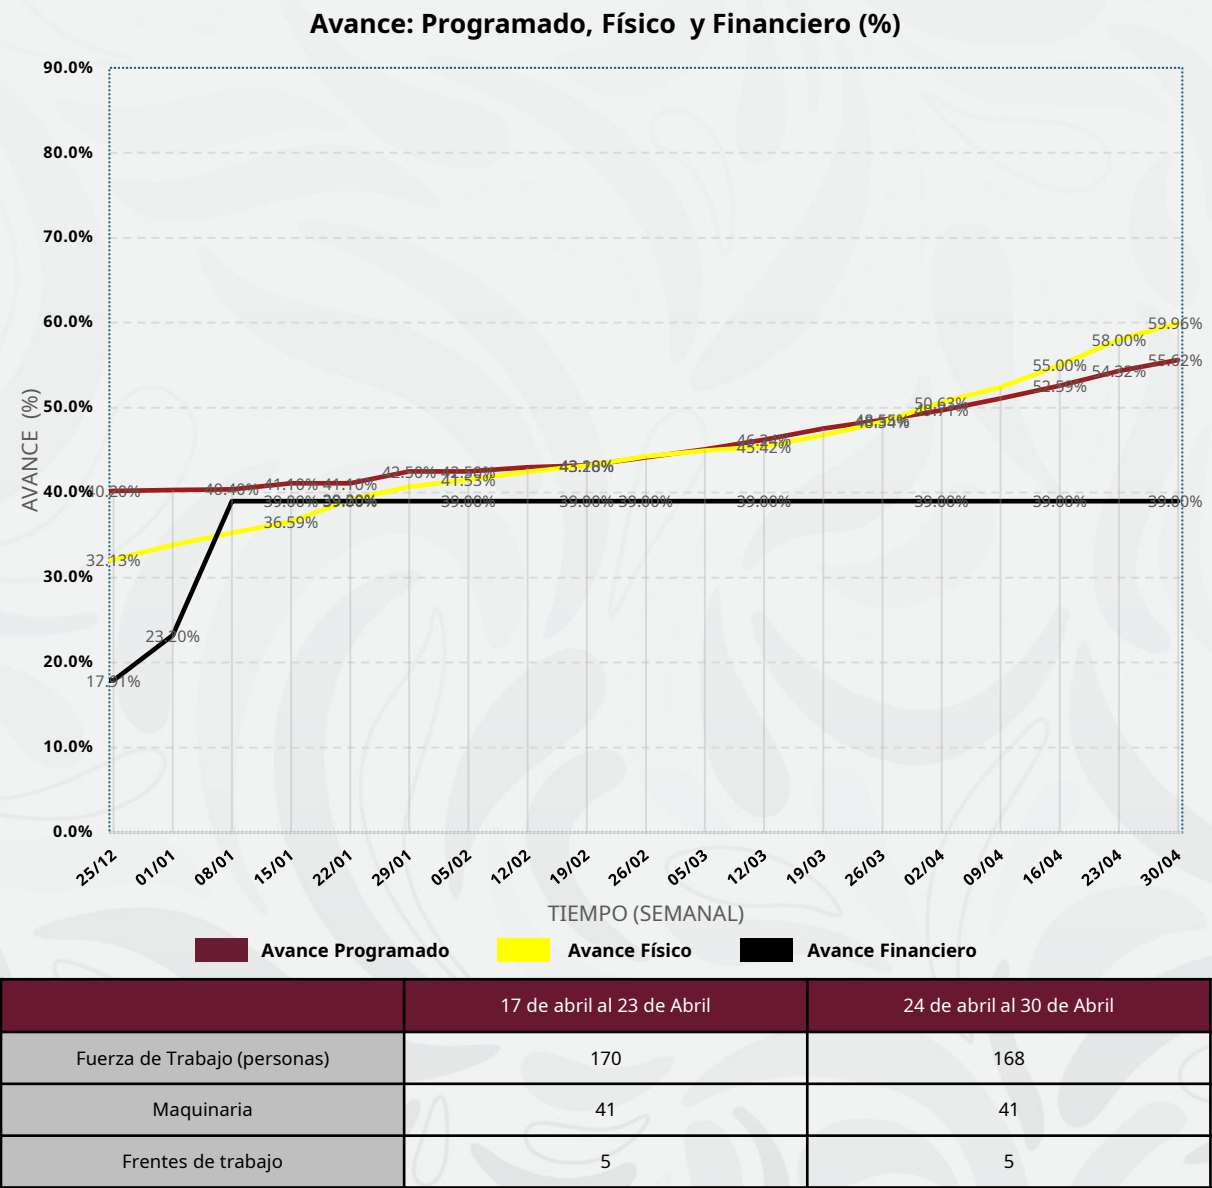

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)



Cuerpo A (programa 2026)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 24 al 30/04/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	9,163.00	1,867.0	20.4%	7,296.00	0.00	179.0	Programa 2026
Cortes	m³	63,969	19,586.0	30.6%	44,383	0.00	3,200.0	Programa 2026
Subyacente	m³	26,291.00	7,438.0	28.3%	18,853.00	0.00	2,503.0	Programa 2026
Subrasante	m³	16,802.00	2,565.0	15.3%	14,237.00	0.00	225.0	Programa 2026
Base Hidráulica	m³	36,650.00	1,808.0	4.9%	34,842.00	0.00	1,183.0	Programa 2026
Base Asfáltica	m³	8,587.00	0.0	0.0%	8,587.00	0.00	0.0	Programa 2026
Carpeta Asfáltica	m³	6,180.00	0.0	0.0%	6,180.00	0	0.0	Programa 2026
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100%	0	0	0.0	Programa 2026
Zapatas	pza.	21	20	95.2%	1	0	1	Programa 2026
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	23	19	82.6%	4	0	2.0	Programa 2026
Cabezales	pza.	23	8	34.8%	15	0	2.0	Programa 2026
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	46	34.8%	86	0	9.0	Programa 2026
Montaje de trabes	pza.	132	18	13.6%	114	0	2.0	Programa 2026
Losa (claro)	pza.	28	0	0.0%	28	0	0.0	Programa 2026
Guarnición	pza.	22	0	0.0%	22	6	0.0	Programa 2026
Barrera Central	pza.	22	0	0.0%	22	0	0.0	Programa 2026
Paso Inferior Peatonal	Lote	1	0	0.0%	1	0	0.0	Programa 2027



Colado del cabezal del eje 06,



Construcción del MME en el acceso 02
