

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 89.63%
- Real: 92.05%
- Semanal: 2.01%
- Financiero: 72.80%



Inversión total 2025-2026: 700 mdp
Meta total: 1.5 km deprimido y 4.1 km de gasas



Inversión 2026: 380 mdp
Meta 2026: 0.22 km de Deprimido y 3.83 km de gasas



Inicio: 12 de mayo de 2025
Término: abril de 2026



351,000 habitantes beneficiados



2,100 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios: Ofrecerá flujo continuo a los usuarios que circulan entre Cabo San Lucas y San José del Cabo y reducirá la probabilidad de accidentes al evitar entrecruzamientos a nivel con el tránsito que circula sobre la carretera federal MEX-001 Cabo San Lucas – La Paz.

Paso inferior con 2 carriles por sentido, ciclovía bidireccional y cruces peatonales



Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.


Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Avance: Programado, Físico y Financiero

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	24/04/26 al 30/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Reforzamiento Puente Peatonal (lote)	1.0	0.8	0.2	0.0	0.0	
Terracerías y Pavimentos						
Terracerías (m3)	14,112.0	14,112.0	0.0	-	-	Concluido
Excavación núcleo (m3)	100,069.2	100,069.2	0.0	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	11,840.0	11,840.0	0.0	-	-	Concluido
Base asfáltica (m3)	5,545.0	5,505.1	39.9	0.0	610.0	
Carpeta asfáltica (m3)	1,992.0	854.2	1,137.8	0.0	232.1	
Relleno fluido (m3)	1,680.0	1,680.0	0.0	0.0	130.0	Concluido
Pavimento rígido (m3)	3,552.0	3,352.0	200.0	0.0	516.0	
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas (pzas)	12.0	12.0	0.0	-	-	Concluido
Muros de 2 a 7 m (pzas)	12.0	12.0	0.0	-	-	Concluido
Trabes de liga (m)	1,123.6	1,123.6	0.0	-	-	Concluido
Contratrabes Metálicas (pza)	29.0	29.0	0.0	-	-	Concluido
Limpieza de pilas (m2)	7,000.0	6,645.0	355.0	0.0	317.0	
Juntas de dilatación (pza)	8.0	2.0	6.0	4.0	2.0	
Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	52.0	0.0	-	-	Concluido
Losas de acceso (m2)	609.8	609.8	0.0	-	-	Concluido
Losas puentes (m2)	1,642.8	1,642.8	0.0	-	-	Concluido
Parapeto (m)	1,725.2	1,697.0	28.2	0.0	241.2	
Guarnición (m3)	5,800.0	4,692.0	1,108.0	37.5	200.0	
Banquetas (m2)	10,068.0	8,073.9	1,994.1	330.4	0.0	
Drenaje Pluvial (m)	1,600.0	1,600.0	0.0	0.0	100.8	Concluido
Registros Pluviales (pza)	32.0	32.0	0.0	0.0	7.0	Concluido
Semaforización y Señalamiento						
Semaforización (%)	100.0	90.0	10.0	0.0	40.0	
Horizontal (m)	29,901.7	0.0	29,901.7	0.0	0.0	
Vertical (pza)	273.0	0.0	273.0	0.0	0.0	
Obra inducida						
Alumbrado (pza)	305.0	260.0	45.0	0.0	66.0	
Reubicación de la vegetación (pza)	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	

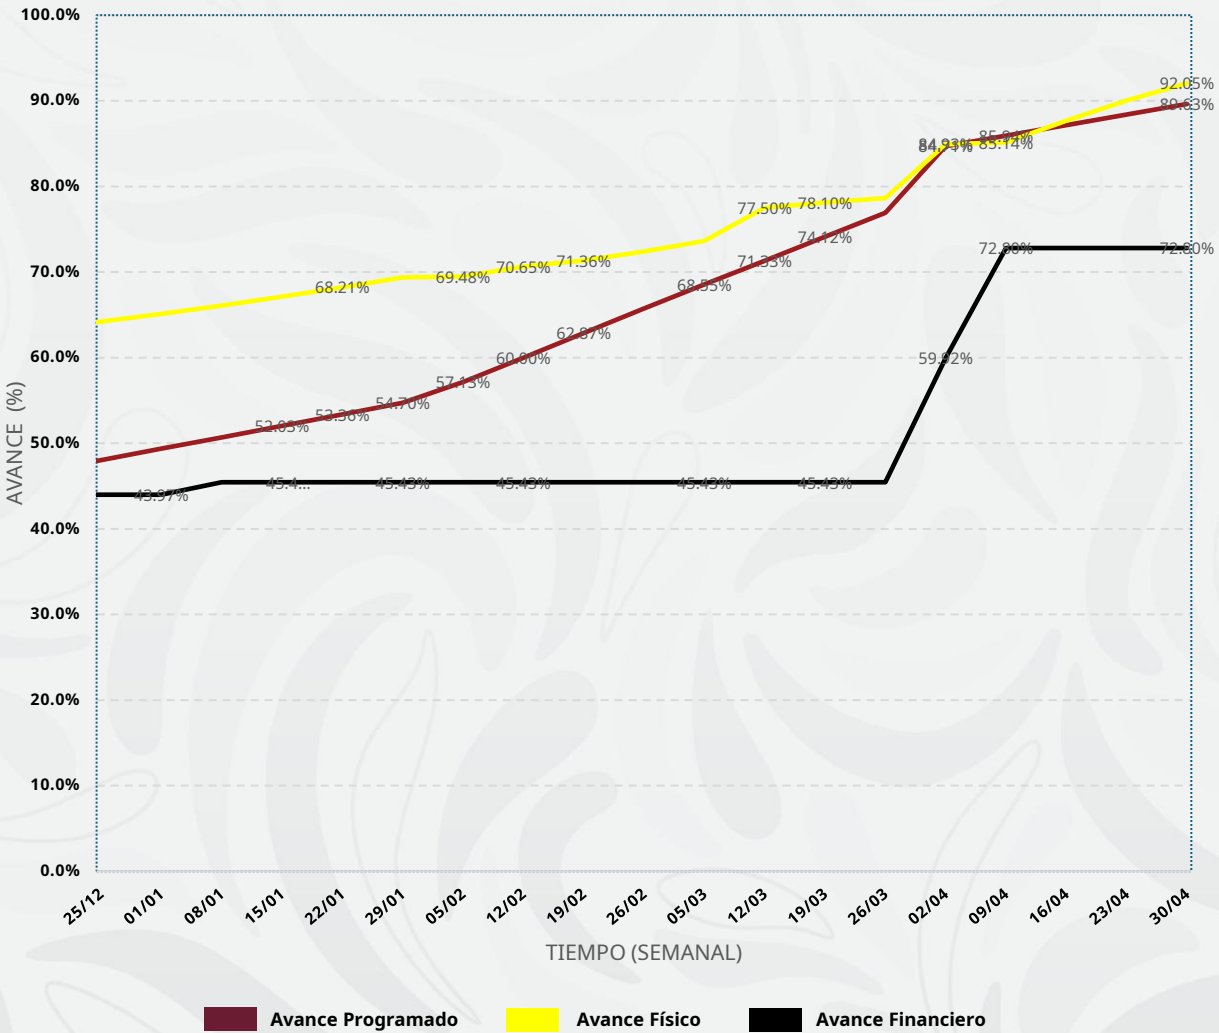

	17 de abril al 23 de abril	24 de abril al 30 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	100	100
Maquinaria	20	20
Frentes de trabajo	9	9
