



PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 86.53%
 - Real: 88.81%
 - Semanal: 1.37%
 - Financiero: 81.4%
- (Concluido, se trabajan vialidades laterales)



Inversión total 2025-2026: 404.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total



Inversión 2025: 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km



Inicio: 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales



862,037 Habitantes beneficiados



1,215 empleos generados



20 min ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

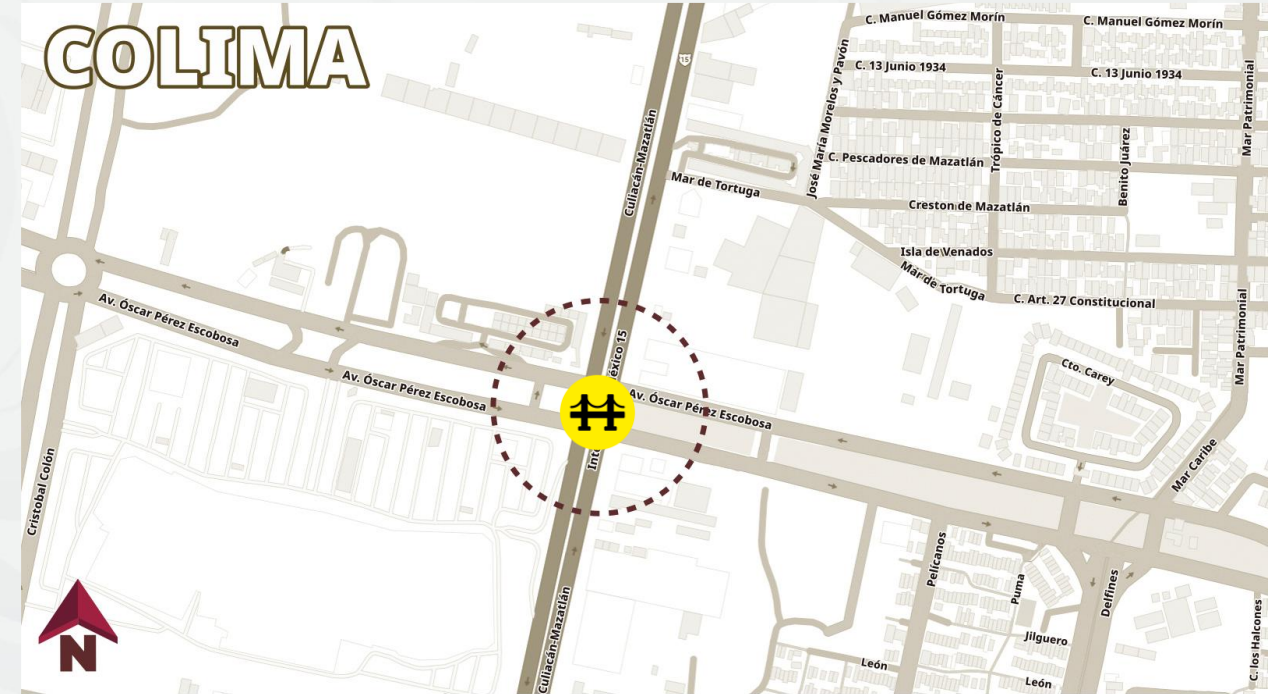


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

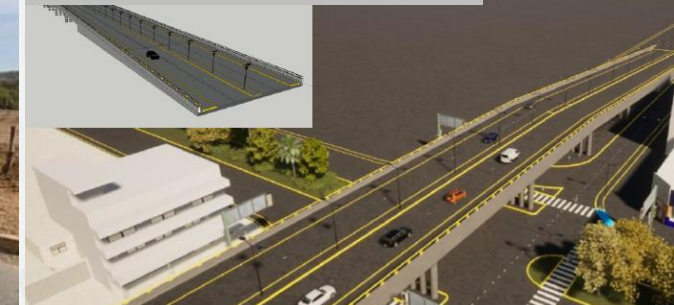


Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

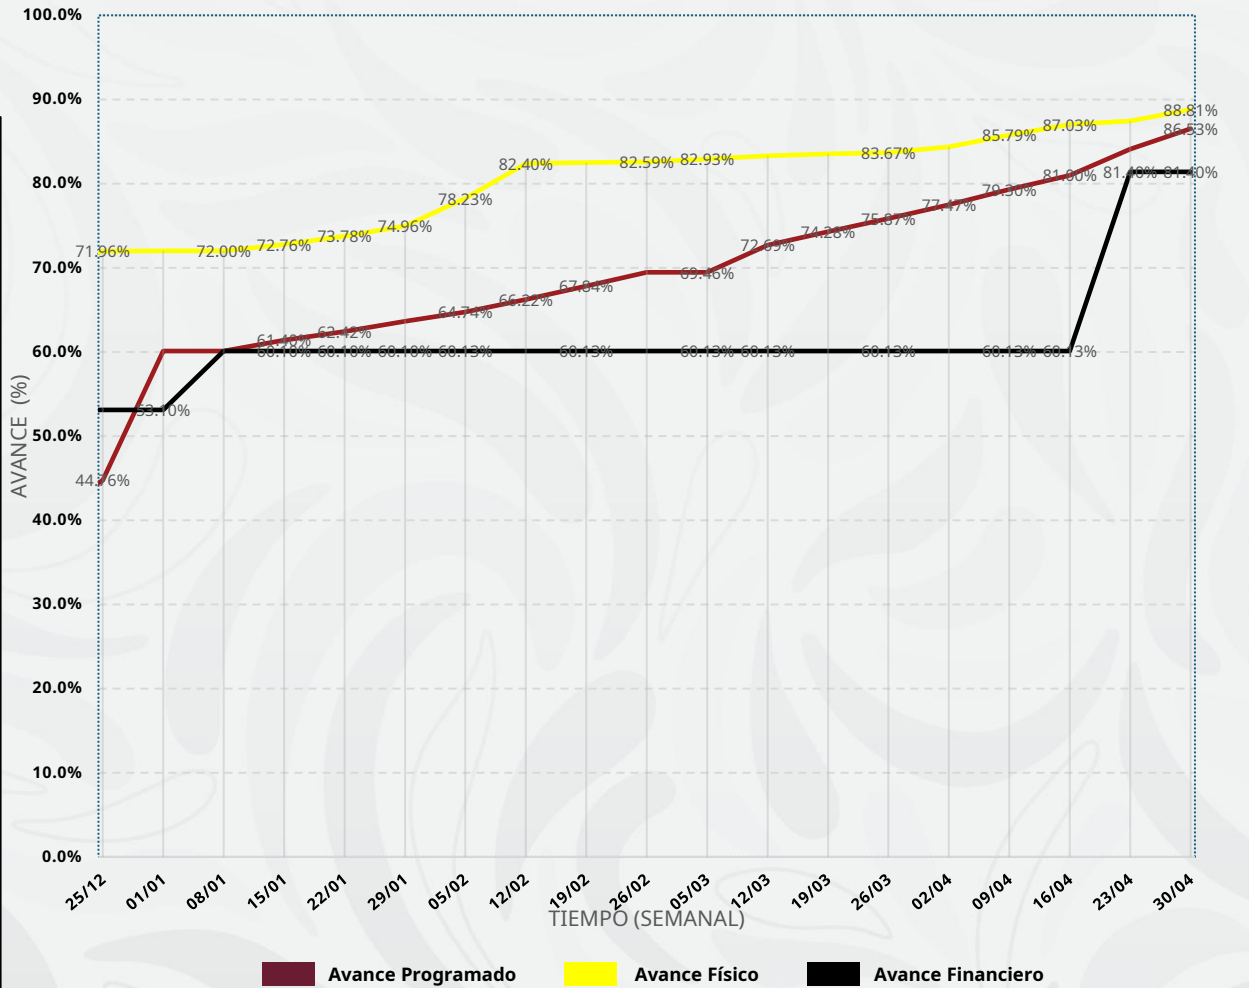

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 24/04/26 al 30/04/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	1.3	65.0%	1	0.5	0.3	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Señalamiento	Actividad	2	0.25	12.5%	2	0.3	0.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL								
Excavación	m3	4,465.00	3,358.7	75.2%	1,106.30	446.5	692.0	En proceso
Relleno	m3	1,358.00	871.1	64.1%	486.90	135.8	60.0	En proceso
Cajón prefabricado de 1.5x1.0m HS-20	m	337.00	228.0	67.7%	109.00	37.4	96.0	En proceso
Tubo PEAD de 0.30m -0.90 m de Diam.	m	1,239.00	740.0	59.7%	499.00	123.9	0.0	En proceso
Coladera de piso y banqueteta	pza	37.00	4	10.8%	33.00	1.0	0.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,291.9	38.8%	2,037.91	416.2	0.0	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,243.9	38.8%	1,962.21	356.2	0.0	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	300	38.8%	473.25	85.9	0.0	En proceso
AGUA POTABLE								
Excavación	m3	1,041.50	588	56.5%	453.06	130.2	0.0	En proceso
Relleno	m3	975.80	551	56.5%	424.48	122.0	0.0	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado aguas negras, serie 20 de 31.5cm de Diam.	m	1,030.10	582	56.5%	448.10	128.8	0.0	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	3,153.0	62.7%	1,879.0	0	411.0	En proceso
Base Hidráulica	m3	2,835.00	992	0	1,843	567	530	En proceso
Riego de Impregnación	m2	12,357.0	6,323	51.2%	6,034.5	2,471	4,312.5	En proceso
Base Asfáltica	m3	1,862.0	396	21.3%	1,466.0	372	396.0	En proceso
Carpeta Asfáltica	m3	863.0	0	0.0%	863.0	0	0.0	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	9,666	41.3%	13,754.0	0	2,198.0	En proceso
Banqueta	m2	6,922.0	4,244.0	61.3%	2,678.0	0	815.0	En proceso
Relleno	m3	692.0	692.0	100.0%	0.0	0	228.0	En proceso

	Del 17 de Abril al 23 de Abril	Del 24 de Abril al 30 de Abril
Personal	84	114
Maquinaria	15	26
Frentes de trabajo	7	9
