

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance global

• Programado: 6.20%

• Real: 9.80%

• Semanal: 1.50%

• Financiero: 3.60%

Avance 2025

• Programado: 44.29%

• Real: 70.00%

• Semanal: 10.71%

• Financiero: 25.71%

 Inversión total 2025-2026: 650 mdp

Inversión 2025: 100 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial

 Meta total: 1 Distribuidor | 1.204 km (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)

 Inicio: 16 de julio de 2025

Término: 31 de diciembre de 2026


Termino meta 2025: 31 de diciembre

 73,215 habitantes beneficiados

 1,950 empleos generados

 20 min ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

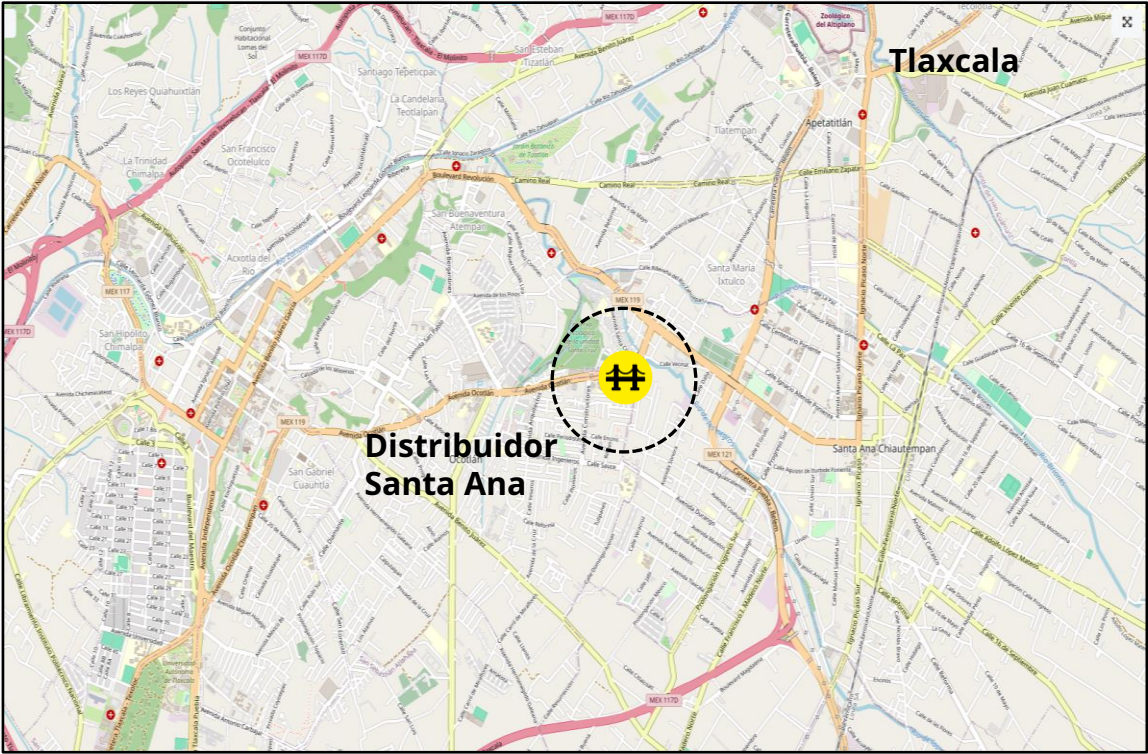

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	10 al 16-10-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	14% de 1 Distribuidor Vial	9.80% del 14% de 1 Distribuidor Vial	4.2% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.84%	1.50%	Se trabaja en pilas de los ejes #2, 3 y 9; así como en zapatas de los ejes #10 al 15.

