

CDMX

Alameda Oriente

Avance global

- Programado: 30.82%
- Real: 26.38%
- Semanal: 1.35%
- Financiero: 15.79%



Inversión total 2025-2027: 2,000 mdp
Meta total: 2 puentes | 1.2 km longitud total.



Inversión 2025: 315.81 mdp
Meta 2025: 16.86% de 2 puentes
Inversión 2026: 670 mdp
Meta 2026: 33.86% de 2 puentes



Inicio: 17 de junio de 2025
Término: Octubre 2027
Término meta 2026: Diciembre 2026



1,798,474 habitantes beneficiados



6,000 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Beneficios: Contribuye a mejorar la conectividad de la zona oriente de la CDMX y EDO. MEX. mejorando el nivel de servicio, actualmente el Puente 1 opera en doble sentido de circulación (2 carriles en sentido Sur-Norte y 1 sentido Norte-Sur) debido al daño estructural en el Puente 2 ocasionado por los sismos de los años 2017, 2020 y 2021, reduciendo la capacidad de movilidad de 6 a 3 carriles.

Empresas


- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

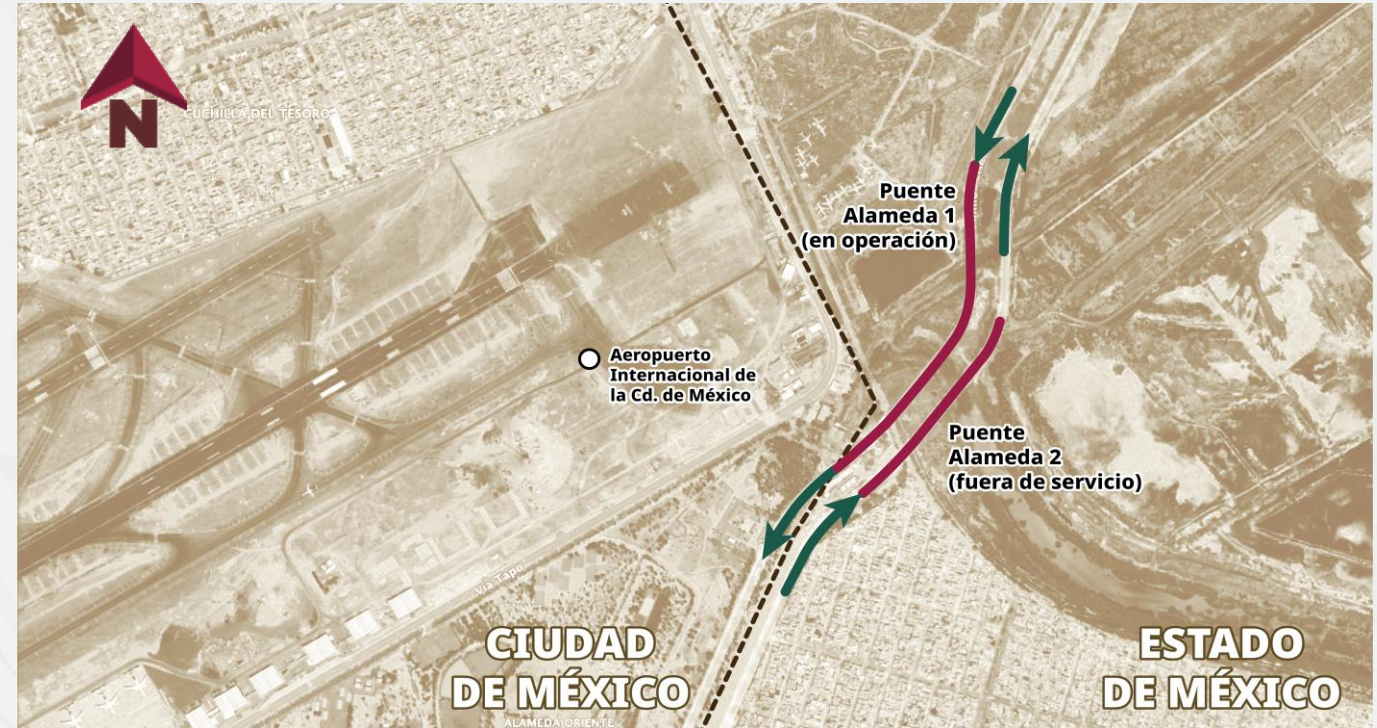

Situación actual




Proyecto

Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado Acumulado	Faltante	10/abr/26 al 16/abr/26 Programado	10/abr/26 al 16/abr/26 Ejecutado
Estudios (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Demolición y retiro de estructura (Puente 2)	500	m	500	0	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento de señal tipo puente (Puente 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 1 y 2)	8,941.38	m3	7,106.56	1,834.82	398.66	0
Excavación en caminos de servicio (Puente 1 y 2)	44,810.84	m3	27,529.44	17,281.4	1,936.27	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 1 y 2)	65,681.44	m3	34,941.8	30,739.64	2,928.47	0
Construcción de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puente 2)	1,892	Pzs	1,892	0	0	0
Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puente 2)	1,892	Pzs	1,383	509	51.14	40
Excavación para desplante de Zapatas (Puente 2)	1,984.10	m3	1,405.8	578.3	85.73	0
Construcción de Zapatas (Puente 2)	3.00	Pzs	1	2	0.12	0
Excavación para desplante de Cajones (Puente 2)	1,984.10	m3	1,564.15	419.95	68.42	0
Construcción de Cajones (Puente 2)	8.00	Pzs	1.4	6.6	0.31	0.2
Construcción de Columnas (Puente 2)	11.00	Pzs	1.75	9.25	0.8	0.21
Construcción de Cabezales (Puente 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Fabricación de trabes pretensadas (Puente 2)	44.00	Pzs	10	34	2	0
Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puente 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Fabricación de trabes de Acero (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0.14	0
Traslado y montaje de trabes de Acero (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Construcción de Losas de calzada (Puente 2)	10.00	Claros	0	10	0	0
Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puente 2)	960.00	m	0	960	0	0
Construcción de Accesos (Puente 2)	1.00	Accesos	0	1	0	0
Construcción de línea de alumbrado publico (Puente 2)	1.00	Línea	0	1	0	0
Señalamiento Horizontal y Vertical (Puente 2)	1.00	Lote	0	1	0	0

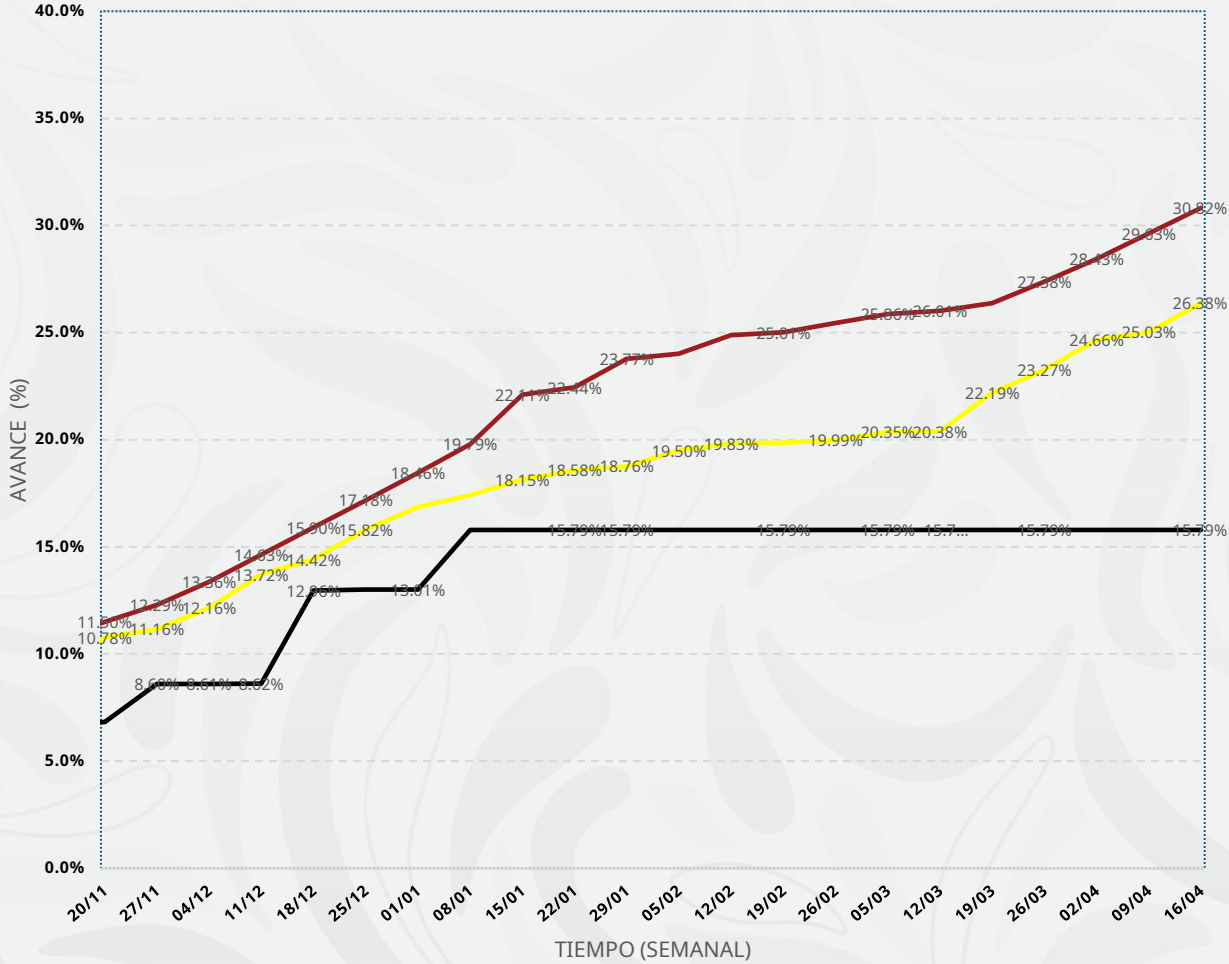

	Del 03 al 09 de abril de 2026	Del 10 al 16 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	150	136
Maquinaria	18	18
Frentes de trabajo	8	6
