


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 52.59%
- Real: 55.0%
- Semanal: 2.6%
- Financiero: 39.0%

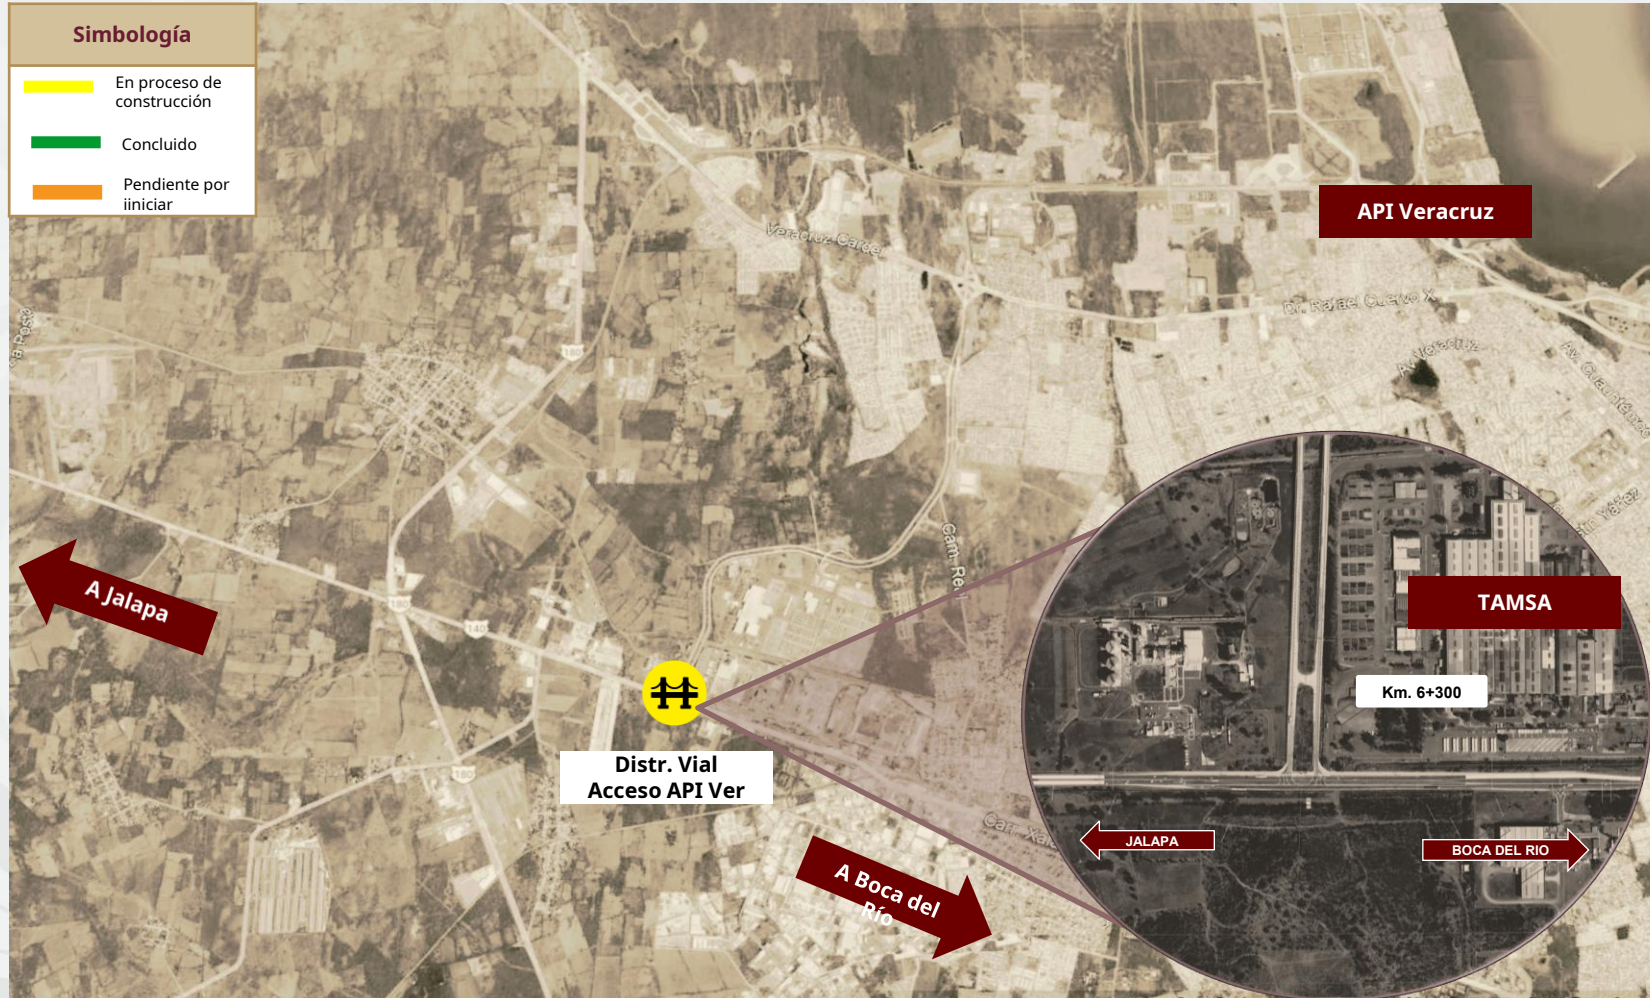

 **Inversión total: 819.7 mdp**
Meta total 2025-2026: 1.97 km
De acuerdo al cierre de la SHCP 2026

 **Inversión 2025: 319.7 mdp**
Meta 2025: 0.69 km de PSV
Inversión 2026: 500.0 mdp
Meta 2026: 1.28 km de PSV
Costo Paramétrico: 0.4 mdp/ml

 **Inicio: 14 de julio de 2025**
Término meta total: junio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

 **780,441 habitantes beneficiados**

 **2,601 empleos generados**

 **25 min ahorro en tiempo**

Beneficios

Agiliza el funcionamiento vial en la intersección con el Boulevard de acceso al Puerto de Veracruz en el Entr. TAMSA.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 10 al 16/04/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.0	-	-	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.0	-	-	Concluido en el cpo B
Cortes	m³	52,059.00	52,059.0	100.0%	0.0	-	-	Concluido en el cpo B
Terraplenes	m³	36,650.00	36,650.0	100.0%	0.0	-	-	Concluido en el cpo B
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	3,061.00	718.0	23.5%	2,343.0	2,343.00	214.0	Reprogramación
Base asfáltica	m³	3,731.00	3,131.0	83.9%	600.0	600.00	0.0	Reprogramación
Carpeta asfáltica	m³	2,425.00	0.0	0.0%	2,425.0	2,425.00	0.0	Reprogramación
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	-	-	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	-	-	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	-	-	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	0	-	-	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	132	100.0%	0	-	-	Concluido en el cpo B
Montaje de trabes	pza.	132	132	100.0%	0	-	-	Concluido en el cpo B
Losa (claro)	pza.	22	22	100.0%	0	-	-	Concluido en el cpo B
Guarnición	pza.	22	22	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Barrera Central	pza.	850	336	39.5%	514	514	140.0	Reprogramación

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

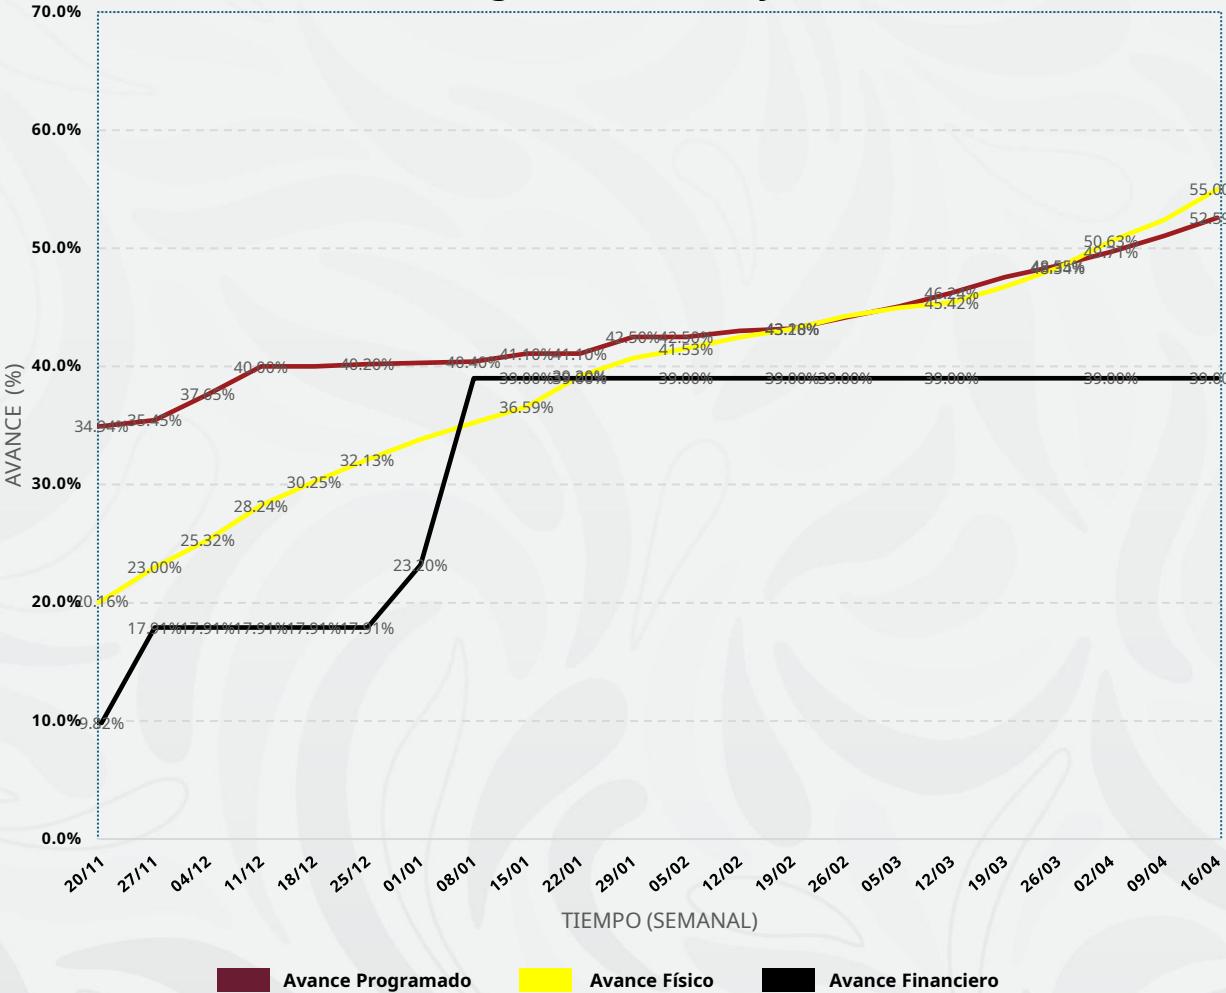

	03 de abril al 09 de Abril	10 de abril al 16 de Abril
Fuerza de Trabajo (personas)	178	179
Maquinaria	39	38
Frentes de trabajo	5	5
