

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 81.0%
- Real: 87.03%

- Semanal: 1.24%
- Financiero: 60.13%

(Concluido, se trabajan vialidades laterales)



Inversión total 2025-2026: 404.1 mdp

Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total



Inversión 2025: 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*

Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km

Inversión 2026: 180.0 mdp

Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km



Inicio: 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*

Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales



862,037 Habitantes beneficiados



1,215 empleos generados



20 min ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas


- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

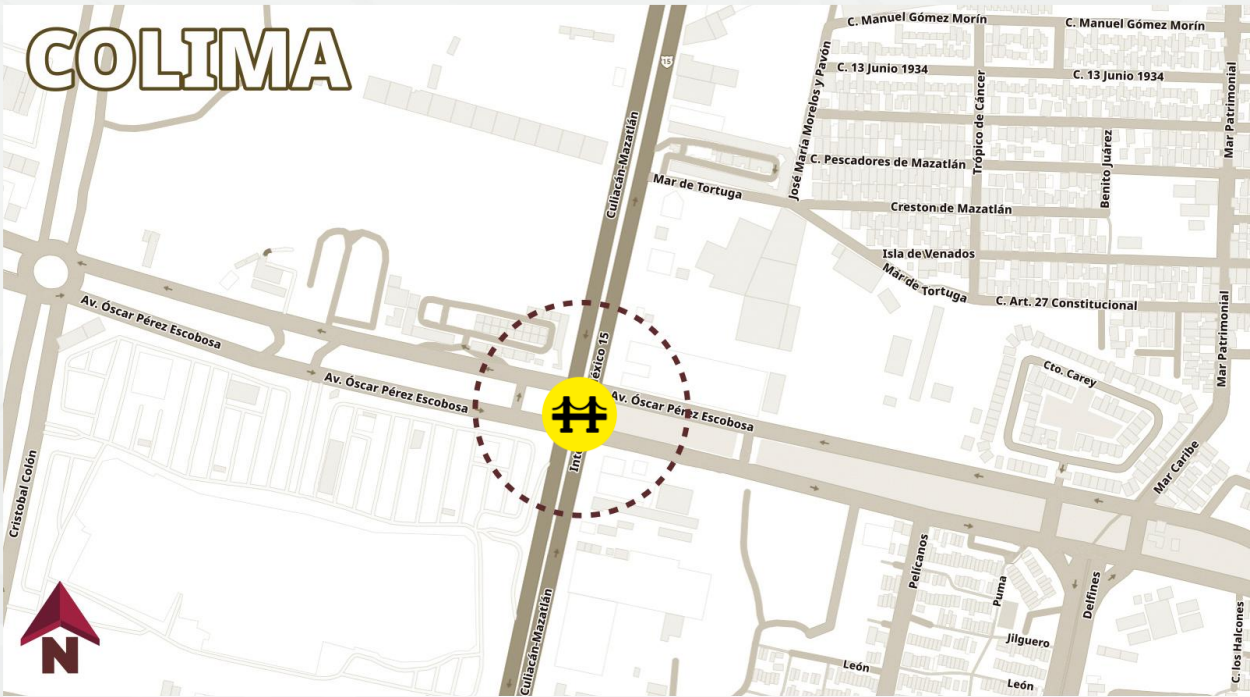

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

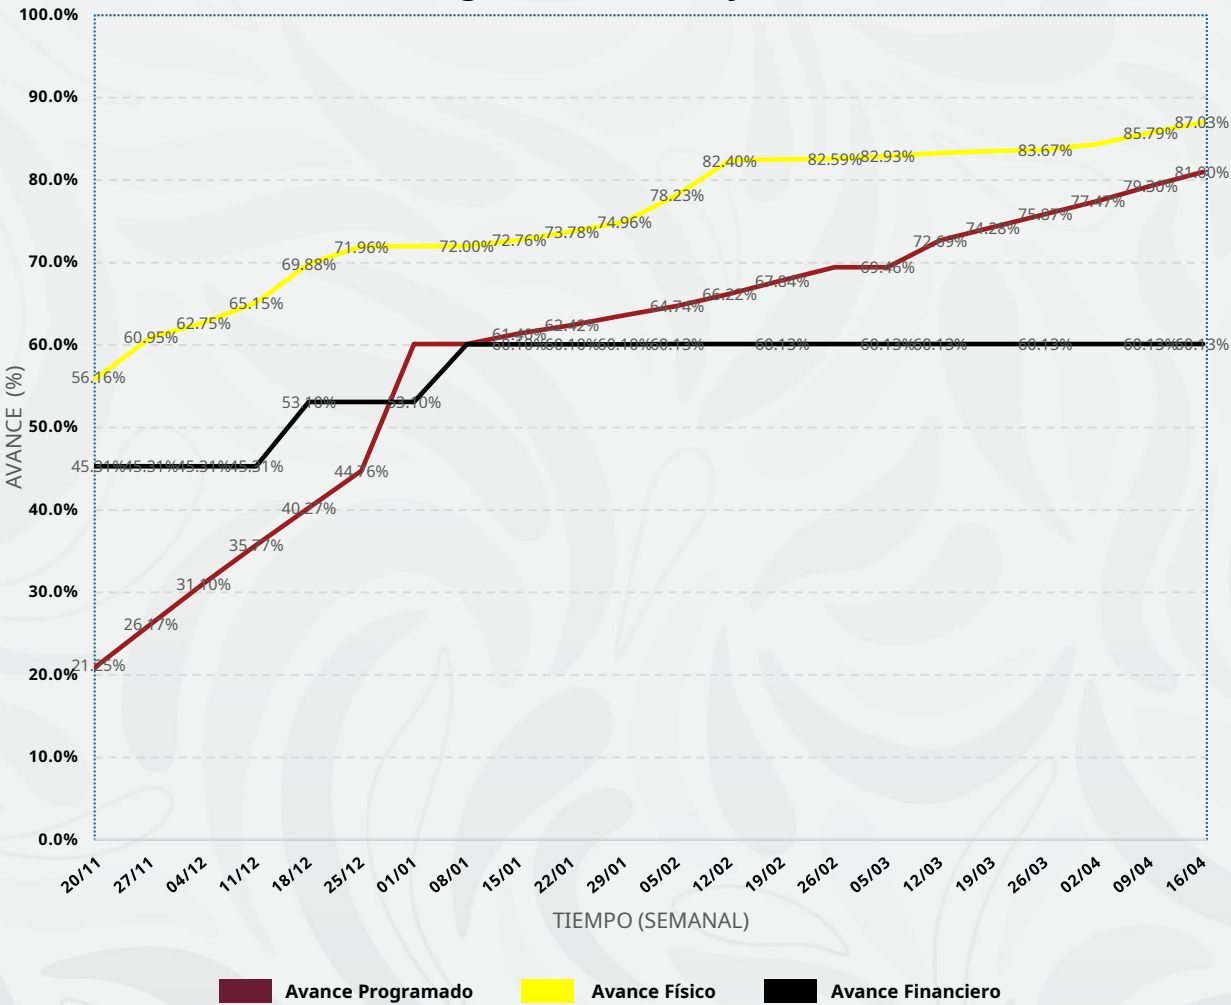

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 10/04/2026 al 16/04/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	-	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	-	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico Accesos	Pieza	3	3	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Parapeto	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	1	50.0%	1	0.5	0.0	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Alumbrado	Actividad	2	2	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Señalamiento	Actividad	2	0.25	12.5%	2	0.3	0.0	En proceso
Semaforización	Actividad	1	1	100.0%	0	-	0.0	Concluido
Barrera Central	m	587.0	587.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,291.9	38.8%	2,037.91	416.2	0.0	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,243.9	38.8%	1,962.21	356.2	0.0	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	300	38.8%	473.25	85.9	0.0	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	2,559.0	50.9%	2,473.0	0	225.0	En proceso
Relleno Fluido	m3	2,174.0	1,094.0	50.3%	1,080.0	0	0.0	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	7,468	31.9%	15,952.0	0	3,100.0	En proceso
Banqueta	m2	6,922.0	3,429.0	49.5%	3,493.0	0	1,301.0	En proceso
Relleno	m3	692.0	464.0	67.1%	228.0	0	0.0	En proceso

	Del 03 de Abril al 09 de Abril	Del 10 de Abril al 16 de Abril
Personal	83	83
Maquinaria	14	14
Frentes de trabajo	7	7
