

# Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Gobierno de  
**México**


**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance global**

- Programado: 20.4%
- Real: 34.87%
- Semanal: 1.81%
- Financiero: 26.9%

**Avance 2025**

- Programado: 74.5%
- Real: 99.6%
- Semanal: 2.6%
- Financiero: 75.6%

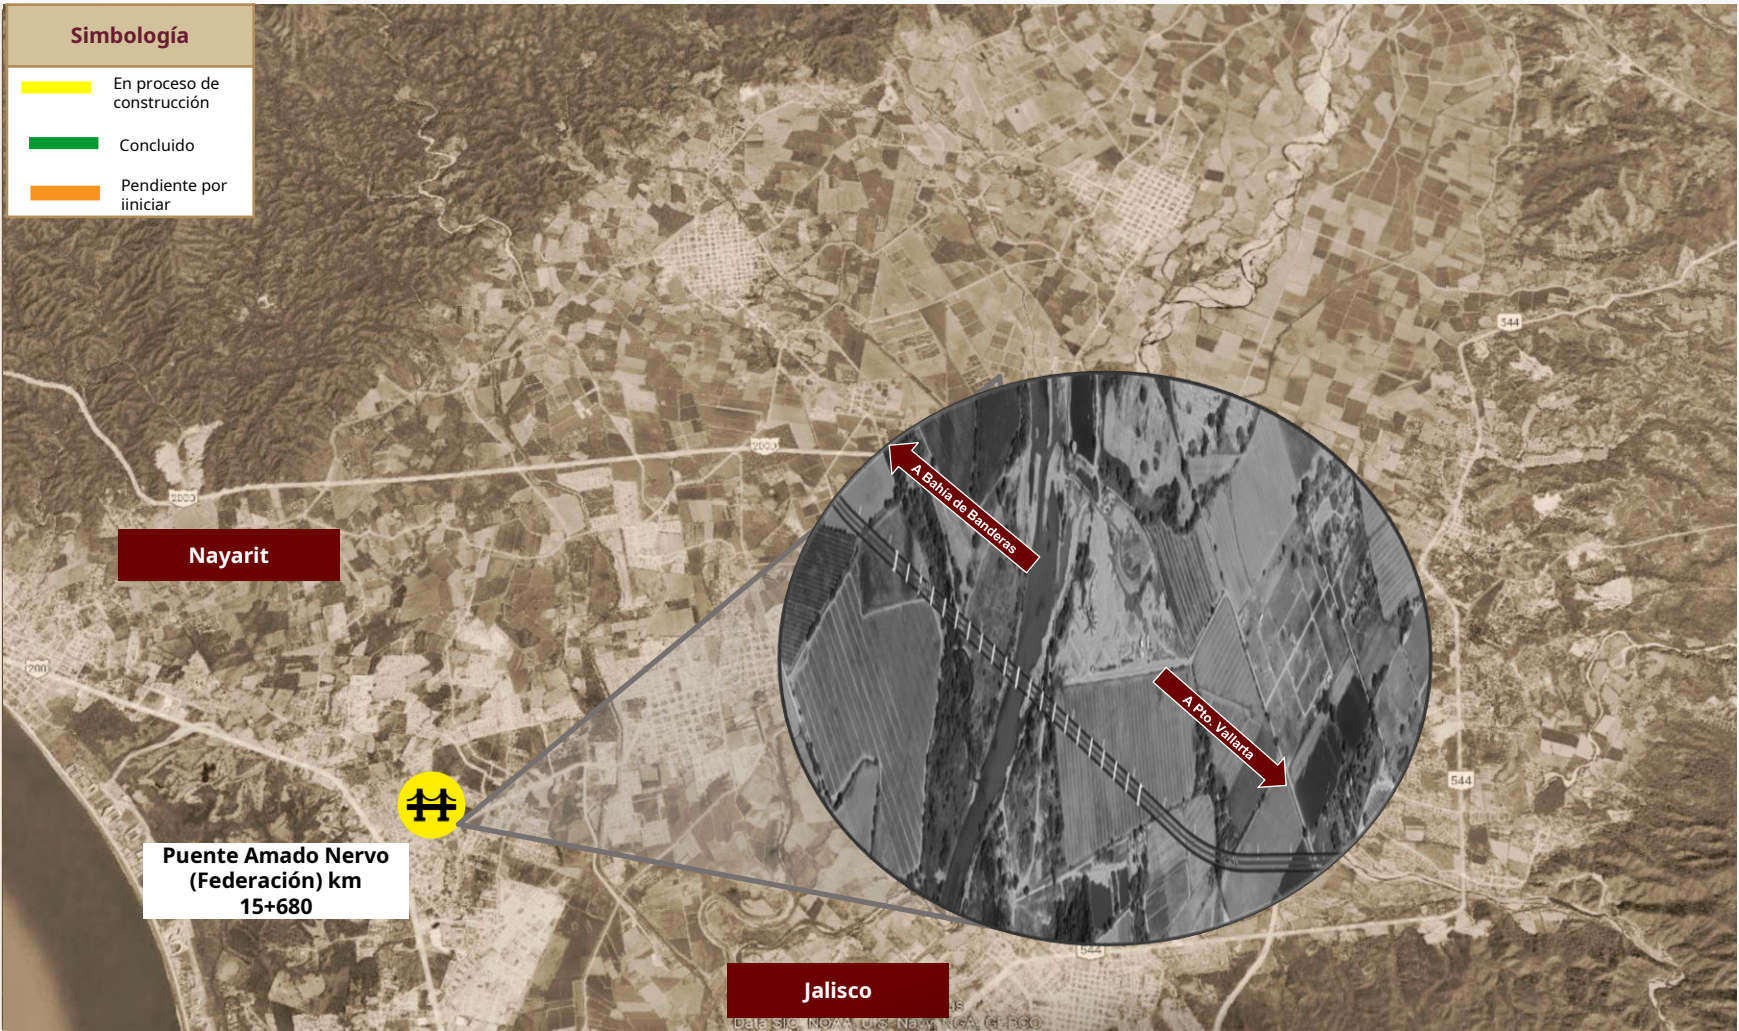

- Inversión total 2025-2026:** 900.0 mdp  
**Inversión 2025:** 230.0 mdp | 0.6 km de Puente
- Meta total:** 1 Puente | 0.798 km  
Accesos | 1.222 km
- Inicio:** 14 de julio de 2025  
**Término:** Septiembre de 2026  
**Termino meta 2025:** 31 de diciembre
- 479,471** habitantes beneficiados
- 2,700** empleos generados
- 25 min** ahorro en tiempo


**Empresas**

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

# Puente Amado Nervo(Federación) km. 15+680

## (Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

| Elemento                         | Unidad | Volumen<br>Total | Ejecutado<br>Acumulado | Faltante | Ejecutado del 26 al<br>01/01/2026 |           | Observaciones |                                                                                 |
|----------------------------------|--------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |        |                  |                        |          | Programado                        | Ejecutado |               |                                                                                 |
| ACCESOS                          |        |                  |                        |          |                                   |           |               |                                                                                 |
| Desmonte                         | Ha.    | 7.0              | 2.00                   | 28.6%    | 5.00                              | 5.00      | 0             | Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.                       |
| Despalme                         | m3     | 14,042.0         | 7,689.0                | 54.8%    | 6,353.0                           | 6,353.00  | 0             | Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco                        |
| Cortes                           | m3     | 10,823.0         | 0                      | 0.0%     | 10,823.0                          | 10,823.00 | 0             |                                                                                 |
| Terraplenes                      | m3     | 161,117.0        | 47,250                 | 29.3%    | 113,867.0                         | 3,838.20  | 985           | Se continuan trabajos de pedraplén en lado Jalisco.                             |
| Base Estabilizada                | m3     | 6,192.0          | 0                      | 0.0%     | 6,192.0                           | 0.00      | 0             |                                                                                 |
| Losa de Concreto Hidráulico      | m3     | 9,687.0          | 0                      | 0.0%     | 9,687.0                           | 0.00      | 0             |                                                                                 |
| Losas de Acceso                  | m3     | 83.0             | 0                      | 0.0%     | 83.0                              | 0.00      | 0             |                                                                                 |
| INFRAESTRUCTURA                  |        |                  |                        |          |                                   |           |               |                                                                                 |
| Pilotes                          | pza.   | 126              | 126                    | 100.0%   | 0                                 | 0         | 1             | Se tienen colados 125 pilotes                                                   |
| SUBESTRUCTURA                    |        |                  |                        |          |                                   |           |               |                                                                                 |
| Columnas                         | pza.   | 126              | 113                    | 89.7%    | 13                                | 1         | 0             | Se tienen coladas 113 columnas                                                  |
| Cabezales                        | pza.   | 21               | 17                     | 81.0%    | 4                                 | 0         | 2             | Se tienen colados 15 cabezales de los apoyos 1, 2, 4 al 6 y 12 al 21            |
| SUPERESTRUCTURA                  |        |                  |                        |          |                                   |           |               |                                                                                 |
| Trabes tipo NU-220 (fabricación) | pza.   | 160              | 43                     | 26.9%    | 117                               | 5         | 8             | Se tienen coladas 27 trabes y se trabaja en los armados de 2 adicionales.       |
| Trabes tipo NU-220 (montaje)     | pza.   | 160              | 35                     | 21.9%    | 125                               | 8         | 4             |                                                                                 |
| Losas y Diafragmas               | m3     | 4,450.40         | 0                      | 0.0%     | 4,450.40                          | 0         | 0             |                                                                                 |
| Parapeto y Guarnición            | m      | 1,597.00         | 0                      | 0.0%     | 1,597.00                          | 0         | 0             |                                                                                 |
| Obras de Drenaje                 | pza.   | 4.00             | 2                      | 43.8%    | 2.25                              | 0         | 0             | Se continúa el acomodo de cajones de concreto prefabricados en el lado Jalisco. |
| PASOS SUPERIORES                 |        |                  |                        |          |                                   |           |               |                                                                                 |
| PSV's                            | pza.   | 2.00             | 1.1                    | 55.0%    | 0.90                              | 0.2       | 0             | Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.      |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS            |        |                  |                        |          |                                   |           |               |                                                                                 |
| Obras Complementarias            | lote.  | 1.00             | 0                      | 0.0%     | 1.00                              | 0         | 0             |                                                                                 |
| SEÑALAMIENTO                     |        |                  |                        |          |                                   |           |               |                                                                                 |
| Señalamiento                     | lote.  | 1.00             | 0                      | 0.0%     | 1.00                              | 0         | 0             |                                                                                 |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD        |        |                  |                        |          |                                   |           |               |                                                                                 |
| Dispositivos de Seguridad        | lote.  | 1.00             | 0                      | 0.0%     | 1.00                              | 0         | 0             |                                                                                 |

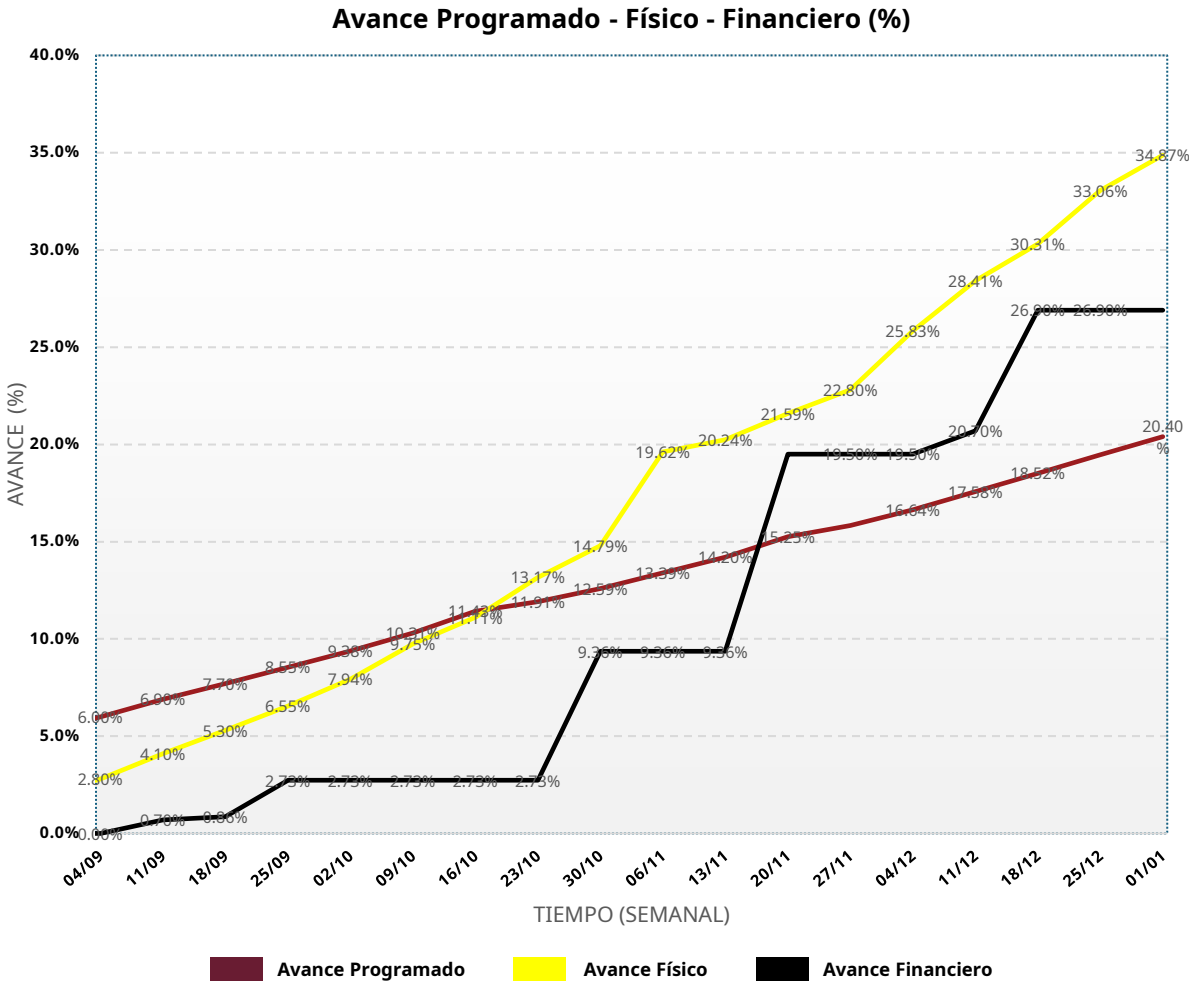

|                              | 19 de Diciembre al 25 de Diciembre | 26 de Diciembre al 01 de Enero |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 67                                 | 49                             |
| Maquinaria                   | 21                                 | 21                             |
| Frentes de trabajo           | 5                                  | 5                              |
