

PSV Arco Norte Colima

Avance global

- Programado: 35.57%
- Real: 54.76%
- Semanal: 0.86%
- Financiero: 34.11%

Avance 2025


- Programado: 100.0%
- Real: 100.00%
- Financiero: 100.0%

* La meta 2025 ya se cumplió, pero se continúa con actividades en obra.

- **Inversión total 2025-2026:** 436 mdp
- Inversión 2025:** 185.0 mdp
- **Meta total:** 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.
- Meta 2025:** 200.6 m (34.1% (cimentación y subestructura))
- **Inicio:** 10 de junio de 2025
- Término:** abril 2026
- Término meta 2025:** diciembre

- **306,810** habitantes beneficiados
- **1,109** empleos generados
- **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular “Arco Norte”	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V
	• Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V

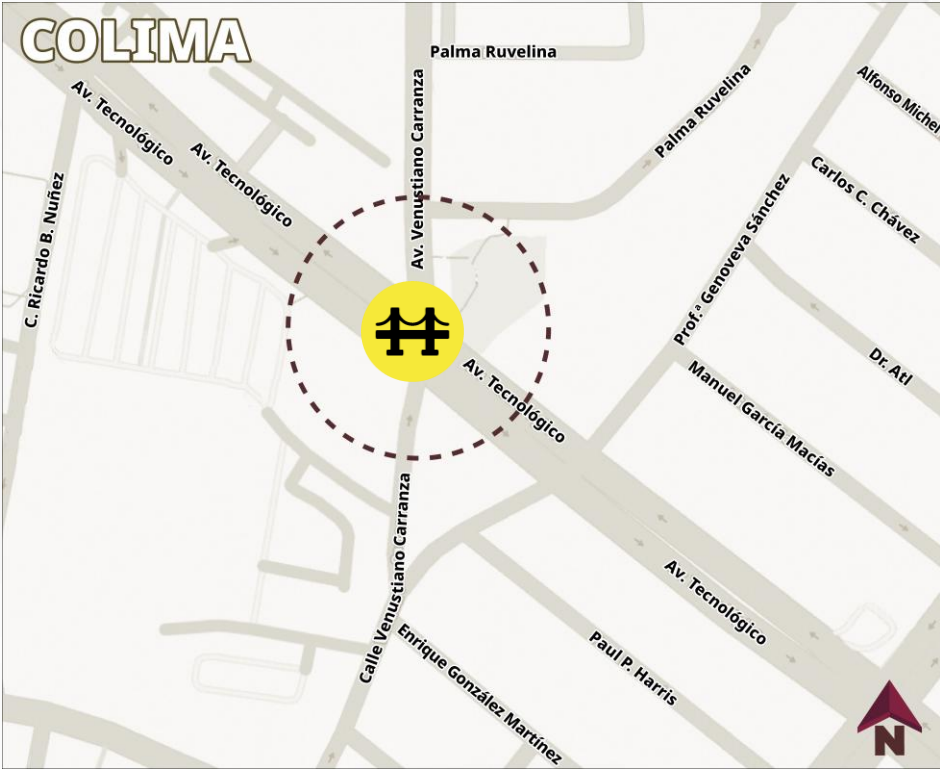

Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

PSV Libramiento Arco Norte

Colima




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	26/12/25 al 01/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos						
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00	
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00	
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00	
Terracerías						
Corte (m³)	9,295.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	
Terraplén (m³)	9,292.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	
Subyacente (m³)	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	
Subrasante (m³)	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	
Subestructura						
Pilas (pza)	76.00	76.00	0.00	4.13	0.00	
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	1.25	0.00	
Columnas (pza)	42.00	42.00	0.00	2.63	0.00	
Cabezales (pza)	22.00	22.00	0.00	1.38	0.00	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

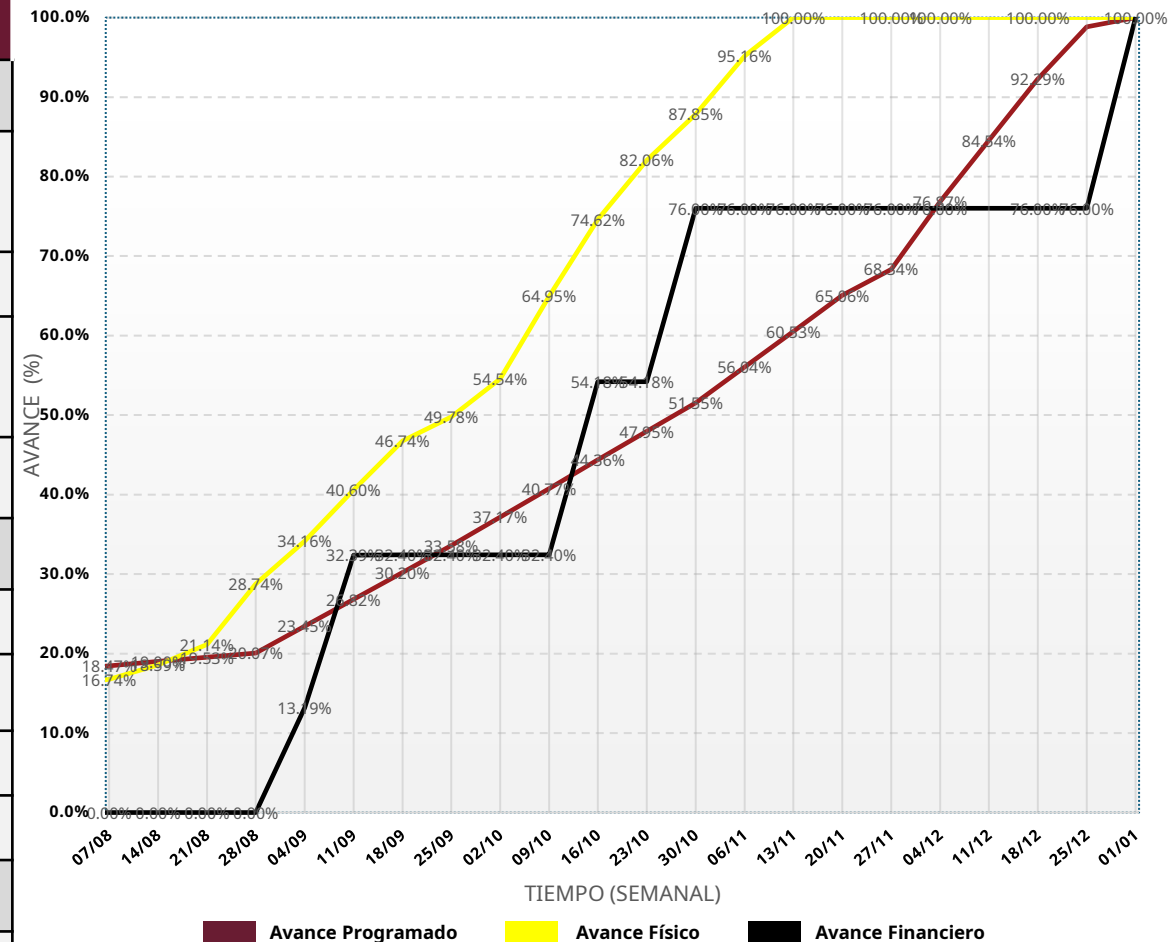

	19 de diciembre al 25 de diciembre	26 de diciembre al 01 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	70	70
Maquinaria	19	19
Frentes de trabajo	5	5
