




Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 65.26%
- Real: 73.27%
- Semanal: 1.94%
- Financiero: 64.89%

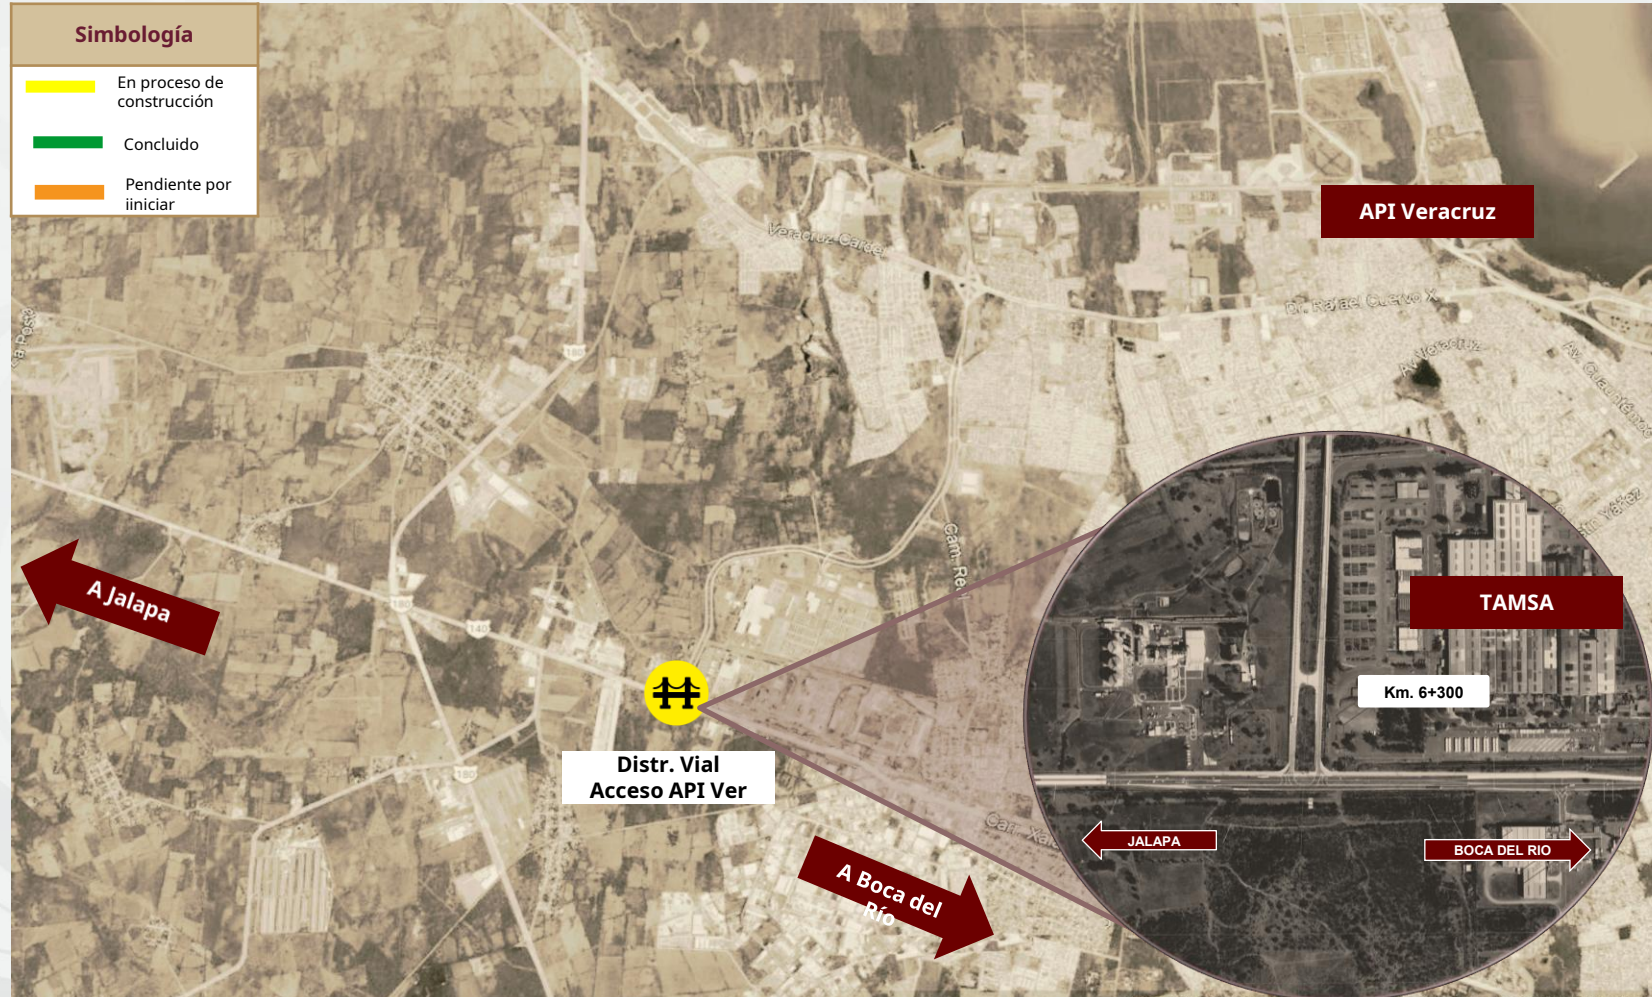

Inversión total: 819.7 mdp
Meta total 2025-2026: 1.97 km
De acuerdo al cierre de la SHCP 2026



Inversión 2025: 319.7 mdp
Meta 2025: 0.69 km de PSV
Inversión 2026: 500.0 mdp
Meta 2026: 1.28 km de PSV
Costo Paramétrico: 0.4 mdp/ml



Inicio: 14 de julio de 2025
Término meta total: 31-julio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026



780,441 habitantes beneficiados



2,601 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios

Agiliza el funcionamiento vial en la intersección con el Boulevard de acceso al Puerto de Veracruz en el Entr. TAMSA.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas


- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 05 al 11/06/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
Muro Mecánicamente Relleno	m³	19,295.00	18,829.0	97.6%	466.0	1,242.00	420.0	Reprogramación
Muro Mecánicamente Escamas	m³	2,457.00	2,175.0	88.5%	282.0	458.00	66.0	Reprogramación
Subrasante	m³	924.00	720.0	77.9%	204.0	924.00	720.0	Reprogramación
Base Hidraulica	m³	1,485.00	120.0	8.1%	1,365.0	1,485.00	120.0	Reprogramación
Base asfáltica	m³	1,039.00	0.0	0.0%	1,039.0	1,039.00	0.0	Reprogramación
Carpeta asfáltica	m³	871.00	0.0	0.0%	871.0	108.90	0.0	Reprogramación
Dala Cerramiento	m³	726.80	0.0	0.0%	726.8	726.80	0.0	Reprogramación
Defensa Metalica	m³	726.80	0.0	0.0%	726.8	726.80	0.0	Reprogramación
Barrera Central	pza.	850	850	100.0%	0	514.00	514.0	Reprogramación

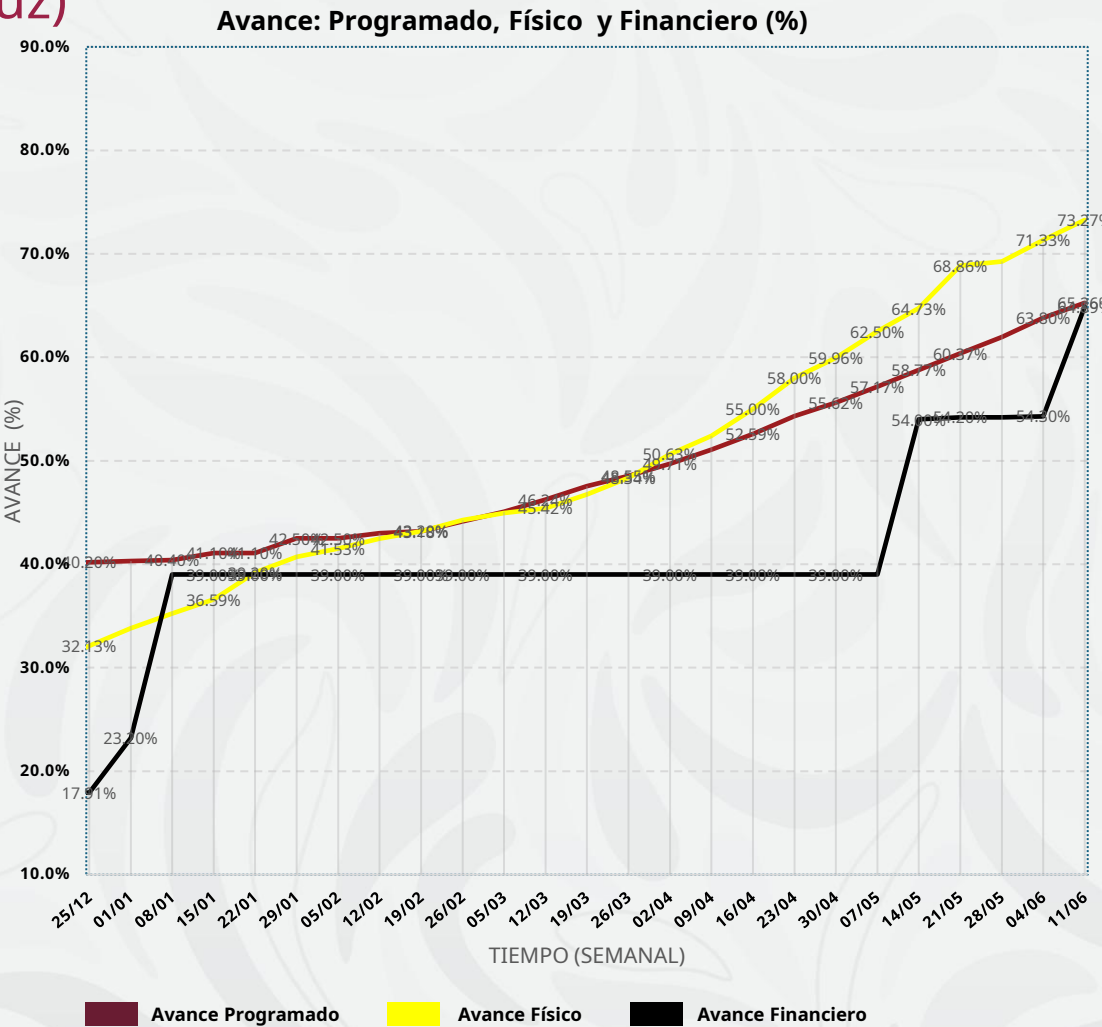

	29 de Mayo al 04 de Junio	05 de Junio al 04 de Junio
Fuerza de Trabajo (personas)	142	159
Maquinaria	35	34
Frentes de trabajo	5	5
