



Puente "Las Tunas"


Colima

Avance global

- Programado: 46.30%
- Real: 48.30%
- Semanal: 3.80%
- Financiero: 22.84%

- Inversión total:** 102.0 MDP
- Meta total:** 503.0 m longitud total (0.153 km estructuras y 0.350 km accesos)
- Inicio:** 25 de febrero de 2026
Término: 31 de agosto 2026
- 157,048** habitantes beneficiados
- 235** empleos generados
- 15 min** ahorro en tiempo
- Beneficios:**
 - Comunicación ininterrumpida en época de lluvias para las comunidades.
 - Acceso continuo a los servicios básicos como salud.
 - Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

Tramo	Empresas
Construcción Puente Las Tunas	• Contratista: MARECOMSA, S.A. de C.V • Supervisión: VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES VITED35 A.A DE C.V.

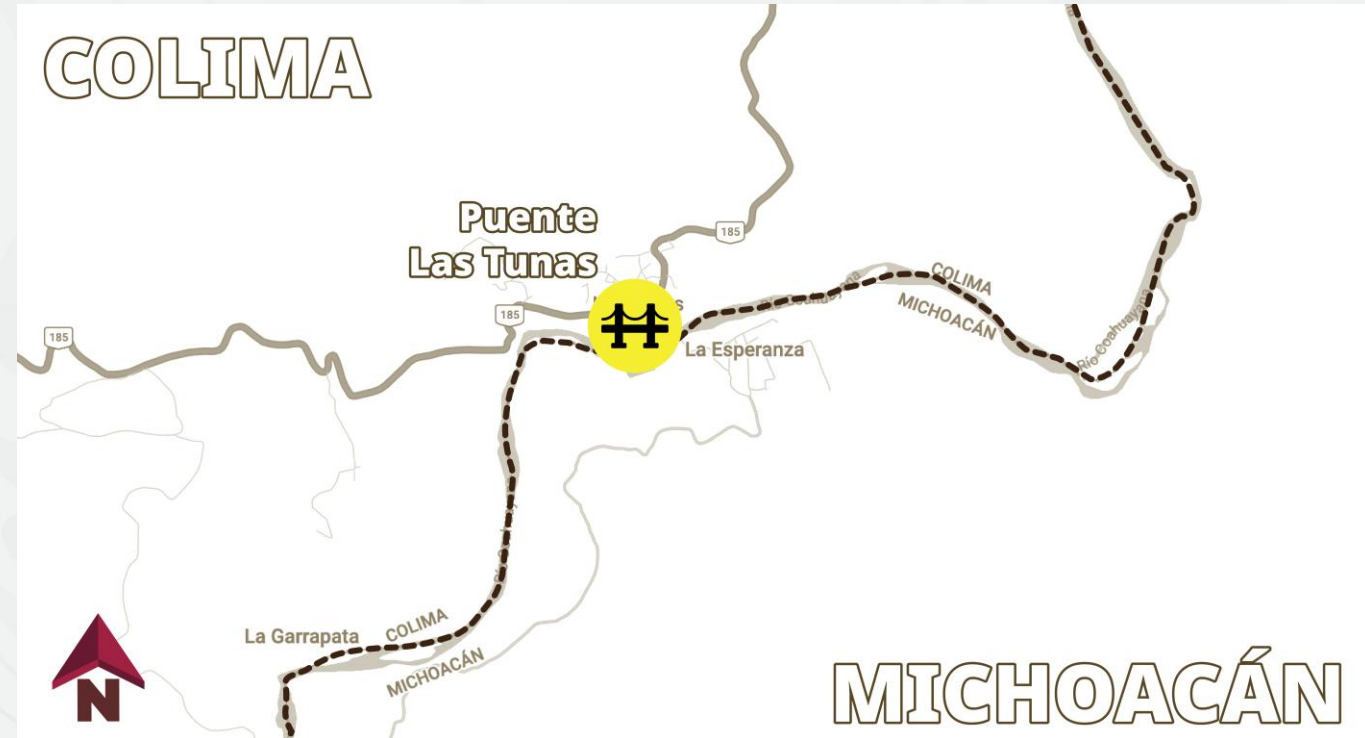

SITUACIÓN ACTUAL




IMAGEN OBJETIVO

Puente “Las Tunas”

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	05/06/26 al 11/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m3)	36,000.0	24,314.06	11,685.94	284.56	0.00	
Pilas de cimentación (Perforación) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Armado) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Colado)(Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Vigas de Atado (Pza)	4.00	4.00	0.00	0.45	0.45	Trabajos Concluidos
Columnas (Pza)	12.00	10.75	1.25	0.00	1.75	
Construcción de cabezales y bancos (Pza)	6.00	4.00	2.00	1.00	0.00	
Aleros y Muro de Contención (Pza)	4.00	0.00	4.00	0.50	0.00	
Fabricación de traveses AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	25.00	0.00	0.0	0.0	Trabajos Concluidos
Suministro de traveses AASHTO Tipo IV (Pza)	25.0	5.00	20.0	0.0	0.0	
Montaje de traveses AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	5.00	20.00	4.00	5.00	
Colado de diafragma y losa (m3)	376.81	0.00	376.81	0.00	0.00	
Carpeta Asfáltica (m3)	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	
Guarniciones y banquetas (m3)	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	
Accesos (ml)	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
Señalamiento (ml)	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

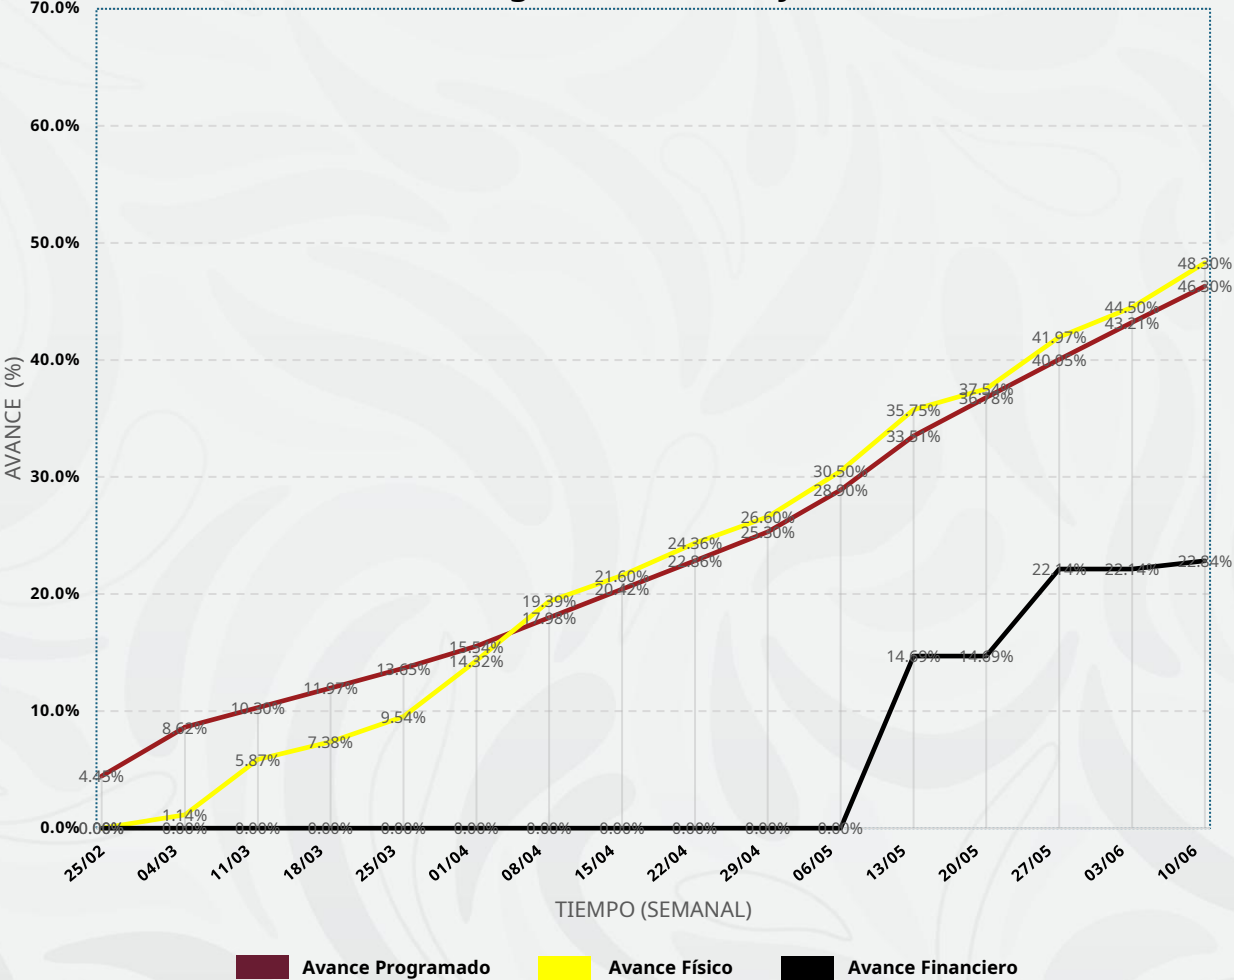

	09 de mayo al 04 de junio	05 al 11 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	34	40
Maquinaria	9	13
Frentes de trabajo	3	4
