

# Puente UAEM Morelos



**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance global** • Programado: 9.57%  
• Real: 9.49%  
• Semanal: 0.00%  
• Financiero: 0.00%

**Inversión total:** 400.0 MDP

**Meta total:** 1.0 km.  
• 0.3 km puente y viaducto  
• 0.7 km accesos (4 gazas principales)

|  |                 |                              |                         |
|--|-----------------|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Inicio:</b>  | <b>Original</b>              | <b>Modificado</b>       |
|  | <b>Término:</b> | Marzo 2026<br>Noviembre 2026 | Mayo 2026<br>Abril 2027 |

**450,000** habitantes beneficiados

**1,200** empleos generados

**45 min** ahorro en tiempo


## Beneficios:

- Acceso continuo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

**Acceso vehicular a la UAEM con estructura principal de 2 carriles de circulación y ramal de acceso principal de 4 carriles de circulación.**

| Tramo                    | Empresas                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción Puente UAEM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contratista:</b> Grupo Constructor TRANSPORTIEREN, S.A. de C.V., en participación conjunta con JAVA Soluciones Energéticas y Construcción, S.A. de C.V.</li> <li>• <b>Supervisión:</b> ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.</li> </ul> |

## OBRA EN PROCESO

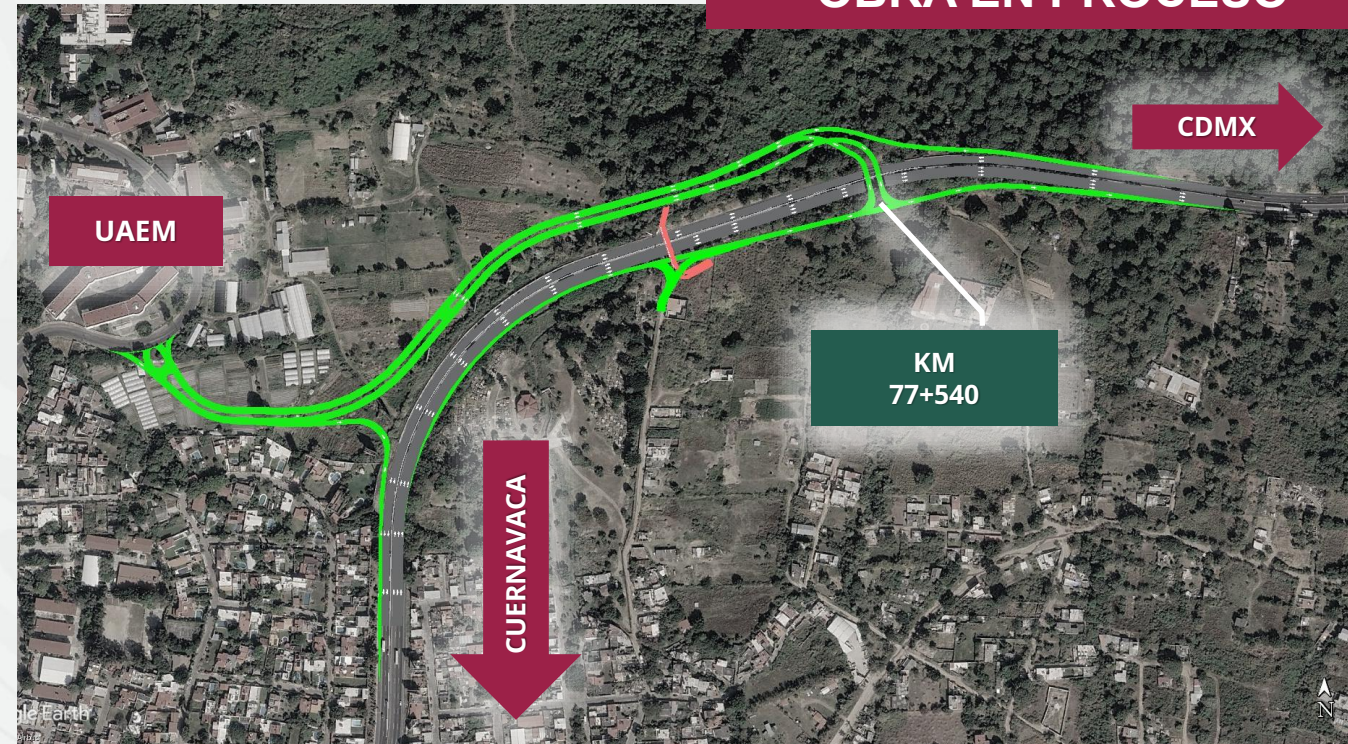


No se iniciaron trabajos el 17 de marzo, debido a que la comunidad estudiantil estuvo en paro, así como a la faltan anuencias firmadas por Ejidos Ocoatepec y Chamilpa.

Puente UAEM  
 Morelos

Avance: Programado, Físico y Financiero

| Elemento                           | Meta      | Ejecutado acumulado | Faltante  | 29/05/26 al 04/06/26 |           | Observaciones |
|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|
|                                    |           |                     |           | Programado           | Ejecutado |               |
| Terracerías y Pavimentos           |           |                     |           |                      |           |               |
| Terracerías (m3)                   | 111,176.4 | 11,251.0            | 99,925.4  | 681.0                | 3,000     | En ejecución  |
| Base hidráulica (m3)               | 5,024.8   | 0.0                 | 5,024.8   | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Base asfáltica (m3)                | 2,261.2   | 0.0                 | 2,261.2   | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Carpeta asfáltica (m3)             | 1,739.1   | 0.0                 | 1,739.1   | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Estructura Paso Inferior Vehicular |           |                     |           |                      |           |               |
| MME (M3)                           | 568.1     | 0                   | 568.10    | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Zapatas (pzas)                     | 12        | 0                   | 12.00     | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Pilas (pzas)                       | 36        | 0                   | 36.00     | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Trabes (pzas)                      | 74.00     | 0.00                | 74.00     | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Montaje trabes (pzas)              | 74        | 0                   | 74.00     | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Terraplenes de Acceso (m2)         | 7159.1    | 0                   | 7,159.10  | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Losas (pzas)                       | 10.00     | 0.00                | 10.00     | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Parapeto (m)                       | 767.00    | 0.00                | 767.00    | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Guarnición (m3)                    | 110.50    | 0.00                | 110.50    | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Banquetas (m3)                     | 2,848.30  | 0.00                | 2,848.30  | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Estructura Paso Peatonal           |           |                     |           |                      |           |               |
| Zapatas (pzas)                     | 6         | 0                   | 6.00      | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Pilas (pzas)                       | 3         | 0                   | 3.00      | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Trabes (pzas)                      | 1         | 0                   | 1.00      | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Losas (pzas)                       | 6         | 0                   | 6.00      | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Muros de contención                |           |                     |           |                      |           |               |
| Excavación (m3)                    | 1261.15   | 0                   | 1,261.15  | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Relleno (m3)                       | 949.19    | 0                   | 949.19    | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Acero (ton)                        | 68.1043   | 0                   | 68.10     | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Concreto (m3)                      | 726.96    | 0                   | 726.96    | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Obras de drenaje                   |           |                     |           |                      |           |               |
| Tubo de concreto (pza)             | 3         | 0                   | 3.00      | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Losa de concreto (pza)             | 5.00      | 0.00                | 5.00      | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Boveda (pza)                       | 4         | 0                   | 4.00      | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Señalamiento                       |           |                     |           |                      |           |               |
| Horizontal (m)                     | 12,515.00 | 0.00                | 12,515.00 | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Vertical (pza)                     | 183       | 0                   | 183.00    | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Obra complementaria                |           |                     |           |                      |           |               |
| Defensa metalica (ml)              | 963       | 0                   | 963.00    | -                    | -         | Sin iniciar   |
| Cunetas (ml)                       | 509.6     | 0                   | 509.60    | -                    | -         | Sin iniciar   |

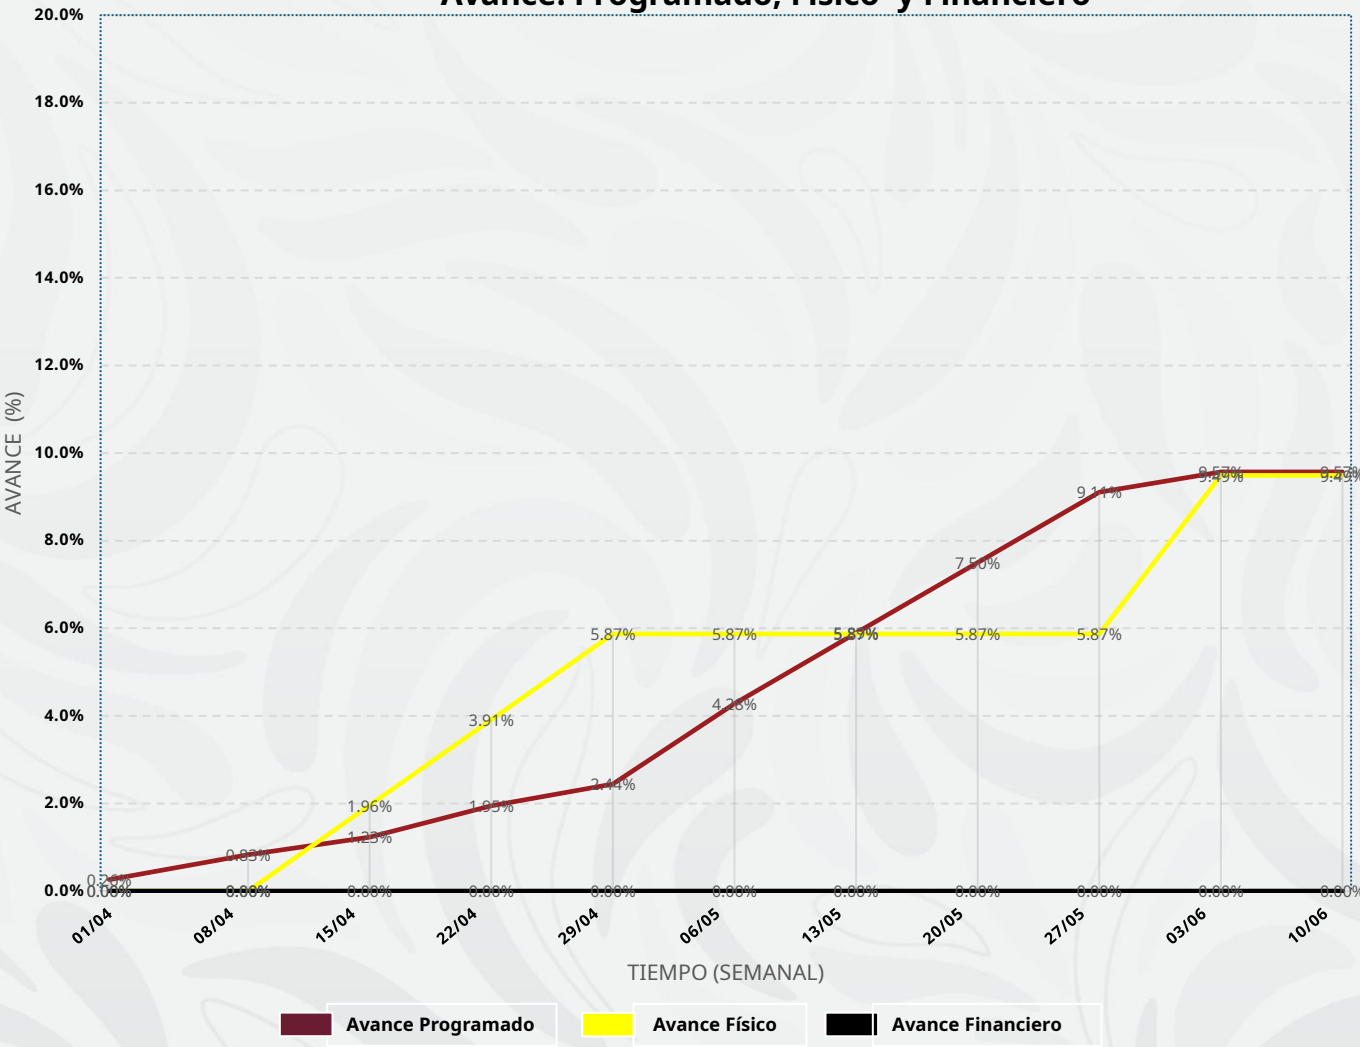

|                              | 22 de mayo al 28 de mayo | 29 de mayo al 04 de junio |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 9                        | 13                        |
| Maquinaria                   | 2                        | 4                         |
| Frentes de trabajo           | 1                        | 2                         |
