

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 94.77%
- Real: 95.82%
- Semanal: 3.46%
- Financiero: 87.9%



Inversión total 2025-2026: 424.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total



Inversión 2025: 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 200.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km



Inicio: 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales



862,037 Habitantes beneficiados



1,215 empleos generados



20 min ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

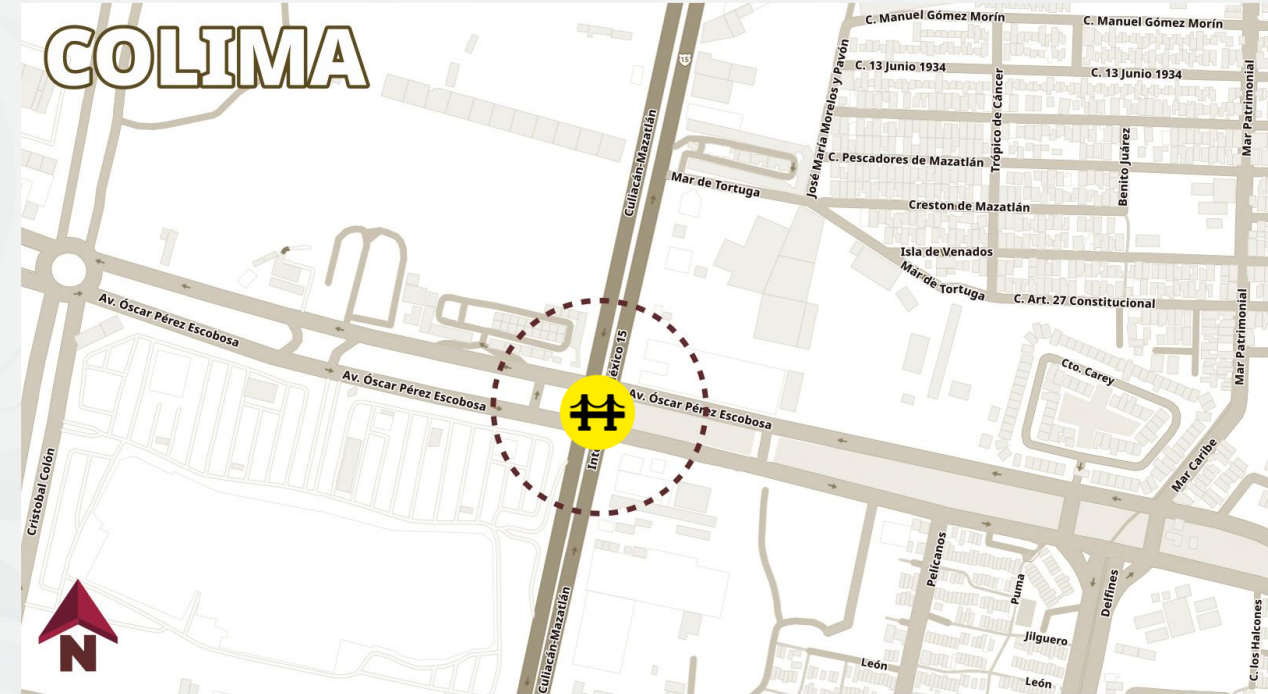


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

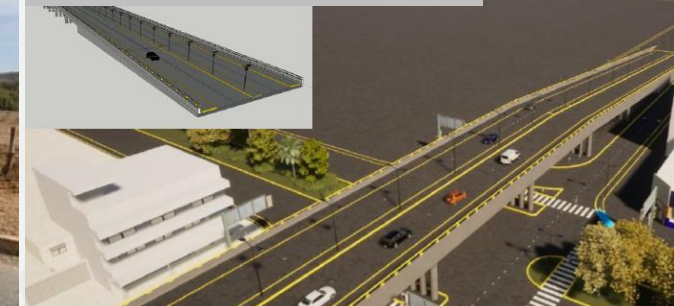

Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 05/06/26 al 11/06/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	2.0	100.0%	0	0.5	0.7	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Señalamiento	Actividad	2	0.25	12.5%	1.8	1.8	0.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL								
Excavación	m3	4,465.00	4,076.3	91.3%	388.70	388.7	0.0	En proceso
Relleno	m3	1,358.00	1,243.0	91.5%	115.00	115.0	0.0	En proceso
Cajón prefabricado de 1.5x1.0m HS-20	m	337.00	337.0	100.0%	0.00	-	0.0	En proceso
Tubo PEAD de 0.30m -0.90 m de Diam.	m	1,239.00	972.0	78.5%	267.00	267.0	0.0	En proceso
Coladera de piso y banqueteta	pza	37.00	24	64.9%	13.00	4.1	0.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,918.0	57.6%	1,411.80	1,411.8	0.0	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,846.8	57.6%	1,359.36	1,359.3	0.0	En proceso
Tuberia P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	445.4	57.6%	327.85	328.3	0.0	En proceso
AGUA POTABLE								
Excavación	m3	1,041.50	693.0	66.5%	348.51	348.3	0.0	En proceso
Relleno	m3	975.80	649.3	66.5%	326.53	326.8	0.0	En proceso
Tuberia P.V.C. para alcantarillado aguas negras, serie 20 de 31.5cm de Diam.	m	1,030.10	685.4	66.5%	344.70	345.1	0.0	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	4,711.0	93.6%	321.0	1,145.7	328.2	En proceso
Base Hidráulica	m3	2,835.00	2,340.0	82.5%	495	1,370.6	0.0	En proceso
Riego de Impregnación	m2	12,357.0	10,173.0	82.3%	2,184.0	5,991.0	0.0	En proceso
Base Asfáltica	m3	1,862.0	1,392.0	74.8%	470.0	1,035.9	203.3	En proceso
Carpeta Asfáltica	m3	863.0	644.7	74.7%	218.3	240.3	111.1	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	13,582.0	58.0%	9,838.0	13,754.0	2,200.0	En proceso
Banqueta	m2	6,922.0	6,775.0	97.9%	147.0	745.5	444.0	En proceso
Relleno	m3	1,692.0	1,692.0	100.0%	0.0	-	0.0	En proceso

