

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

• Programado: 69.74%

• Real: 71.50%

• Semanal: 1.88%

• Financiero: 34.89%

Se ajusta el % financiero a lo que se tiene registrado de pagos en el sistema

- 

Inversión total 2025-2026: 630 mdp

Inversión 2025: 280 mdp

Inversión 2026: 350.0 mdp
- 

Meta total: 1.2 km (puente y accesos)

Meta 2025: 0.55 km (46% del puente (subestructura y accesos))

Meta 2026: 0.65 km (54% del puente (superestructura y accesos))
- 

Inicio: 03-Julio de 2025

Término: Marzo de 2026

Término meta 2025: Diciembre

Término meta 2026: Marzo (superestructura), Mayo (obra complementaria)
- 


157,048 habitantes beneficiados
- 

1,431 empleos generados
- 

15 min ahorro en tiempo

Beneficios Reducción de tiempos de traslado al poder realizar el cruce de las vías del tren, evitando tiempos de espera prolongados y “cuellos de botella”, así mismo, permitiendo agilizar el tránsito local.


Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN CONTRATO FINALIZADO 31-DIC-2025

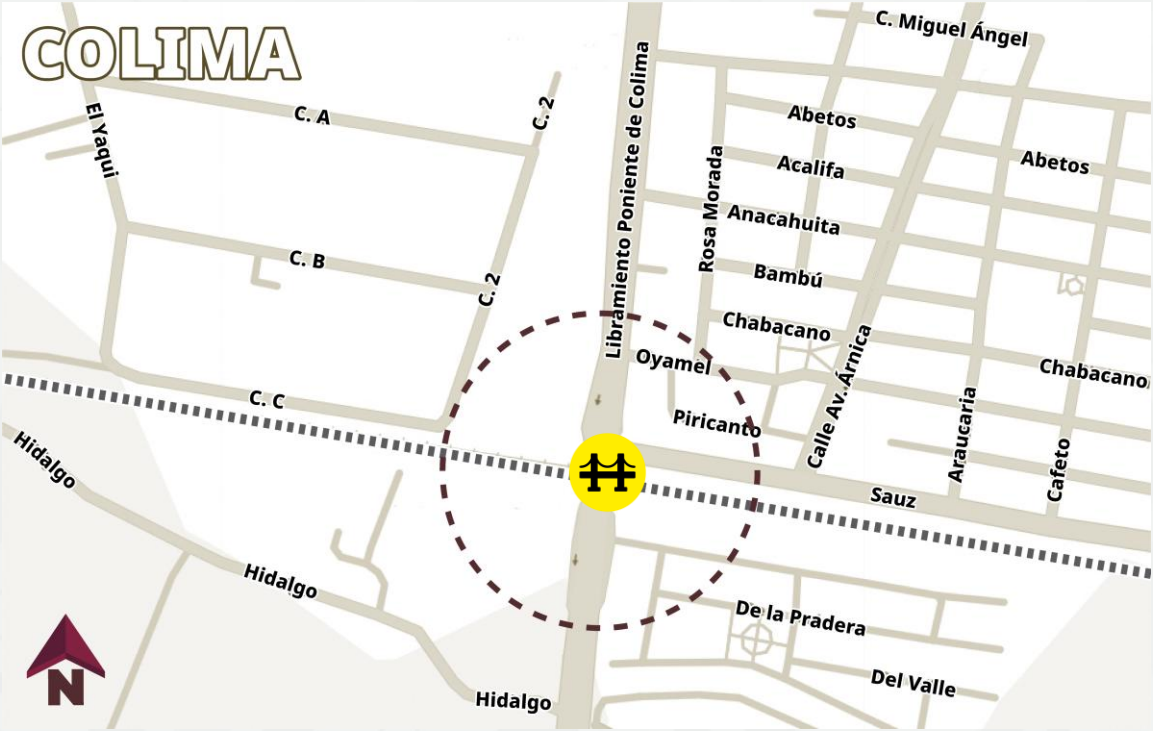

PSF Arco Sur

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

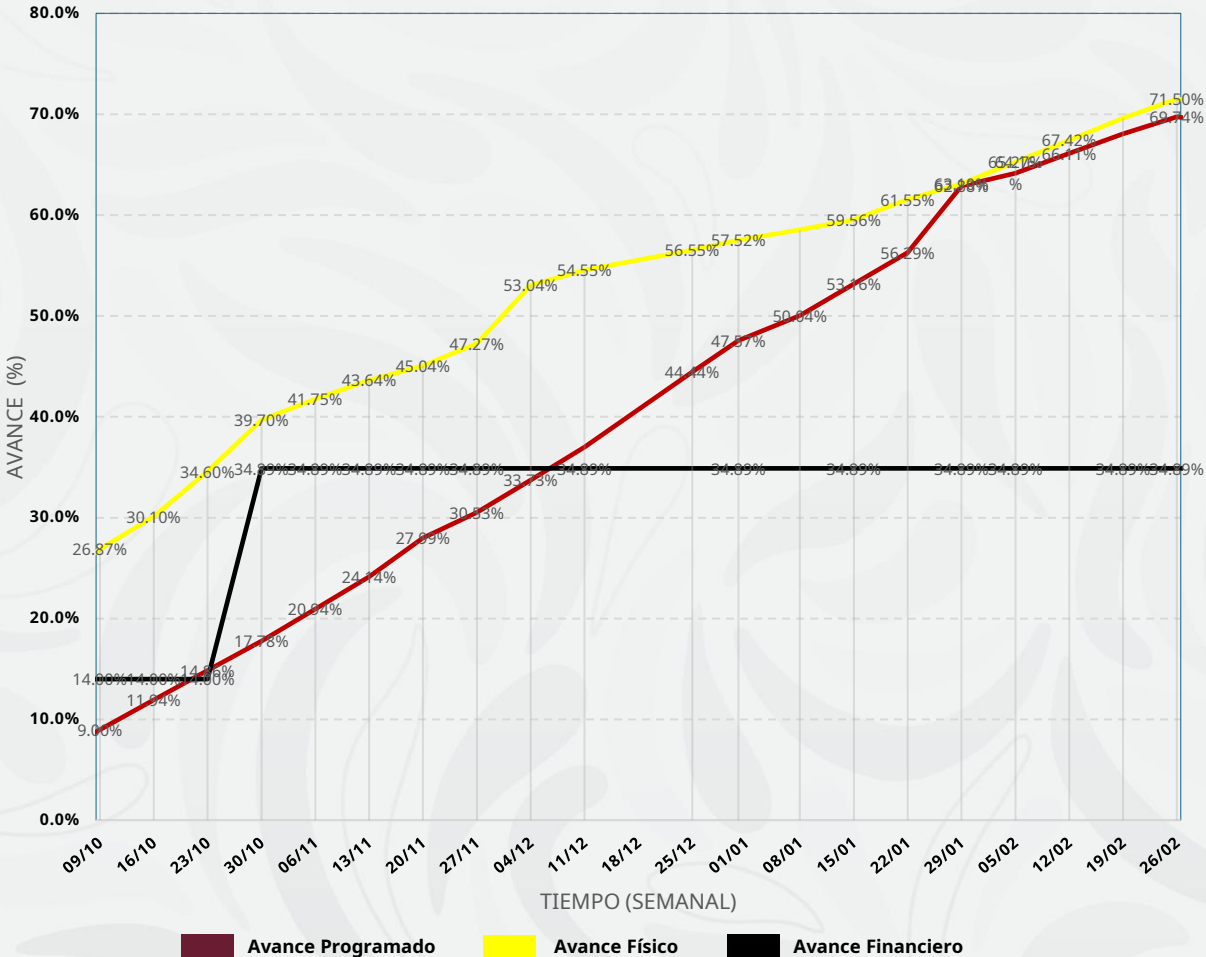

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	20/02/2026 al 26/02/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2, 477.55	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Puente lateral (pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida.
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	994.56	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	790.42	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Accesos al PSF						
Terracerías (m3)	7,319.03	6, 487.05	831.98	277.33	200.00	
Base Hidráulica (m3)	5,568.82	5, 568.82	0.00	0.00	378.71	
Carpeta asfáltica (m3)	1,909.32	295.65	1, 613.67	537.89	295.65	
Muros MME						
Muro MME (m2)	2,842.74	2, 542.92	299.82	99.94	81.64	
Carpeta asfáltica (m3)	1,402.30	0.00	1, 402.30	467.43	0.00	
Guarnición MME (m)	944.47	0.00	944.47	314.82	0.00	
Subestructura PSF						
Pilas (pza)	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Columnas (pza)	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida

	13 de febrero al 19 de febrero	20 de febrero al 26 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	171	163
Maquinaria	44	43
Fuerza de trabajo	12	11
