



Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)

Avance global

- Programado: 91.97%
- Real: 99.06%
- Semanal: 3.05%
- Financiero: 72.80%



Inversión total 2025-2026: 700 mdp

Meta total: 1.5 km deprimido y 4.1 km gasas



Inversión 2026: 380 mdp

Meta 2026: 0.22 km de Deprimido y 3.83 km de gasas



Inicio: 16 de mayo de 2025

Término: mayo de 2026



351,000 habitantes beneficiados



2,100 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios: Ofrecerá flujo continuo a los usuarios que circulan entre Cabo San Lucas y San José del Cabo y reducirá la probabilidad de accidentes al evitar entrecruzamientos a nivel con el tránsito que circula sobre la carretera federal MEX-001 Cabo San Lucas – La Paz.

Paso inferior con 2 carriles por sentido, ciclovía bidireccional y cruces peatonales




Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)

Avance: Programado, Físico y Financiero

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	08/05/26 al 14/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Reforzamiento Puente Peatonal (lote)	1.0	1.0	0.0	-	-	Concluido
Terracerías y Pavimentos						
Terracerías (m3)	14,112.0	14,112.0	0.0	-	-	Concluido
Excavación núcleo (m3)	100,069.2	100,069.2	0.0	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	11,840.0	11,840.0	0.0	-	-	Concluido
Base asfáltica (m3)	5,545.0	5,545.0	0.0	-	-	Concluido
Carpeta asfáltica (m3)	1,992.0	1,900.0	92.0	0.0	525.0	
Relleno fluido (m3)	1,680.0	1,680.0	0.0	-	-	Concluido
Pavimento rígido (m3)	3,552.0	3,552.0	0.0	0.0	22.0	Concluido
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas (pzas)	12.0	12.0	0.0	-	-	Concluido
Muros de 2 a 7 m (pzas)	12.0	12.0	0.0	-	-	Concluido
Trabes de liga (m)	1,123.6	1,123.6	0.0	-	-	Concluido
Contratrabes Metálicas (pza)	29.0	29.0	0.0	-	-	Concluido
Limpieza de pilas (m2)	7,000.0	7,000.0	0.0	-	-	Concluido
Juntas de dilatación (pza)	8.0	8.0	0.0	-	-	Concluido
Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	52.0	0.0	-	-	Concluido
Losas de acceso (m2)	609.8	609.8	0.0	-	-	Concluido
Losas puentes (m2)	1,642.8	1,642.8	0.0	-	-	Concluido
Parapeto (m)	1,725.2	1,725.2	0.0	-	-	Concluido
Guarnición (m3)	5,800.0	5,700.0	100.0	0.0	600.0	
Banquetas (m2)	10,068.0	10,068.0	0.0	0.0	1,208.0	Concluido
Drenaje Pluvial (m)	1,600.0	1,600.0	0.0	-	-	Concluido
Registros Pluviales (pza)	32.0	32.0	0.0	-	-	Concluido
Semaforización y Señalamiento						
Semaforización (%)	100.0	100.0	0.0	-	-	Concluido
Horizontal (m)	29,901.7	9,536.0	20,365.7	0.0	3,556.0	
Vertical (pza)	273.0	70.0	203.0	0.0	29.0	
Obra inducida						
Alumbrado (pza)	305.0	305.0	0.0	0.0	10.0	Concluido
Reubicación de la vegetación (pza)	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	

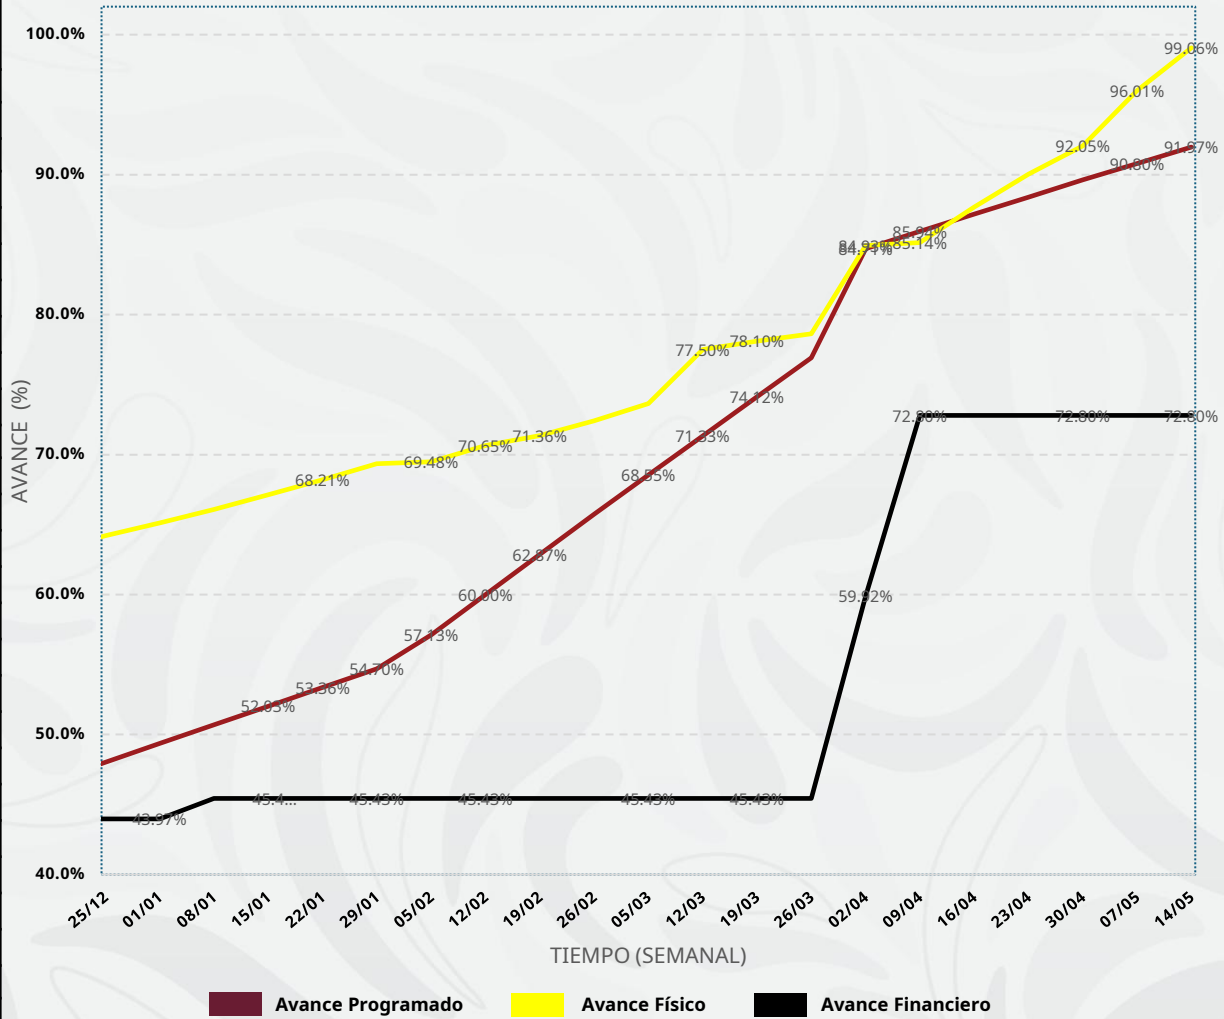

	01 de mayo al 07 de mayo	08 de mayo al 14 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	100	60
Maquinaria	20	10
Frentes de trabajo	9	7
