

Puente “Las Tunas”

Colima

Avance global


- Programado: 33.51%
- Real: 35.75%
- Semanal: 5.25%
- Financiero: 14.69%

-  **Inversión total:** 105.0 MDP
-  **Meta total:** 503.0 m longitud total (0.153 km estructuras y 0.350 km accesos)
-  **Inicio:** 25 de febrero de 2026
Término: 24 de noviembre 2026
-  **157,048** habitantes beneficiados
-  **235** empleos generados
-  **15 min** ahorro en tiempo

Beneficios:

- Comunicación ininterrumpida en época de lluvias para las comunidades.
- Acceso continuo a los servicios básicos como salud.
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

Tramo	Empresas
Construcción Puente Las Tunas	• Contratista: MARECOMSA, S.A. de C.V • Supervisión: Actualmente no se cuenta con supervisión

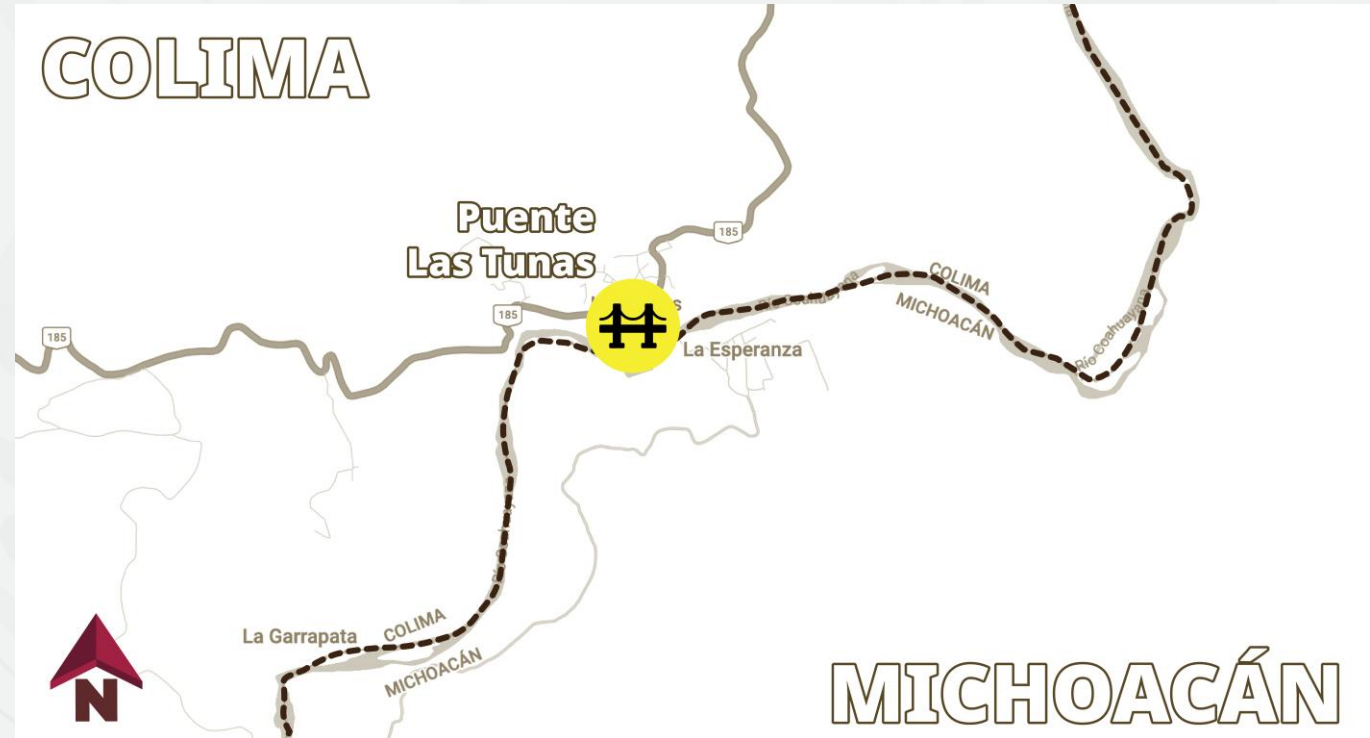


Puente “Las Tunas”

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	08/05/26 al 14/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m3)	36,000.0	24,314.06	11,685.94	284.56	0.00	
Pilas de cimentación (Perforación) (Pza)	18.00	18.00	0.00	1.00	1.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Armado) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Colado)(Pza)	18.00	18.00	0.00	2.00	2.00	Trabajos Concluidos
Vigas de Atado (Pza)	4.00	3.55	0.45	0.42	0.55	
Columnas (Pza)	12.00	7.15	4.85	0.56	1.15	
Construcción de cabezales y bancos (Pza)	6.00	2.00	4.00	1.00	0.00	
Aleros y Muro de Contención (Pza)	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
Suministro de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	13.0	12.00	5.0	13.0	
Montaje de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
Colado de diafragma y losa (m3)	376.81	0.00	376.81	0.00	0.00	
Carpeta Asfáltica (m3)	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	
Guarniciones y banquetas (m3)	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	
Accesos (ml)	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
Señalamiento (ml)	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

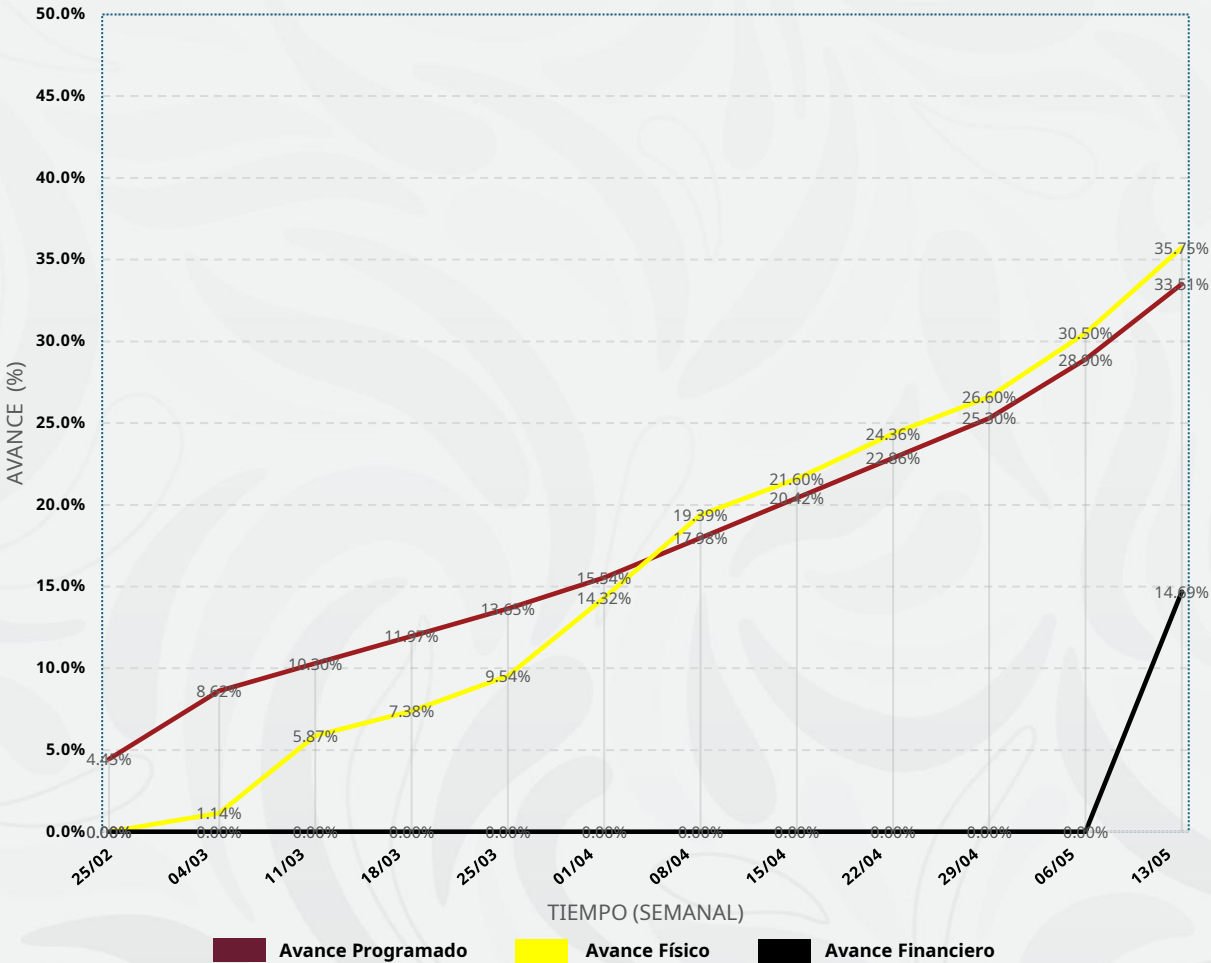

	01 al 07 de mayo	08 al 14 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	46	46
Maquinaria	10	10
Frentes de trabajo	5	5
