

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 90.17%
- Real: 90.50%
- Semanal: 1.1%
- Financiero: 81.5%

(Concluido, se trabajan vialidades laterales)

Inversión total 2025-2026: 404.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total

Inversión 2025: 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km

Inicio: 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales

862,037 Habitantes beneficiados

1,215 empleos generados

20 min ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

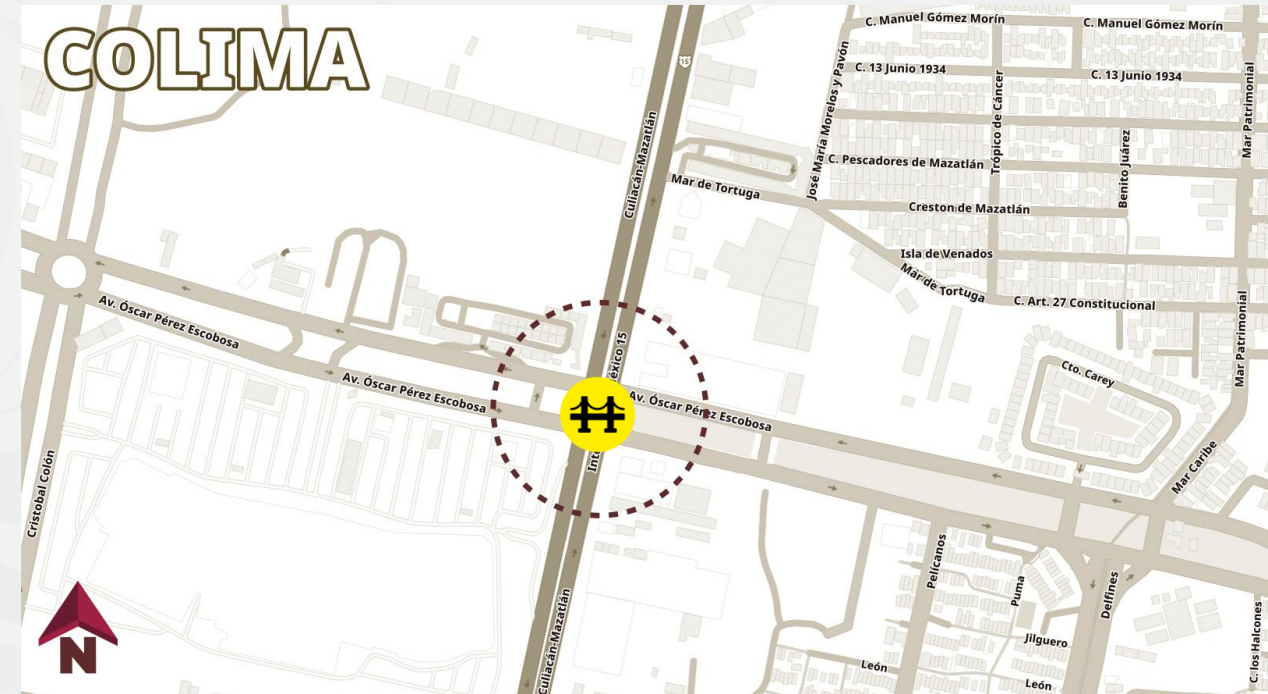

Situación actual




Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

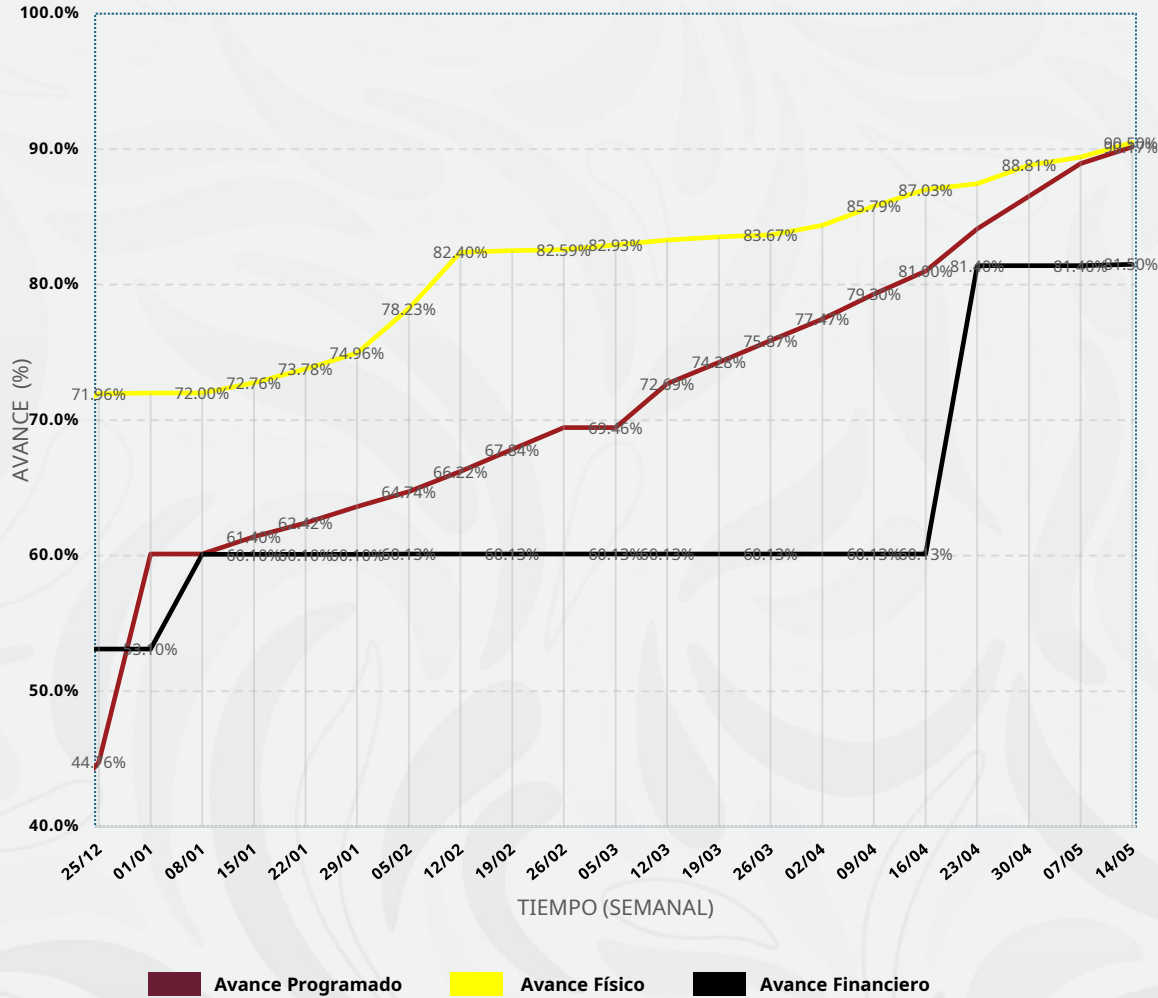

	Del 01 de Mayo al 07 de Mayo	Del 08 de Mayo al 14 de Mayo
Personal	114	114
Maquinaria	26	26
Frentes de trabajo	9	9

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 08/05/26 al 14/05/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	1.3	65.0%	1	0.5	0.0	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Señalamiento	Actividad	2	0.25	12.5%	2	0.3	0.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL								
Excavación	m3	4,465.00	4,076.3	91.3%	388.70	388.7	328.6	En proceso
Relleno	m3	1,358.00	1,243.0	91.5%	115.00	115.0	269.1	En proceso
Cajón prefabricado de 1.5x1.0m HS-20	m	337.00	337.0	100.0%	0.00	-	37.0	En proceso
Tubo PEAD de 0.30m -0.90 m de Diam.	m	1,239.00	972.0	78.5%	267.00	267.0	172.0	En proceso
Coladera de piso y banquetta	pza	37.00	24	64.9%	13.00	4.1	12.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,578.3	47.4%	1,751.51	1,751.0	286.4	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,489.1	46.4%	1,717.01	1,717.0	245.2	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	367	47.5%	406.25	85.9	67.0	En proceso
AGUA POTABLE								
Excavación	m3	1,041.50	637	61.2%	404.50	404.5	0.0	En proceso
Relleno	m3	975.80	597	61.2%	378.80	378.8	0.0	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado aguas negras, serie 20 de 31.5cm de Diam.	m	1,030.10	630	61.2%	400.10	400.1	0.0	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	3,643.3	72.4%	1,388.7	1,388.0	225.3	En proceso
Base Hidráulica	m3	2,835.00	1,157	40.8%	1,678	1,678.0	0.0	En proceso
Riego de Impregnación	m2	12,357.0	6,323	51.2%	6,034.5	6,034.0	0.0	En proceso
Base Asfáltica	m3	1,862.0	690.0	37.1%	1,172.0	1,172.0	160.7	En proceso
Carpeta Asfáltica	m3	863.0	323	37.4%	540.0	540.0	74.5	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	9,666	41.3%	13,754.0	13,754.0	0.0	En proceso
Banqueta	m2	6,922.0	5,011.0	72.4%	1,911.0	2,307.0	648.0	En proceso
Relleno	m3	1,692.0	1,692.0	100.0%	0.0	-	1,000.0	En proceso
