

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 75.87%
 - Real: 83.67%
 - Semanal: 0.14%
 - Financiero: 60.13%
- (Concluido, se trabajan vialidades laterales)

-  **Inversión total 2025-2026:** 404.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total
-  **Inversión 2025:** 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km
-  **Inicio:** 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales

 **862,037** Habitantes beneficiados

 **1,215** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

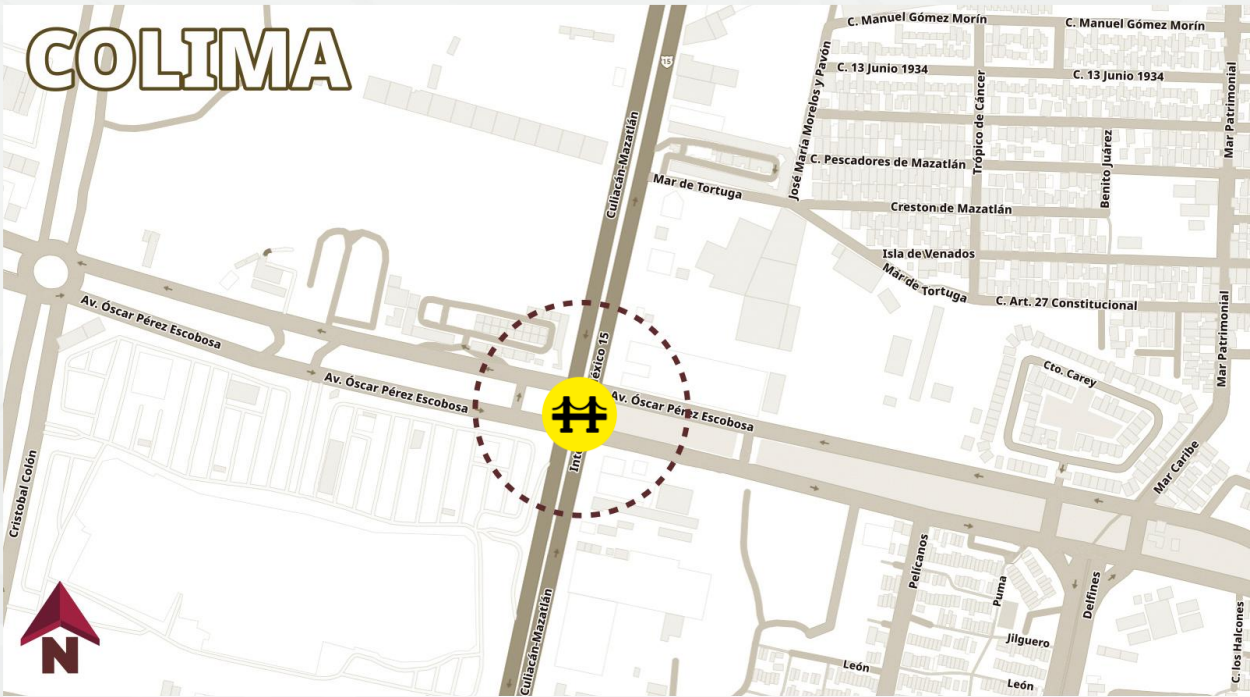

Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 20 al 26/03/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico Accesos	Pieza	3	3	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Parapeto	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	0.5	25.0%	1.5	0.5	0.0	
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Alumbrado	Actividad	2	2.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Señalamiento	Actividad	2	0.3	12.5%	1.8	0.3	0.0	En proceso
Semaforización	Actividad	1	1	100.0%	0	0.3	0.0	Concluido
Barrera Central	m	587.0	587.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,163	34.9%	2,167.12	416.2	780.7	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,099	34.3%	2,107.35	356.2	845.8	En proceso
Tuberia P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	270	34.9%	503.25	85.9	204.0	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	2,109.0	41.9%	2,923.0	0	0.0	
Relleno Fluido	m3	2,174.0	1,094.0	50.3%	1,080.0	0	0.0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	2,200	9.4%	21,220.0	0	0.0	
Banqueta	m2	6,922.0	580.0	8.4%	6,342.0	0	0.0	
Relleno	m3	692.0	464.0	67.1%	228.0	0	3.0	

