

# PSV Arco Norte Colima

**Avance global**

- Programado: 20.65%
- Real: 34.25%
- Semanal: 1.80%
- Financiero: 25.92%

**Avance 2025**

- Programado: 60.53%
- Real: 100.00%
- Semanal: 5.28%
- Financiero: 76.00%

 **Inversión total 2025-2026:** 369.7 mdp  
**Inversión 2025:** 127.4 mdp


 **Meta total:** 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.  
**Meta 2025:** 200.6 m (34.1% (cimentación y subestructura))

 **Inicio:** 10 de junio de 2025  
**Término:** 09 de junio de 2026  
**Término meta 2025:** diciembre

 **306,810** habitantes beneficiados

 **1,109** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

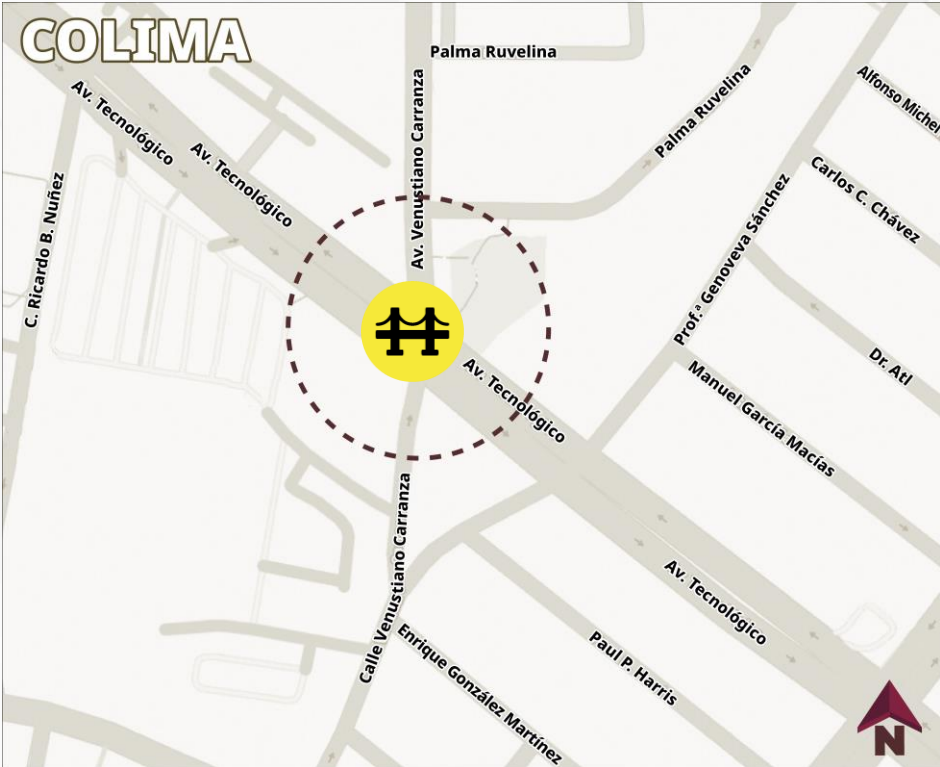

Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

| Tramo                                                 | Empresas                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte" | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V</li><li>• <b>Supervisión:</b> JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V</li></ul> |

# PSV Libramiento Arco Norte

## Colima


| Elemento                                          | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante | 07/11/25 al 13/11/25 |           |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------|-----------|
|                                                   |              |                     |          | Programado           | Ejecutado |
| Trabajos diversos                                 |              |                     |          |                      |           |
| Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza) | 530.0        | 530.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Demolición (m)                                    | 350.0        | 350.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Red de media tensión subterránea (m)              | 2,100.0      | 2,100.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Reubicación acueducto 36" (m)                     | 736.0        | 736.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Terracerías                                       |              |                     |          |                      |           |
| Corte (m³)                                        | 9,295.00     | 0.00                | 9,295.00 | 0.00                 | 0.00      |
| Terraplén (m³)                                    | 9,292.00     | 0.00                | 9,292.00 | 0.00                 | 0.00      |
| Subyacente (m³)                                   | 3,233.00     | 0.00                | 3,233.00 | 0.00                 | 0.00      |
| Subrasante (m³)                                   | 4,706.00     | 0.00                | 4,706.00 | 0.00                 | 0.00      |
| Subestructura                                     |              |                     |          |                      |           |
| Pilas (pza)                                       | 76.00        | 59.00               | 17.00    | 4.13                 | 11.00     |
| Zapatas (pza)                                     | 20.00        | 15.00               | 5.00     | 1.25                 | 0.00      |
| Columnas (pza)                                    | 42.00        | 32.00               | 10.00    | 2.63                 | 2.00      |
| Cabezales (pza)                                   | 22.00        | 14.00               | 8.00     | 1.38                 | 2.00      |



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

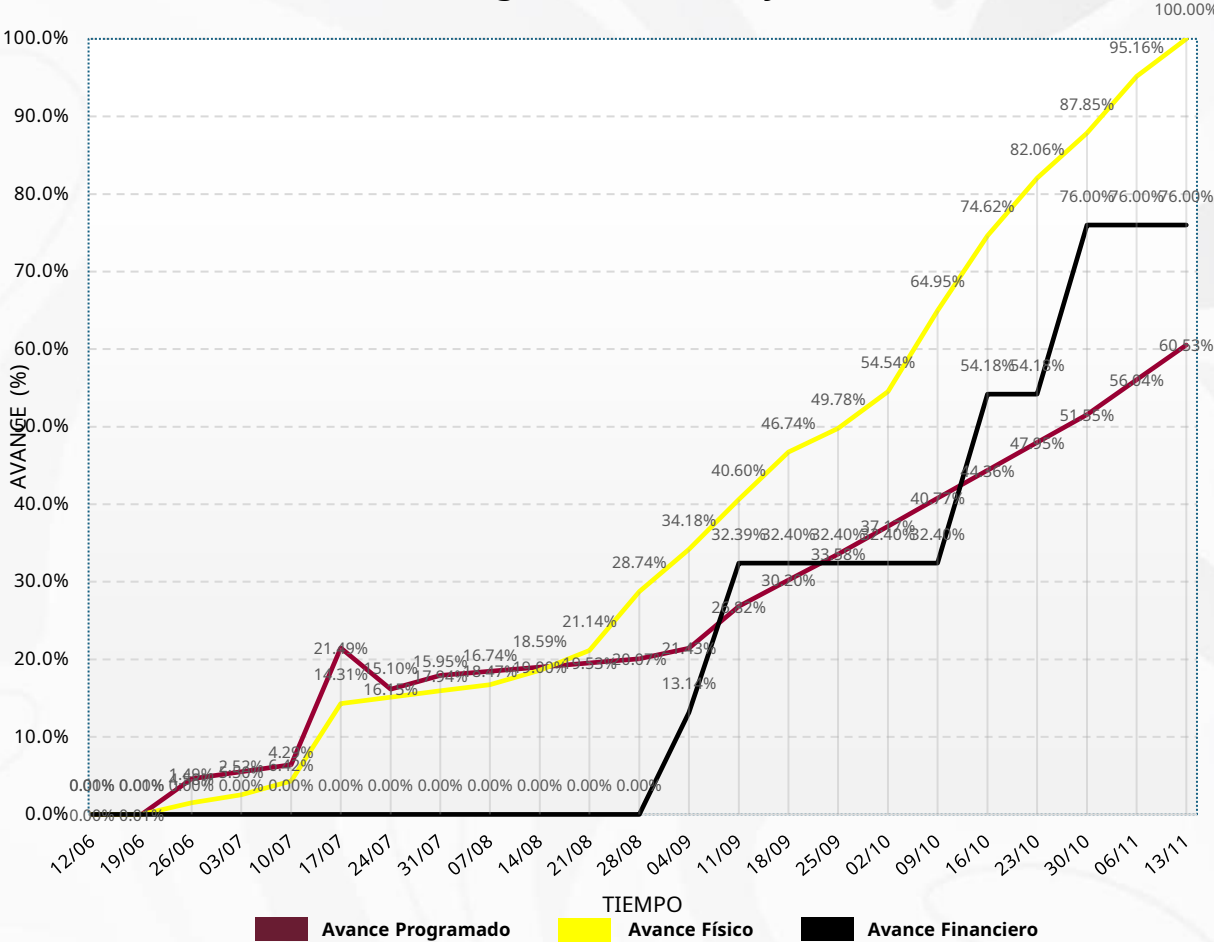

|                              | 31 de octubre al 06 de noviembre | 07 de noviembre al 13 de noviembre |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 80                               | 80                                 |
| Maquinaria                   | 17                               | 17                                 |
