

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 63.63%
- Real: 74.96%
- Semanal: 1.18%
- Financiero: 60.1%



Inversión total 2025-2026: 405.0 mdp
Inversión 2025: 225.0 mdp
Inversión 2026: 180.0 mdp



Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total
Meta 2025: 66% de PSV | 0.54 km
Meta 2026: 34% de PSV | 0.27 km



Inicio: 18 de agosto de 2025
Término: febrero 2026



862,037 Habitantes beneficiados




1,215 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

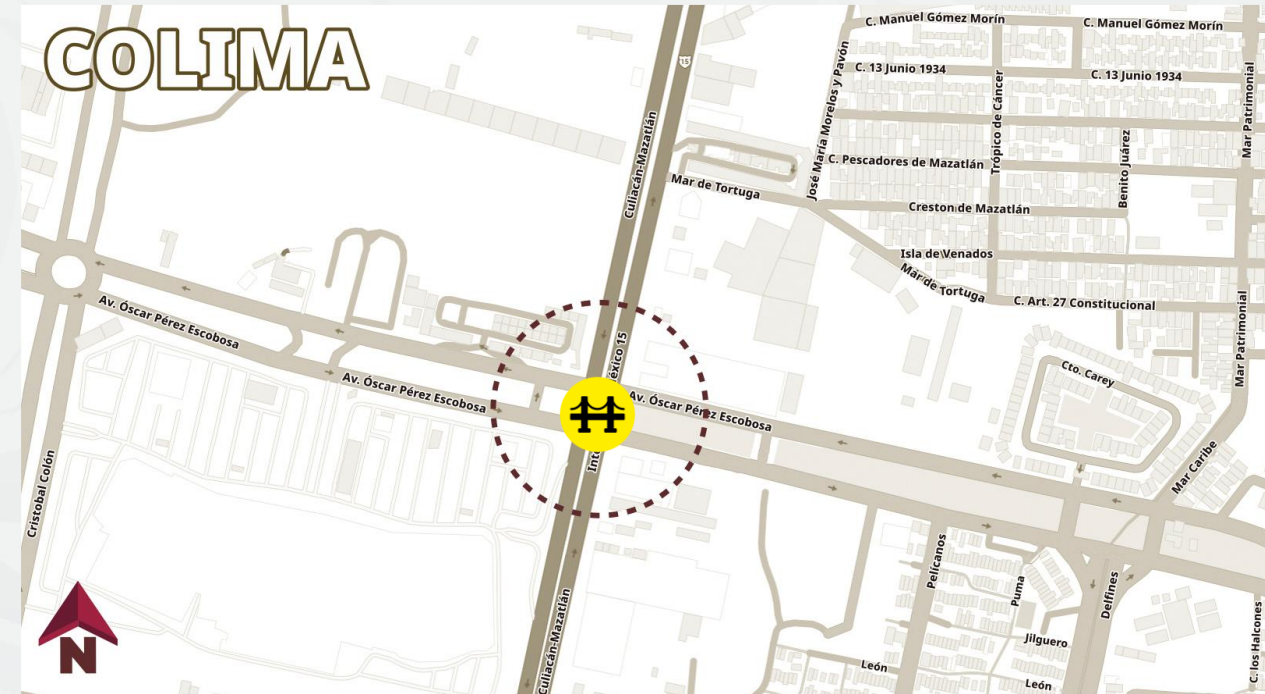


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

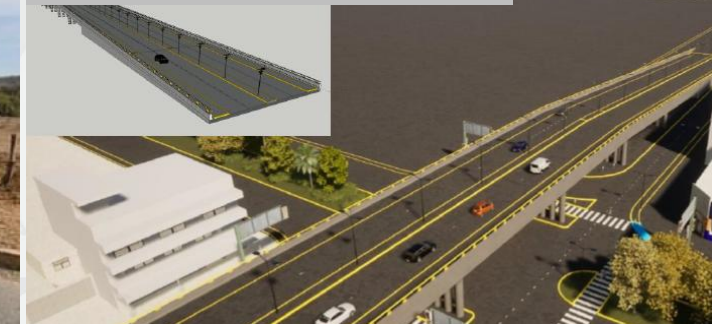


Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 23 al 29/01/26		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.0	0.0	Falta proyecto de semaforización y diseño de pavimentos.
Obras inducidas	Actividad	8	0	0.0%	8	0.0	0.0	
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Trabes AASHTO IV	Actividad	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Trabes Nebraska	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Trabes Nebraska NU240	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Fabricación de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocación de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	0.0	309.2	Concluido
Losa de concreto Hidráulico	Pieza	3	3	100.0%	0.0	0.00	0.0	Concluido
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	1.00	2.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	537.0	56.1%	421.0	179.00	207.0	En proceso
Parapeto	m	958.0	483.3	50.4%	474.7	0.00	483.3	En proceso
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	No iniciado
Alumbrado	Actividad	2	0.8	40.0%	1	0	0.8	En proceso
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	No iniciado
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0.0	No iniciado
Barrera Central	m	587.0	280	47.7%	307.0	0	280.0	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	1,091.0	21.7%	3,941.00	0	565.0	En proceso
Relleno Fluido	m3	3,992.0	414.0	10.4%	3,578.00	0	209.0	En proceso
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0.0	No iniciado
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0.0	No iniciado
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0.0	No iniciado
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0.0	No iniciado

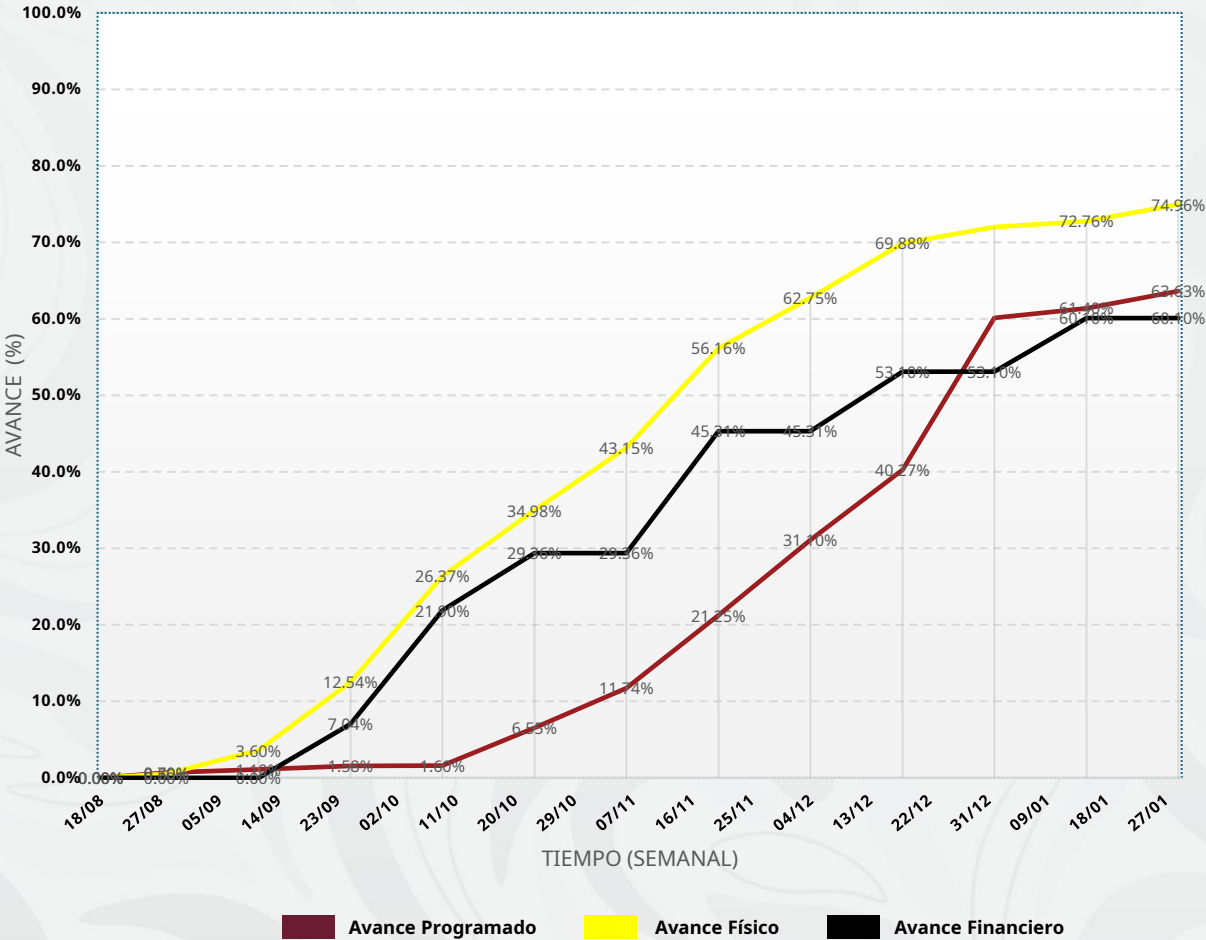

	Del 16 de Enero al 22 de Enero	Del 23 de Enero al 29 de Enero
Personal	89	138
Maquinaria	13	13
Frentes de trabajo	9	9
