

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 61.02%
- Real: 83.87%
- Semanal: 1.42%
- Financiero: 58.9%

De acuerdo al cierre de SHCP 2025



Inversión total 2025-2026: 898.9 mdp

Meta total: 1 Puente | 0.798 km
Accesos | 1.222 km



Inversión 2025: 198.9 mdp

Meta 2025: 0.7 km de Puente

Inversión 2026: 700.0 mdp

Meta 2026: 1.32 km



Inicio: 14 de julio de 2025

Término: Julio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

479,471 habitantes beneficiados



2,790 empleos generados




25 min ahorro en tiempo



Beneficios

Se crea una vía alterna que permita agilizar el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Construcción de un puente de 2.02 km de longitud para alojar 6 carriles de circulación.

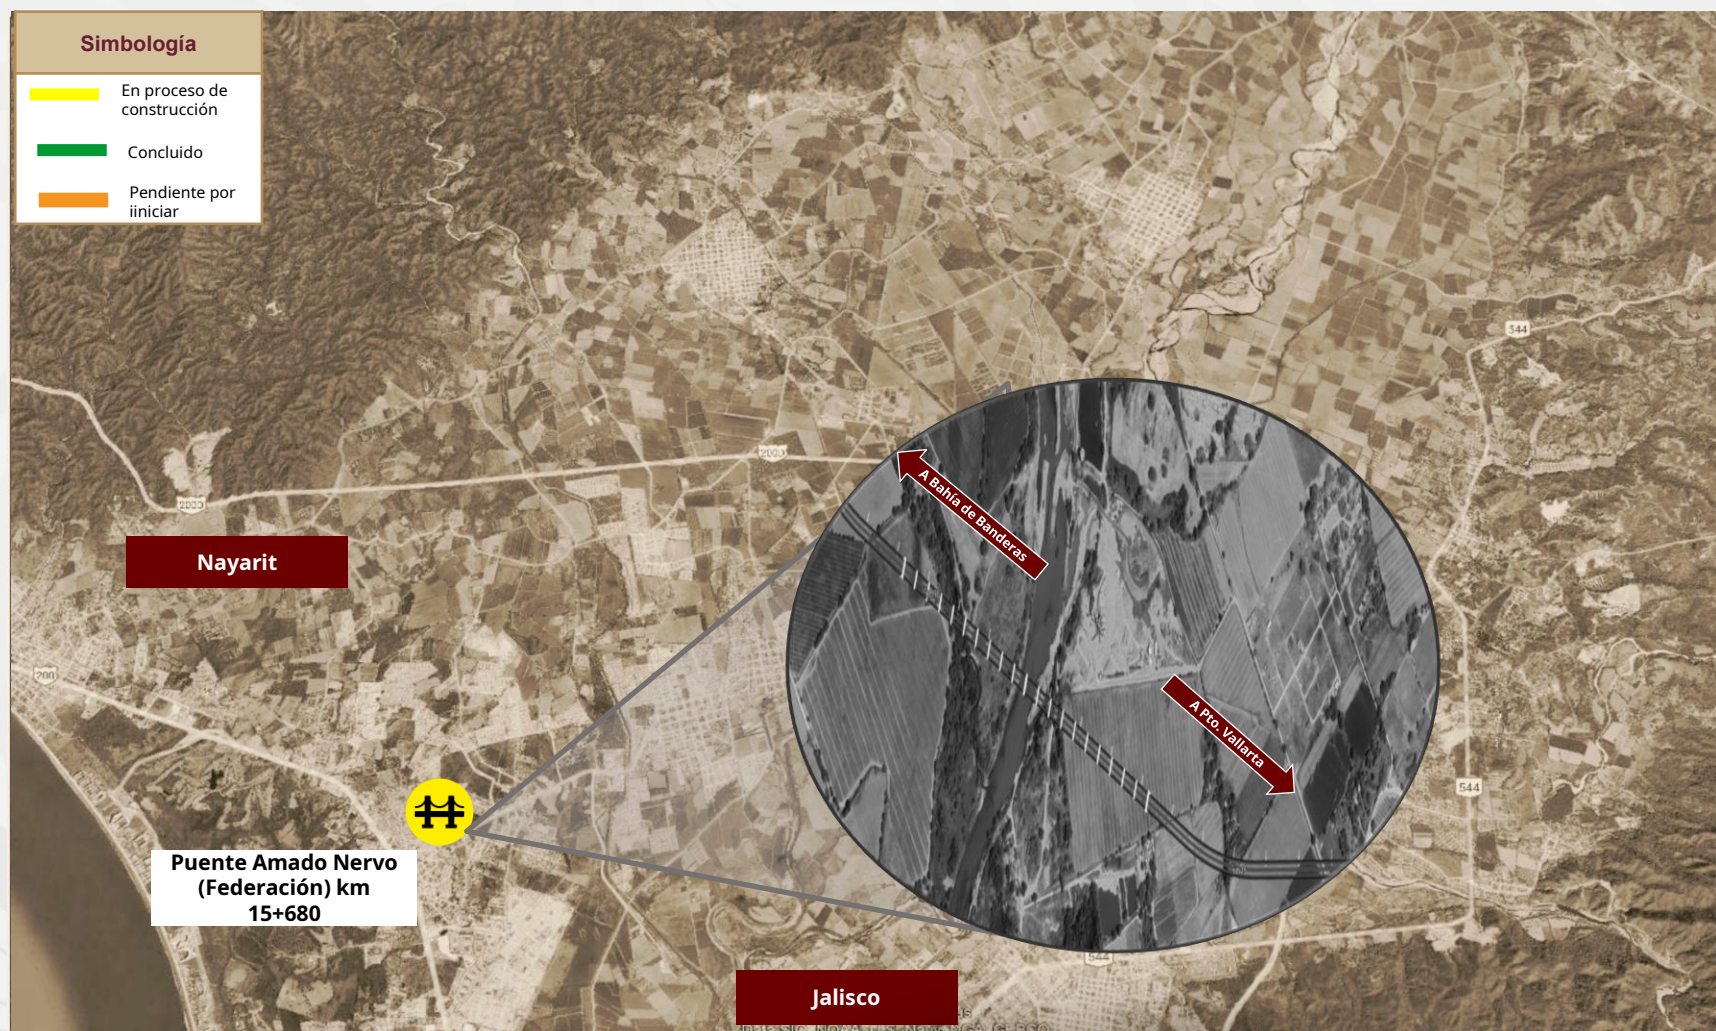

Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.


Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 26 al 02/07/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Se tienen detenidas las actividades de accesos.
Despalme	m3	14,042.0	13,099.0	93.3%	943.0	943.00	0	Se reanuda parcialmente el despalme.
Cortes	m3	10,823.0	3,916.0	36.2%	6,907.0	6,907.00	0	En proceso
Terraplenes	m3	143,177.0	133,367.0	93.1%	9,810.0	2,318.30	2,844	En proceso
Base Estabilizada	m3	6,192.0	1,862.0	30.1%	4,330.0	309.60	253	Sin actividades
Carpeta de Concreto Hidráulico	m3	9,734.0	2,121	21.8%	7,613.0	484.80	2,121	Sin actividades
Losas de Acceso	m3	83.0	81.3	97.9%	1.8	11.00	0	En proceso
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	126	100.0%	0	-	0	Conducidos
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	126	100.0%	0	-	0	Conducidos
Cabezales	pza.	21	21	100.0%	0	-	0	Conducidos
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	160	100.0%	0	-	0	Conducidos
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	160	100.0%	0	-	0	Conducidos
Losas y Diafragmas	m3	4,388.0	4,350.5	99.1%	37.50	222.1	0	Se tienen coladas 7 losas y 29 líneas de diafragmas
Parapeto	m	1,597.0	0	0.0%	1,597.00	398.5	0	Sin actividades
Guarnición	m	1,591.0	344.2	21.6%	1,246.80	0	208	En proceso
Obras de Drenaje	pza.	4.0	2.7	67.5%	1.30	1.6	0	En proceso
PASOS SUPERIORES VEHICULARES								
PSV's	pza.	2.0	2.0	100.0%	0.00	0.3	0	Conducidos
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.0	0.3	30.0%	0.70	0	0	En proceso
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.0	0	0.0%	1.00	0	0	Sin actividades
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.0	0.5	50.0%	0.50	0	0	En proceso

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

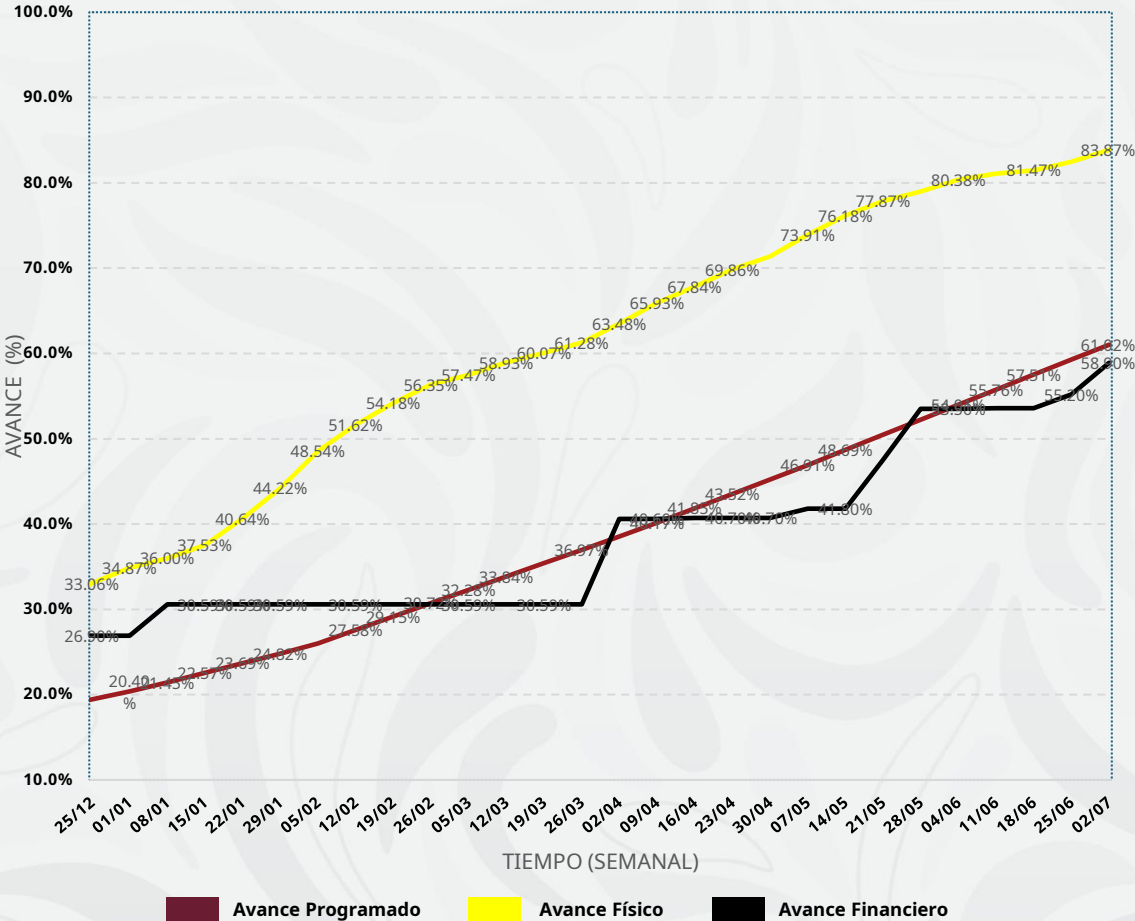

	19 de Junio al 25 de Junio	26 de Junio al 02 de Julio
Fuerza de Trabajo (personas)	52	70
Maquinaria	26	23
Frentes de trabajo	6	6
