



Puente “Las Tunas”

Colima

Avance global

- Programado: 55.85%
- Real: 56.90%
- Semanal: 2.00%
- Financiero: 30.45%



Inversión total: 101.78 MDP



Meta total: 503.0 m longitud total (0.153 km estructuras y 0.350 km accesos)



Inicio: 25 de febrero de 2026
Término: 15 de agosto (31 de agosto de 2026 obras complementarias)



157,048 habitantes beneficiados



306 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Beneficios:

- Comunicación ininterrumpida en época de lluvias para las comunidades.
- Acceso continuo a los servicios básicos como salud.
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

Tramo	Empresas
Construcción Puente Las Tunas	• Contratista: MARECOMSA, S.A. de C.V • Supervisión: VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES VITED35 A.A DE C.V.




Puente “Las Tunas”

Colima



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	26/06/26 al 02/07/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m3)	36,000.00	24,314.06	11,685.94	284.56	0.00	
Pilas de cimentación (Perforación) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Armado) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Colado)(Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Vigas de Atado (Pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Columnas (Pza)	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Construcción de cabezales y bancos (Pza)	6.00	6.00	0.00	1.00	1.00	Trabajos Concluidos
Aleros y Muro de Contención (Pza)	4.00	0.00	4.00	0.50	0.00	
Fabricación de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Suministro de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	15.00	10.00	0.00	0.00	
Montaje de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	15.00	10.00	3.50	0.00	
Prelosas (pza)	600.0	290.00	310.00	31.00	85.00	
Colado de diafragma y losa (m3)	376.81	0.00	376.81	87.92	0.00	
Carpeta Asfáltica (m3)	55.16	0.00	55.16	30.44	0.00	
Guarniciones y banquetas (m3)	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	
Accesos (ml)	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
Señalamiento (ml)	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

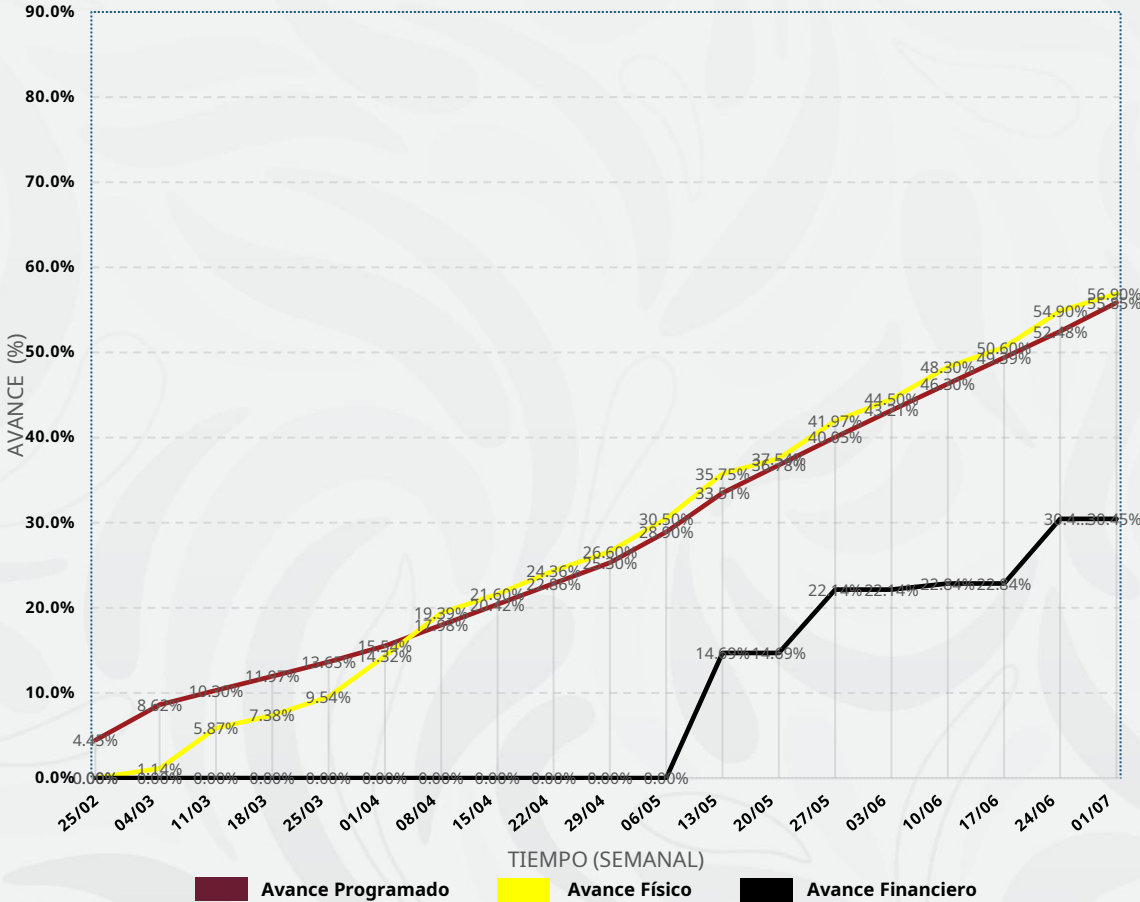

	18 al 25 de junio	26 de junio al 02 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	30	32
Maquinaria	12	12
Frentes de trabajo	3	3
