

Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

**Inversión total:** 484 MDP

**Meta total:** 1.92 km longitud total.
• 0.77 km puente

**Inicio:** 27 Abril de 2026
Término: 21 Octubre 2026

**Más de 1,320,00** de habitantes beneficiados
2,890 empleos generados

**5 minutos** ahorro en tiempo

**Beneficios:**

- Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes.
- Optimiza la capacidad y eficiencia del flujo vehicular en el acceso y salida del Puente Vehicular Nichupté.
- Fortalecer la seguridad de los residentes y turistas de la zona turística ante situaciones de contingencias ambientales
- Población beneficiada: 20 millones de turistas al año
- Es un distribuidor vial que cuenta con un paso superior con dos cuerpos separados para alojar dos carriles de circulación en un sentido y el otro un solo carril, además de calles laterales para servicios locales.

Avance físico

- Programado: 49.04%
- Real: 21.30%

- Semanal: 3.43%
- Financiero: 0%




Tramo	Empresas
Construcción distribuidor vial Kukulcán.	• Contratista: Grupo Formado por las empresas: Consorcio de Ingenieros Constructores y consultores, S.A. de C.V y ASCH, S.A. de C.V.
	• Supervisión: Grupo formado por las empresas: Triada Geotecnia, S.A.P.I. de C.V. Triada Consultores, S.A.P.I. de C.V. Triada Diseño y Gerencia Construcción S.A.P.I. de C.V. .



Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado		Faltante	Ejecutado del 12 al 18 de junio de 2026
Pilas de cimentación (pza)	104	60	58%	44	10
Zapatas (pza)	18	0	0%	18	0
Columnas (pza)	30	0	0%	30	0
Cabezales (pza)	19	0	0%	19	0
Fabricación de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Montaje de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Losas (pza)	17	0	0%	17	0
M.M.E. (m³)	6,176	0	0%	6,176	0

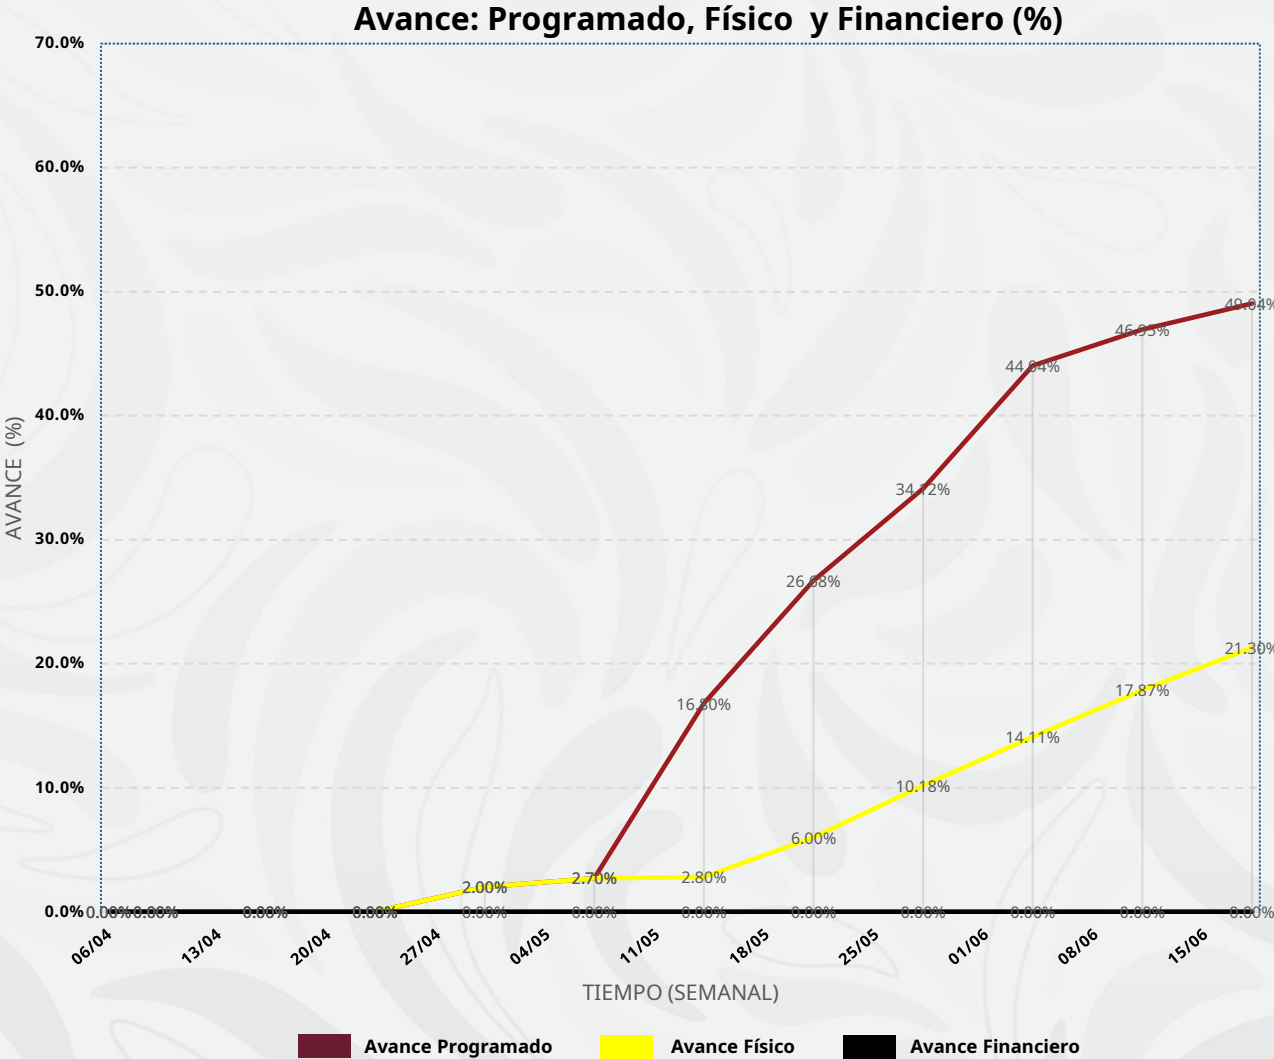

•Nota: se tienen 170 mdp de obra ejecutada no pagada por trámites ante FONADIN

	05 al 11 de junio 2026	12 al 18 de junio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	69	91
Maquinaria	24	35
Frentes de trabajo	5	6
