



Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance global

- Programado: 55.72%
- Real: 64.50%
- Semanal: 0.40%
- Financiero: 64.00%



Inversión total 2025-2026: 720 mdp
Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inversión 2025: 140 mdp
Meta 2025: 38% de 1 Distribuidor Vial
Inversión 2026: 580 mdp
Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial



Inicio: 16 de julio de 2025
Término meta 2025: Diciembre 2025
Término meta total: Julio de 2026



73,215 habitantes beneficiados




2,220 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

Beneficios Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.

Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

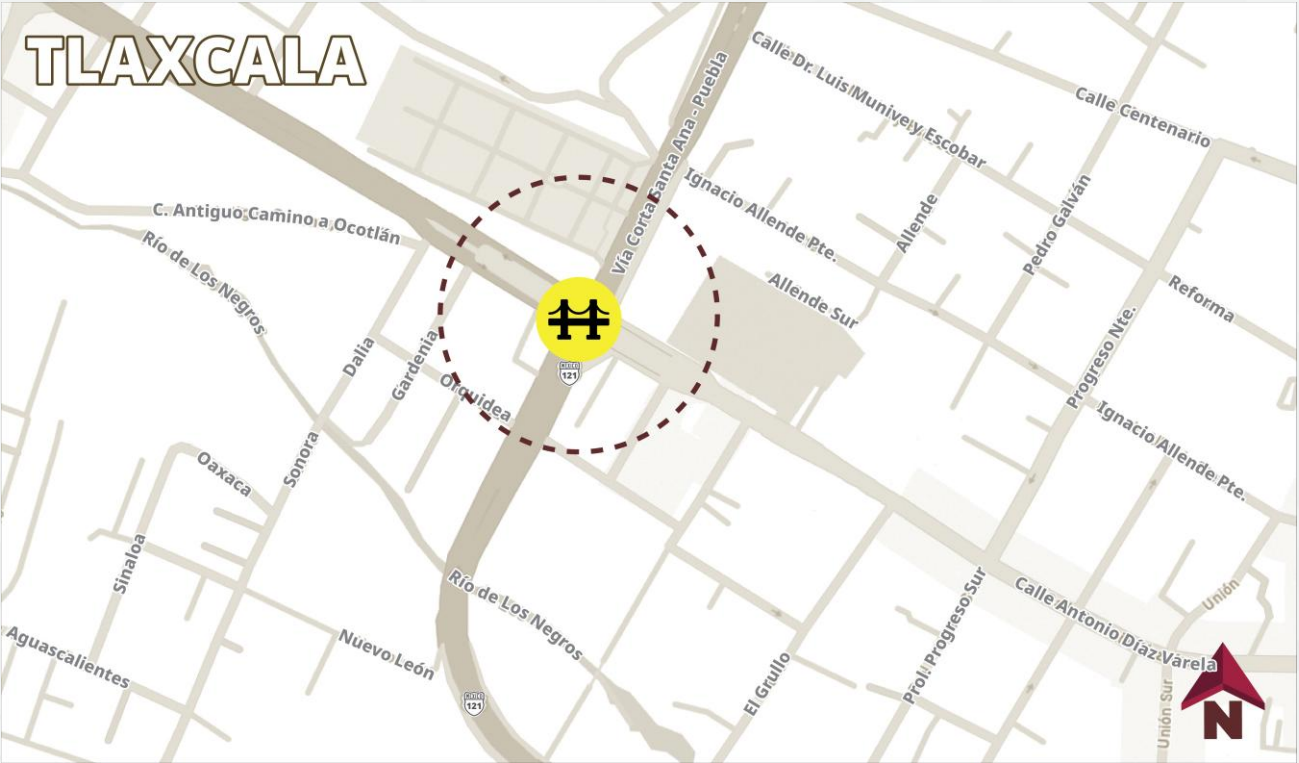


Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala



Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

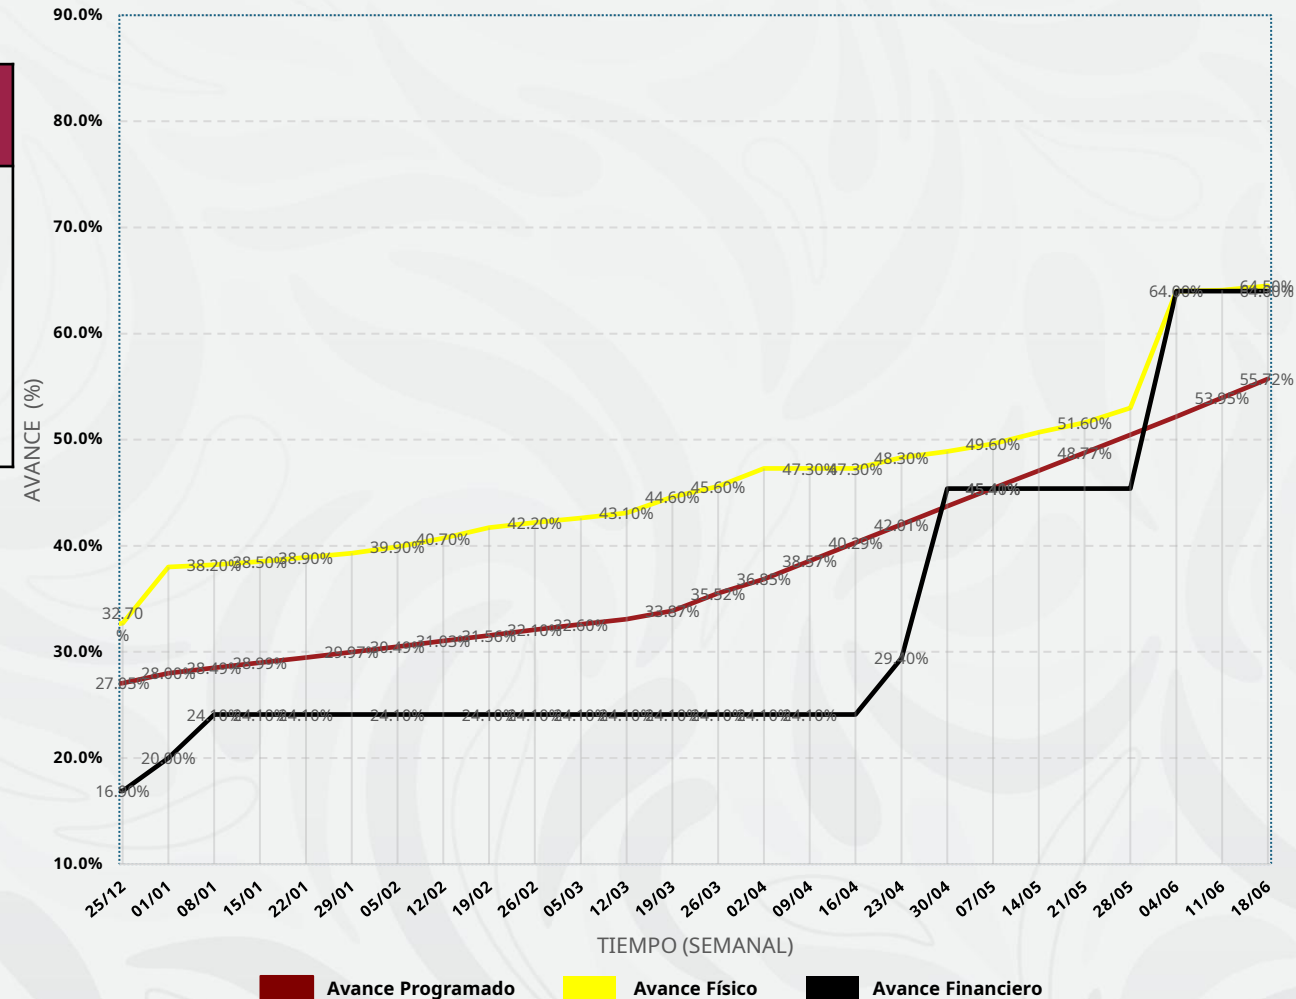

	05 al 11 de junio	12 al 18 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	107	105
Maquinaria	20	15
Frente de trabajo	11	13

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	Del 12-06-26 al 18-06-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	64.50% 1 Distribuidor Vial	35.50% de 1 Distribuidor Vial	1.77%	0.40%	Se trabaja en: Diafragmas, Losas, drenaje pluvial, construcción cabezal eje 19, fabricación de trabes, montaje de trabes y fabricación de paneles de concreto de tierra armada.
