



Puente "Las Tunas"

Colima

Avance global


- Programado: 49.39%
- Real: 50.60%
- Semanal: 2.30%
- Financiero: 22.84%

- Inversión total:** 101.78 MDP
- Meta total:** 503.0 m longitud total (0.153 km estructuras y 0.350 km accesos)
- Inicio:** 25 de febrero de 2026
Término: 31 de agosto de 2026
- 157,048** habitantes beneficiados
- 235** empleos generados
- 15 min** ahorro en tiempo

Beneficios:

- Comunicación ininterrumpida en época de lluvias para las comunidades.
- Acceso continuo a los servicios básicos como salud.
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

Tramo	Empresas
Construcción Puente Las Tunas	• Contratista: MARECOMSA, S.A. de C.V • Supervisión: VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES VITED35 A.A DE C.V.

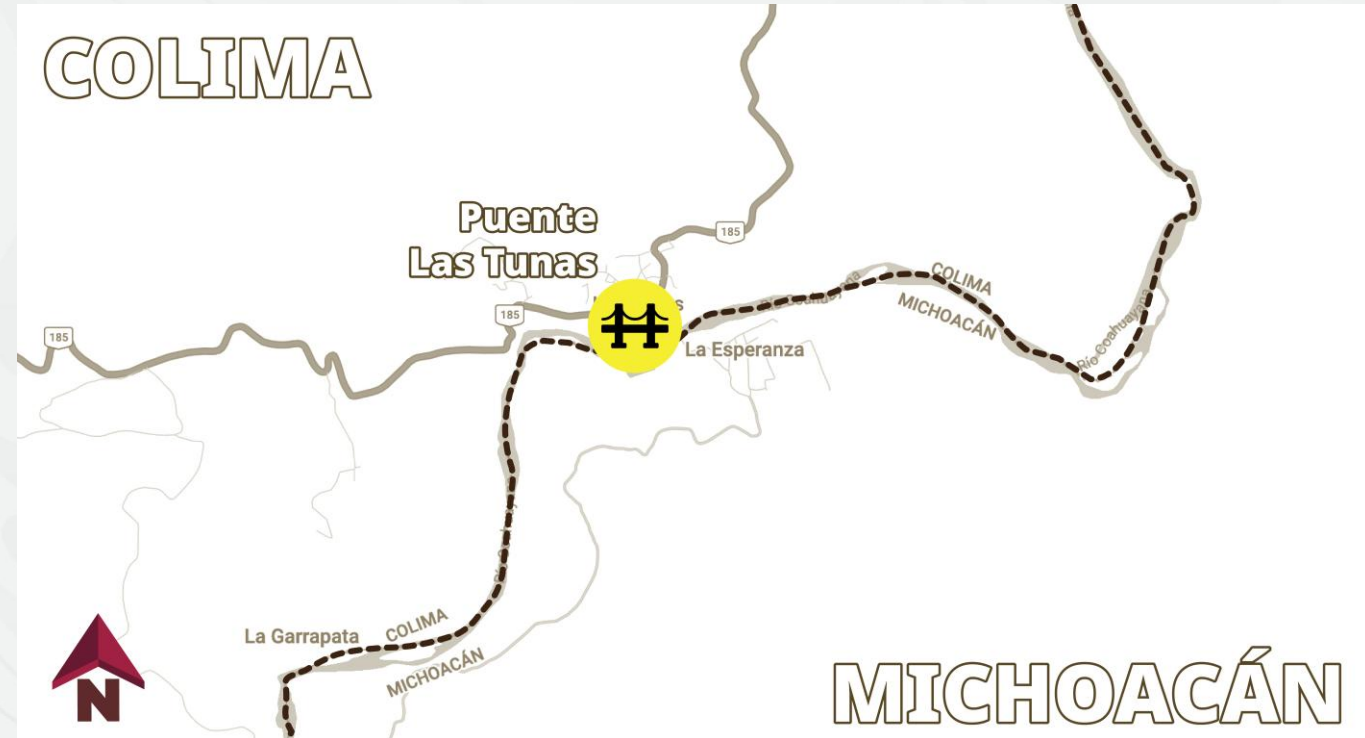

SITUACIÓN ACTUAL



IMAGEN OBJETIVO


Puente “Las Tunas”

Colima

ACTUALIZADA 22/06/2026

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	12/06/26 al 18/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m3)	36,000.00	24,314.06	11,685.94	284.56	0.00	
Pilas de cimentación (Perforación) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Armado) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Colado)(Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Vigas de Atado (Pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Columnas (Pza)	12.00	12.00	0.00	1.25	1.25	Trabajos Concluidos
Construcción de cabezales y bancos (Pza)	6.00	4.50	1.50	1.00	0.50	
Aleros y Muro de Contención (Pza)	4.00	0.00	4.00	0.50	0.00	
Fabricación de traveses AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Suministro de traveses AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	10.00	15.00	0.00	5.00	
Montaje de traveses AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	10.00	15.00	4.00	5.00	
Colado de diafragma y losa (m3)	376.81	0.00	376.81	0.00	0.00	
Carpeta Asfáltica (m3)	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	
Guarniciones y banquetas (m3)	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	
Accesos (ml)	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
Señalamiento (ml)	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	

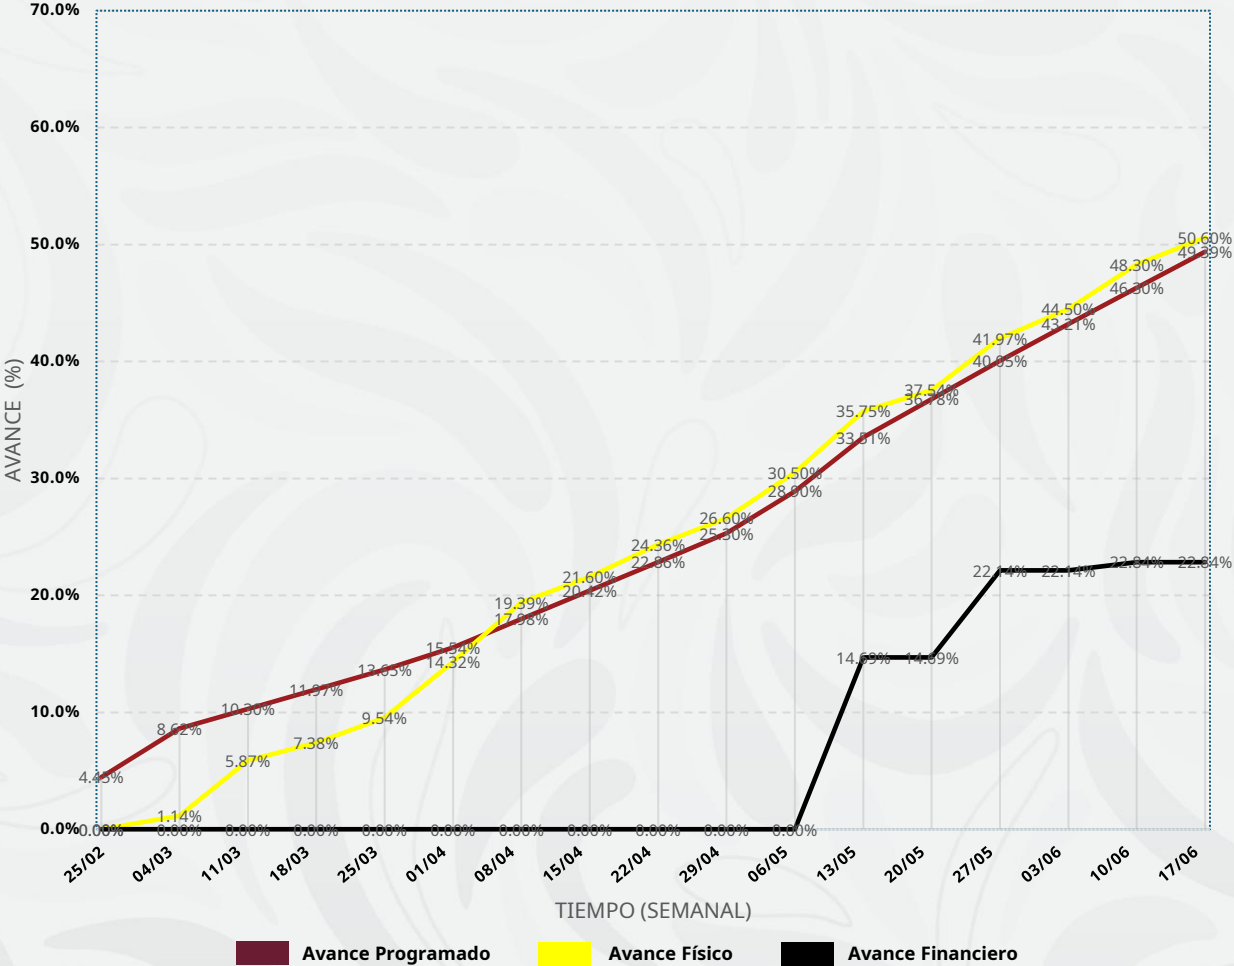

	05 al 11 de junio	12 al 18 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	40	40
Maquinaria	13	13
Frentes de trabajo	4	4
