

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 95.44%
- Real: 96.40%
- Semanal: 0.58%
- Financiero: 87.9%



Inversión total 2025-2026: 424.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total



Inversión 2025: 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 200.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km



Inicio: 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales



862,037 Habitantes beneficiados



1,215 empleos generados



20 min ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

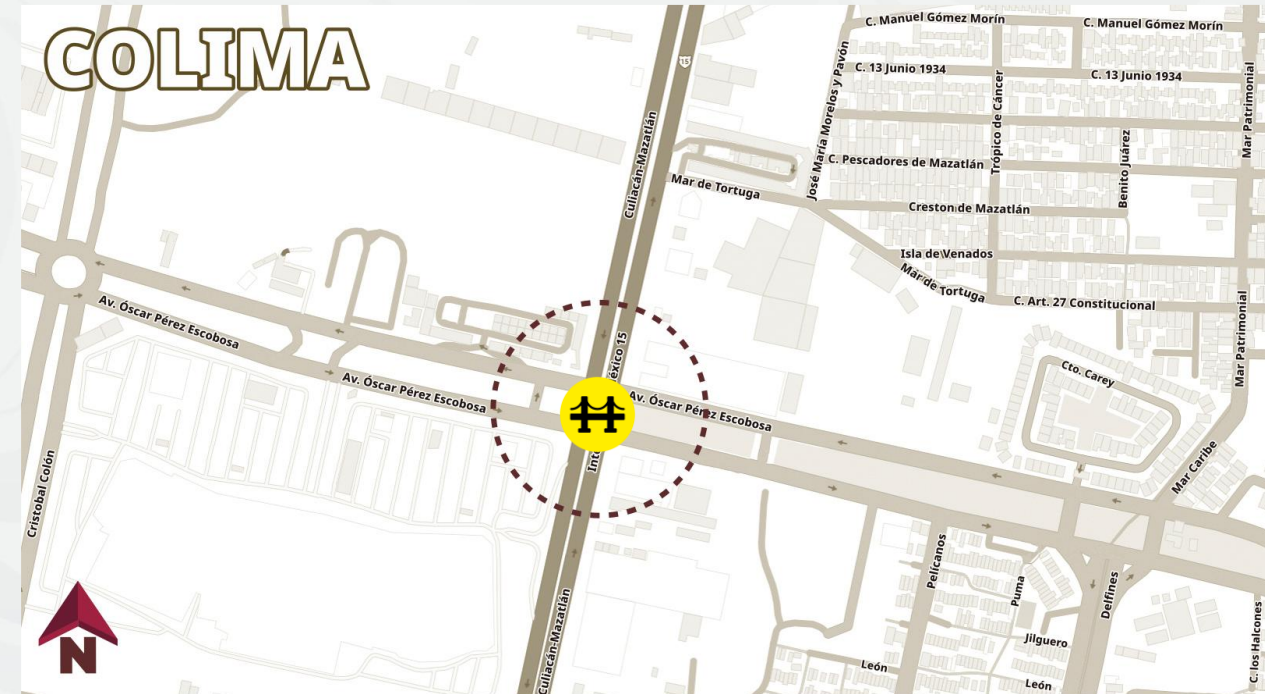


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

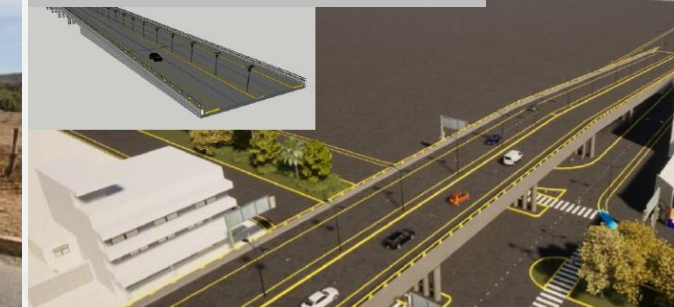

Proyecto


PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa



Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 12/06/26 al 18/06/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	2.0	100.0%	0	0.5	0.0	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Señalamiento	Actividad	2	0.53	26.5%	1.5	1.8	0.3	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL								
Excavación	m3	4,465.00	4,076.3	91.3%	388.70	388.7	0.0	En proceso
Relleno	m3	1,358.00	1,243.0	91.5%	115.00	115.0	0.0	En proceso
Cajón prefabricado de 1.5x1.0m HS-20	m	337.00	337.0	100.0%	0.00	-	0.0	En proceso
Tubo PEAD de 0.30m -0.90 m de Diam.	m	1,239.00	972.0	78.5%	267.00	267.0	0.0	En proceso
Coladera de piso y banqueta	pza	37.00	28	75.7%	9.00	4.1	4.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	3,329.8	100.0%	0.00	1,411.8	1,411.8	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	3,206.1	100.0%	0.00	1,359.3	1,359.4	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	773.3	100.0%	0.00	328.3	327.9	En proceso
AGUA POTABLE								
Excavación	m3	1,041.50	1,041.5	100.0%	0.00	348.3	348.5	En proceso
Relleno	m3	975.80	970.6	99.5%	5.20	326.8	321.3	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado aguas negras, serie 20 de 31.5cm de Diam.	m	1,030.10	1,000.1	97.1%	30.00	345.1	314.7	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	4,801.0	95.4%	231.0	1,145.7	90.0	En proceso
Base Hidráulica	m3	2,835.00	2,410.0	85.0%	425	1,370.6	70.0	En proceso
Riego de Impregnación	m2	12,357.0	10,473.0	84.8%	1,884.0	5,991.0	300.0	En proceso
Base Asfáltica	m3	1,862.0	1,392.0	74.8%	470.0	1,035.9	0.0	En proceso
Carpeta Asfáltica	m3	863.0	644.7	74.7%	218.3	240.3	0.0	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	13,582.0	58.0%	9,838.0	13,754.0	0.0	En proceso
Banqueta	m2	10,526.0	7,282.9	69.2%	3,243.1	745.5	507.9	En proceso
Relleno	m3	1,692.0	1,692.0	100.0%	0.0	-	0.0	En proceso

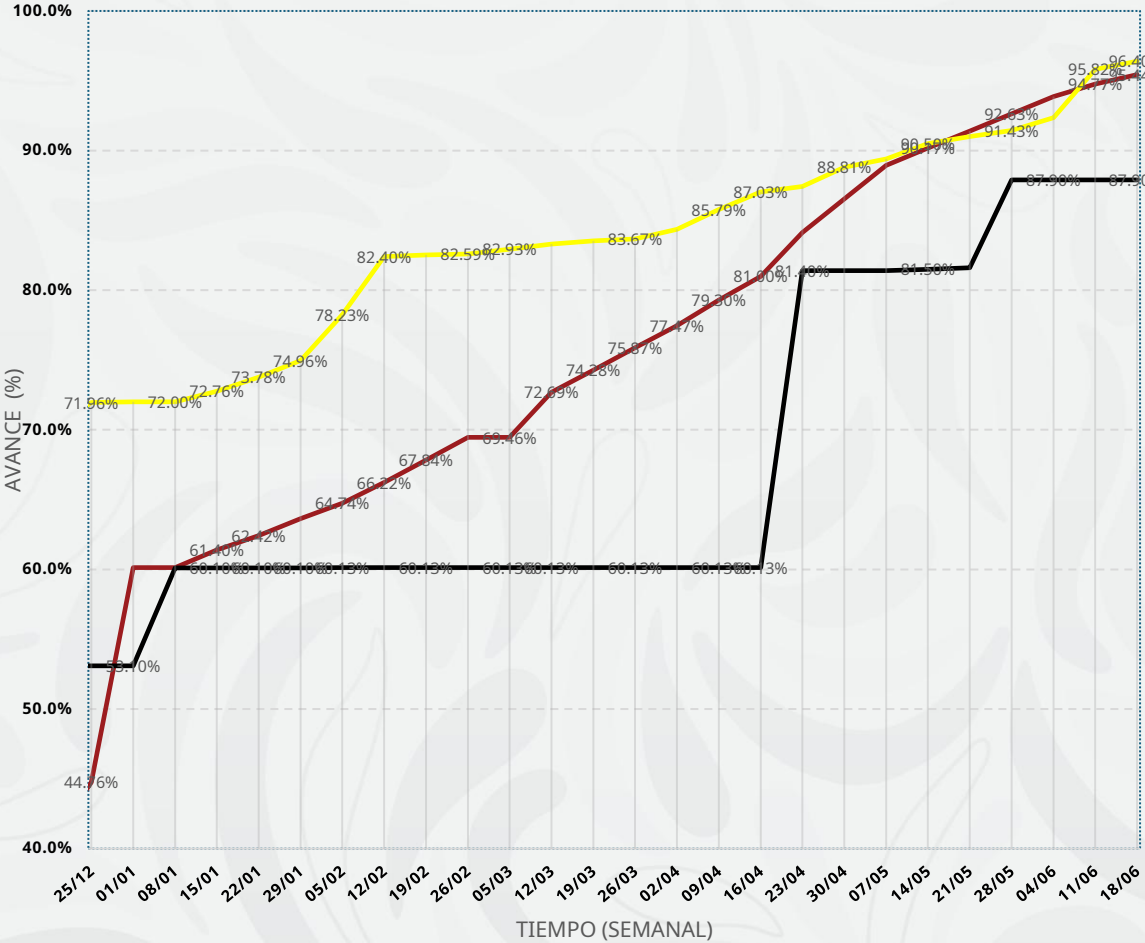

	Del 05 de Junio al 11 de Junio	Del 12 de Junio al 18 de Junio
Personal	108	86
Maquinaria	26	18
Frentes de trabajo	8	7
