

Puente "Las Tunas"

Colima



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


Avance global

- Programado: 15.54%
- Real: 14.32%
- Semanal: 4.78%
- Financiero: 0.00%

-  **Inversión total:** 99.3 MDP
-  **Meta total:** 503.0 m longitud total (0.153 km estructuras y 0.350 km accesos)
-  **Inicio:** 25 de febrero de 2026
Término: 24 de noviembre 2026
-  **157,048** habitantes beneficiados
-  **235** empleos generados
-  **15 min** ahorro en tiempo

Beneficios:

- Comunicación ininterrumpida en época de lluvias para las comunidades.
- Acceso continuo a los servicios básicos como salud.
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

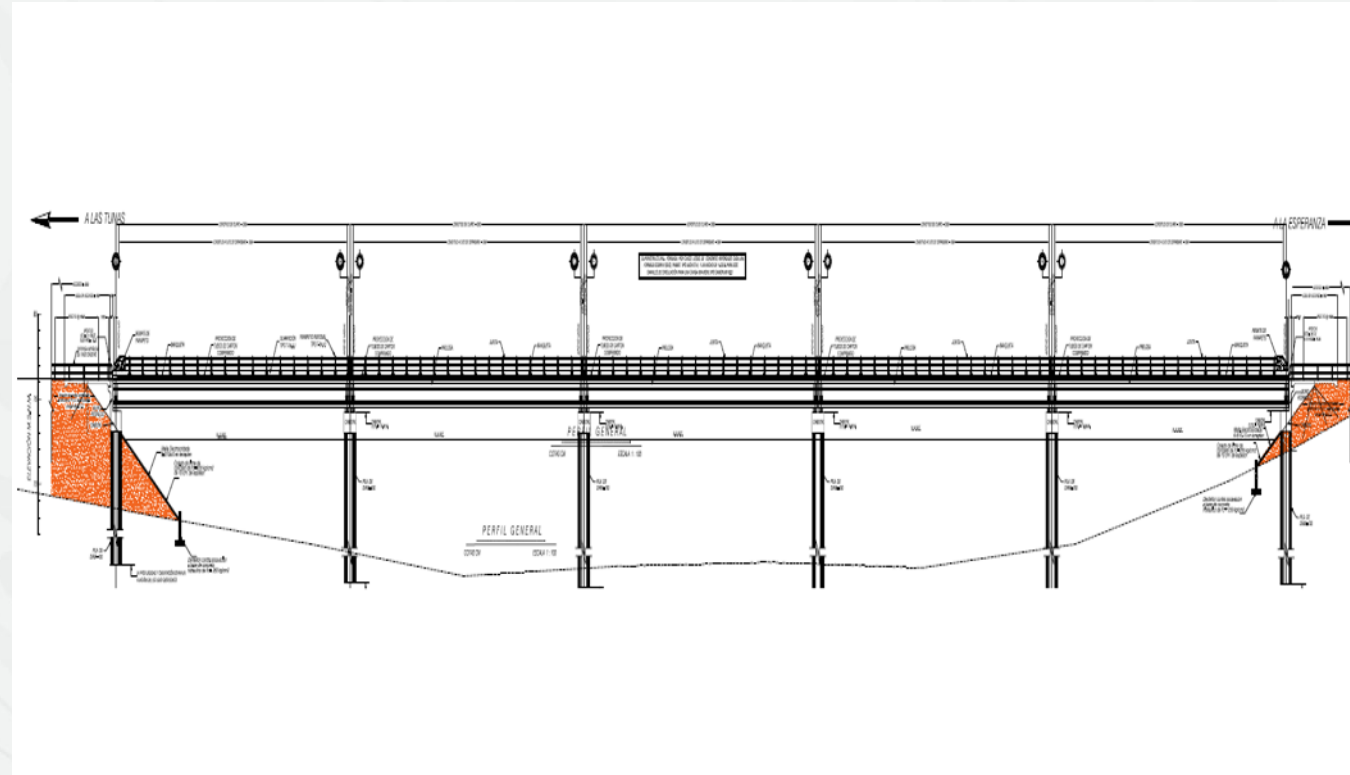

SITUACIÓN ACTUAL



IMAGEN OBJETIVO


Tramo	Empresas
Construcción Puente Las Tunas	• Contratista: MARECOMSA, S.A. de C.V • Supervisión: Actualmente no se cuenta con supervisión

Puente “Las Tunas”

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	27/03/26 al 02/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m3)	36,000.0	20,095.65	15,904.35	1,848.70	4,338.63	
Pilas de cimentación (Perforación) (Pza)	18.0	6.00	12.00	4.00	4.00	
Pilas de cimentación (Armado) (Pza)	18.0	9.00	9.00	2.00	3.00	
Pilas de cimentación (Colado)(Pza)	18.0	4.00	14.00	2.00	4.00	
Vigas de Atado (Pza)	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	
Columnas (Pza)	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	
Construcción de cabezales y bancos (Pza)	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	
Aleros y Muro de Contención (Pza)	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	
Suministro de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	
Colado de diafragma y losa (m3)	376.81	0.0	376.81	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	55.16	0.0	55.16	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m3)	86.84	0.0	86.84	0.0	0.0	
Accesos (ml)	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	
Señalamiento (ml)	650.0	0.0	650.0	0.0	0.0	

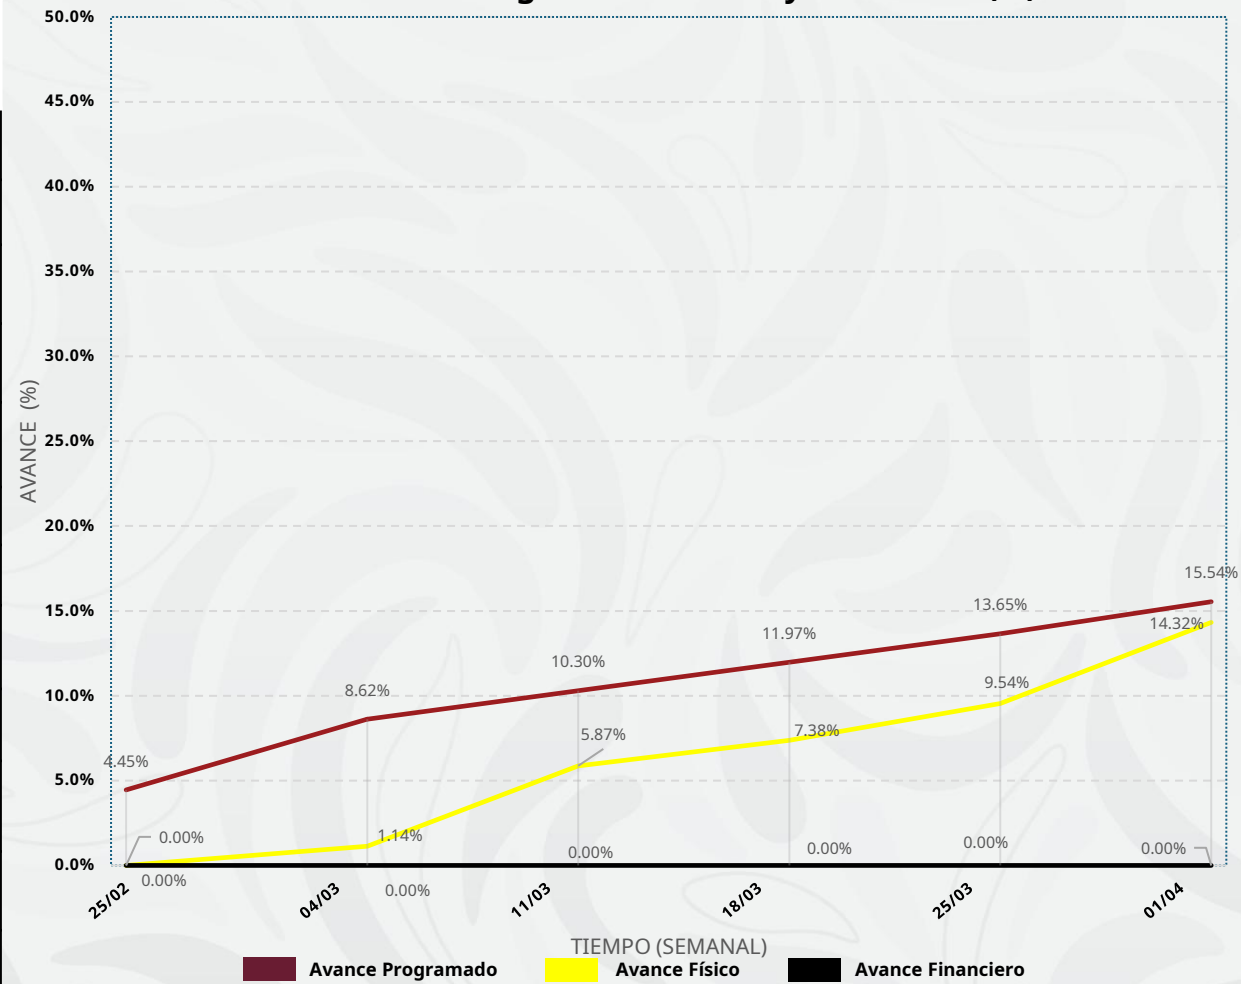

	20 al 26 de Marzo	27 de marzo al 02 de Abril
Fuerza de Trabajo (personas)	27	33
Maquinaria	6	10
Frentes de trabajo	4	4
