

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 77.47%
 - Real: 84.37%
 - Semanal: 0.7%
 - Financiero: 60.13%
- (Concluido, se trabajan vialidades laterales)

-  **Inversión total 2025-2026:** 404.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total
-  **Inversión 2025:** 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km
-  **Inicio:** 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales

 **862,037** Habitantes beneficiados

 **1,215** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

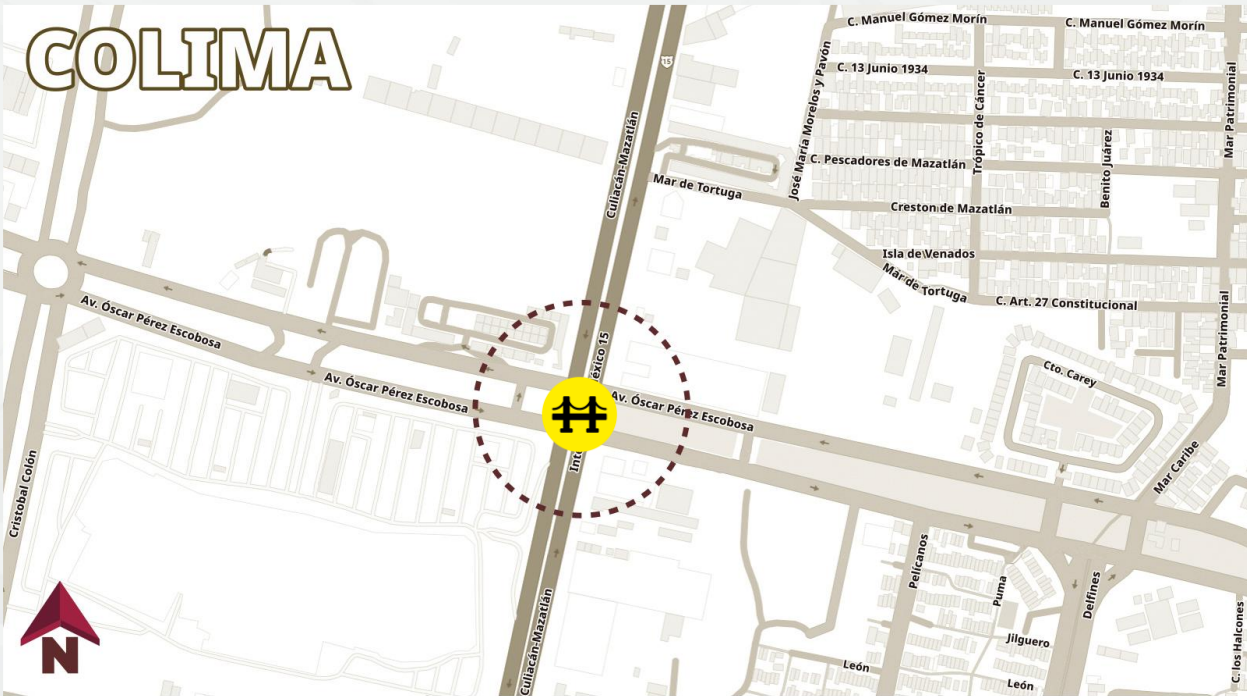


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

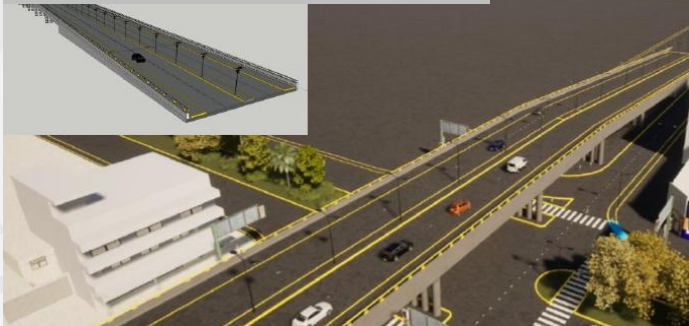


Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 27/03/2026 al 02/04/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Muro Mecánicamente estabilizado (Fabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico Accesos	Pieza	3	3	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Parapeto	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	1	50.0%	1	0.5	0.5	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Alumbrado	Actividad	2	2	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Señalamiento	Actividad	2	0.25	12.5%	2	0.3	0.0	En proceso
Semaforización	Actividad	1	1	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Barrera Central	m	587.0	587.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,261.7	37.9%	2,068.11	416.2	99.0	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,214.9	37.9%	1,991.21	356.2	116.1	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	293	37.9%	480.25	85.9	23.0	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	2,109.0	41.9%	2,923.0	0	0.0	En proceso
Relleno Fluído	m3	2,174.0	1,094.0	50.3%	1,080.0	0	0.0	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	4,368	18.7%	19,052.0	0	2,168.0	En proceso
Banqueta	m2	6,922.0	1,588.0	22.9%	5,334.0	0	1,008.0	En proceso
Relleno	m3	692.0	464.0	67.1%	228.0	0	0.0	En proceso

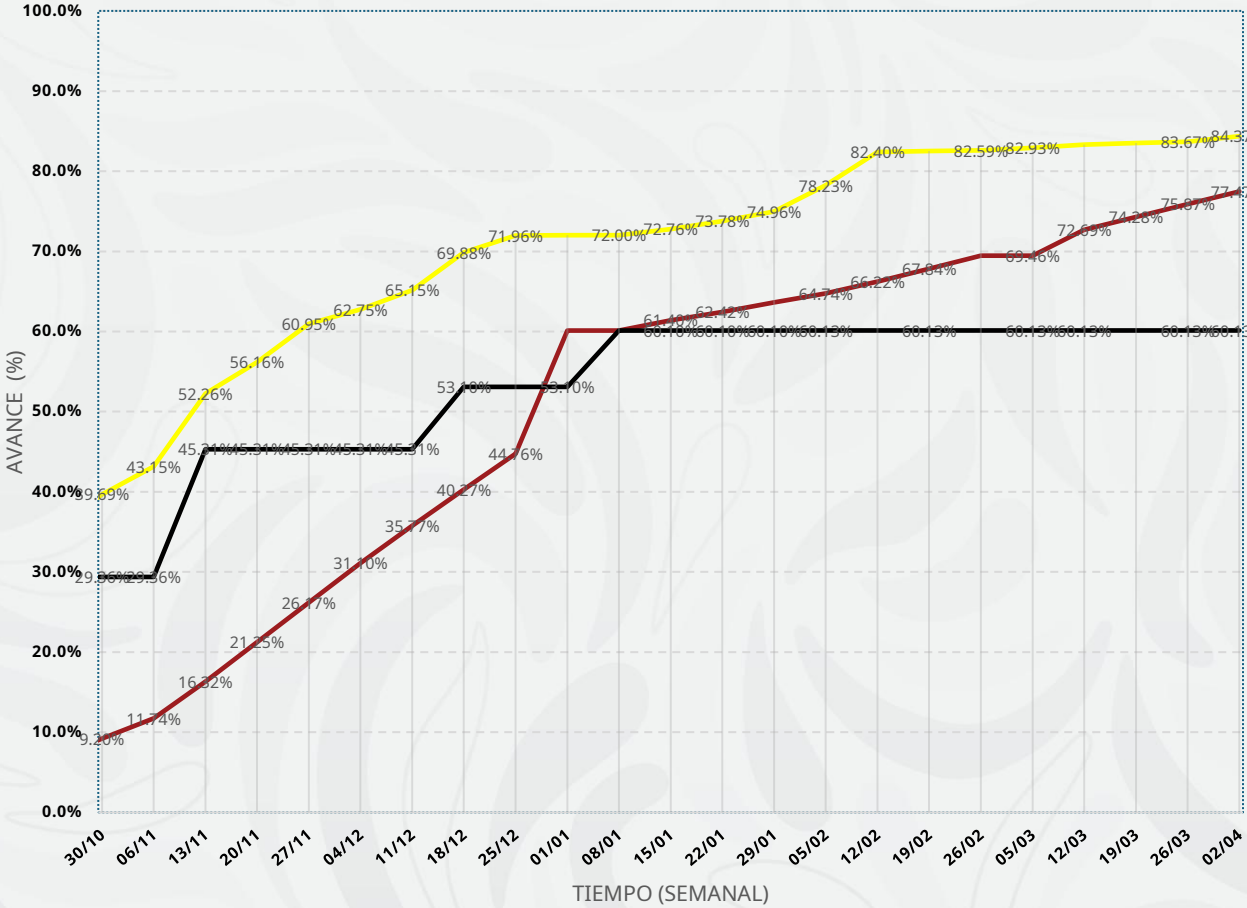

	Del 20 de Marzo al 26 de Marzo	Del 27 de Marzo al 02 de Abril
Personal	72	83
Maquinaria	13	14
Frentes de trabajo	6	7
