

# Distribuidor Vial Santa Ana

## Tlaxcala

Avance global

• Programado: 36.85%

• Semanal: 1.70%

• Real: 47.30%

• Financiero: 24.10%



Inversión total 2025-2026: 740 mdp

Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inversión 2025: 140 mdp

Meta 2025: 38% de 1 Distribuidor Vial

Inversión 2026: 600 mdp

Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial



Inicio: 16 de julio de 2025

Término meta 2025: Diciembre 2025

Término meta total: Julio de 2026



73,215 habitantes beneficiados



2,220 empleos generados




20 min ahorro en tiempo

**Beneficios** Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.

**Paso superior con dos carriles por sentido**


| Tramo                        | Empresas                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KM 29+980 AL<br>KM 30+183.58 | <div><div>• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.,</div><div>• Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</div></div> |

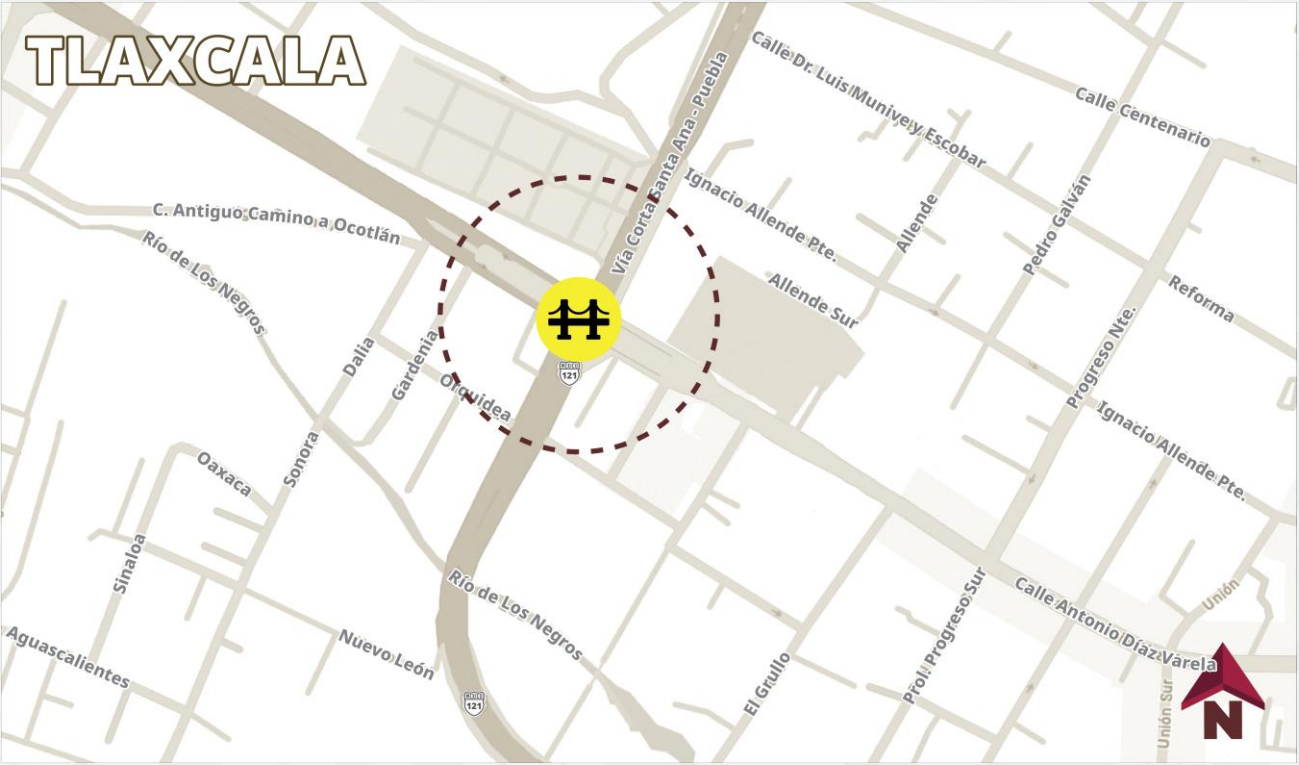

# Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

| Elemento          | Meta                | Ejecutado Acumulable       | Faltante                      | Del 27-03-26 al 02-04-26 |           | Observaciones                                                                      |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                     |                            |                               | Programado               | Ejecutado |                                                                                    |
| Distribuidor Vial | 1 Distribuidor Vial | 47.30% 1 Distribuidor Vial | 52.70% de 1 Distribuidor Vial | 1.33%                    | 1.70%     | Se trabaja en: Montaje de cabezales metálicos y construcción de losas y entre eje. |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

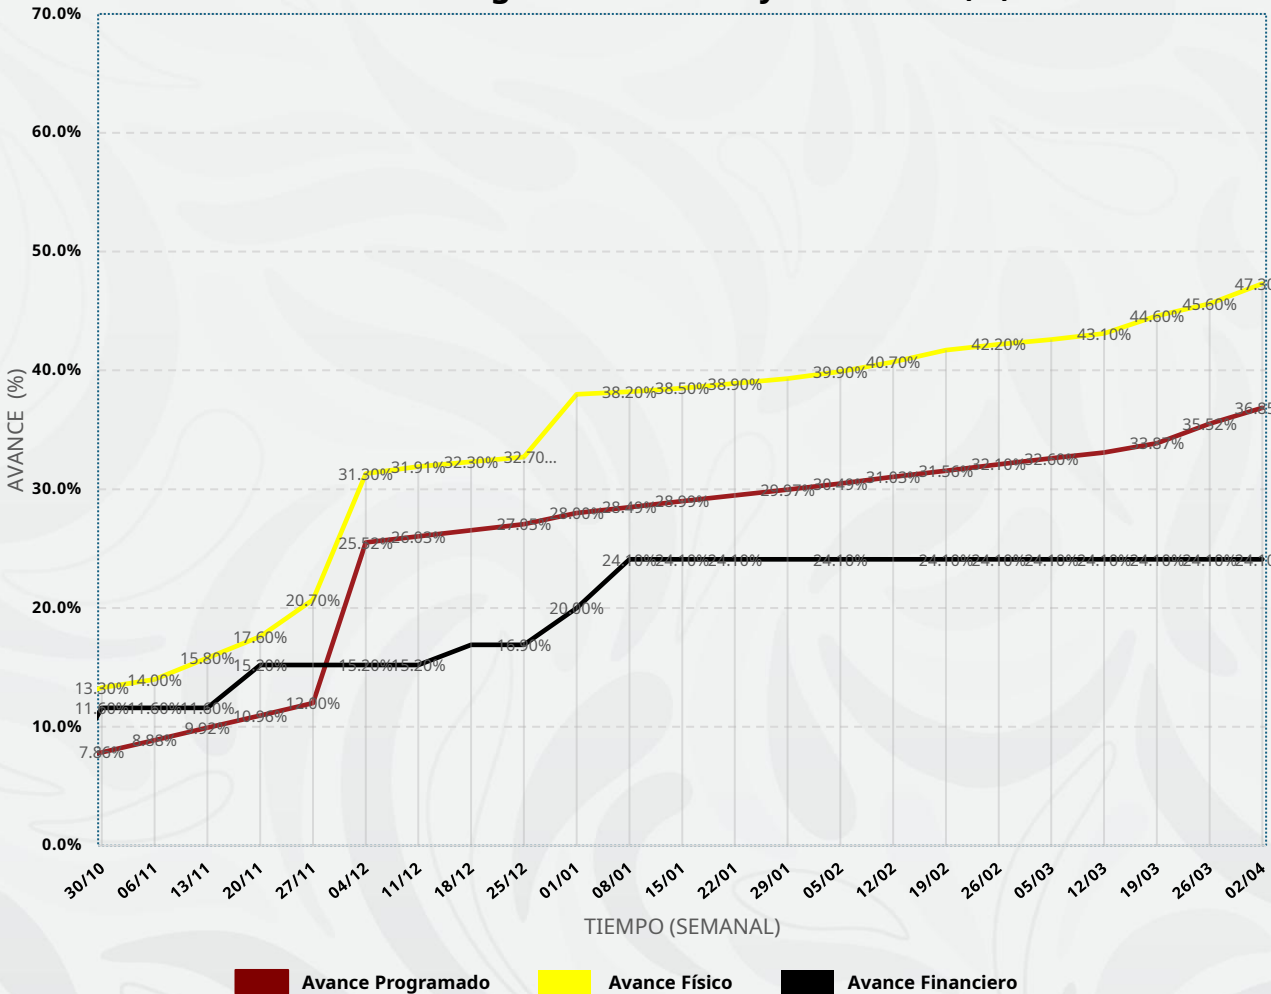

|                              | 20 al 26 de marzo | 27 de marzo al 02 de abril |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 58                | 53                         |
| Maquinaria                   | 14                | 15                         |
| Frente de trabajo            | 9                 | 7                          |
