

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 15.25%
- Real: 21.59%
- Semanal: 1.35%
- Financiero: 19.5%

Avance 2025

- Programado: 70.0%
- Real: 90.0%
- Semanal: 5.0%
- Financiero: 60.1%

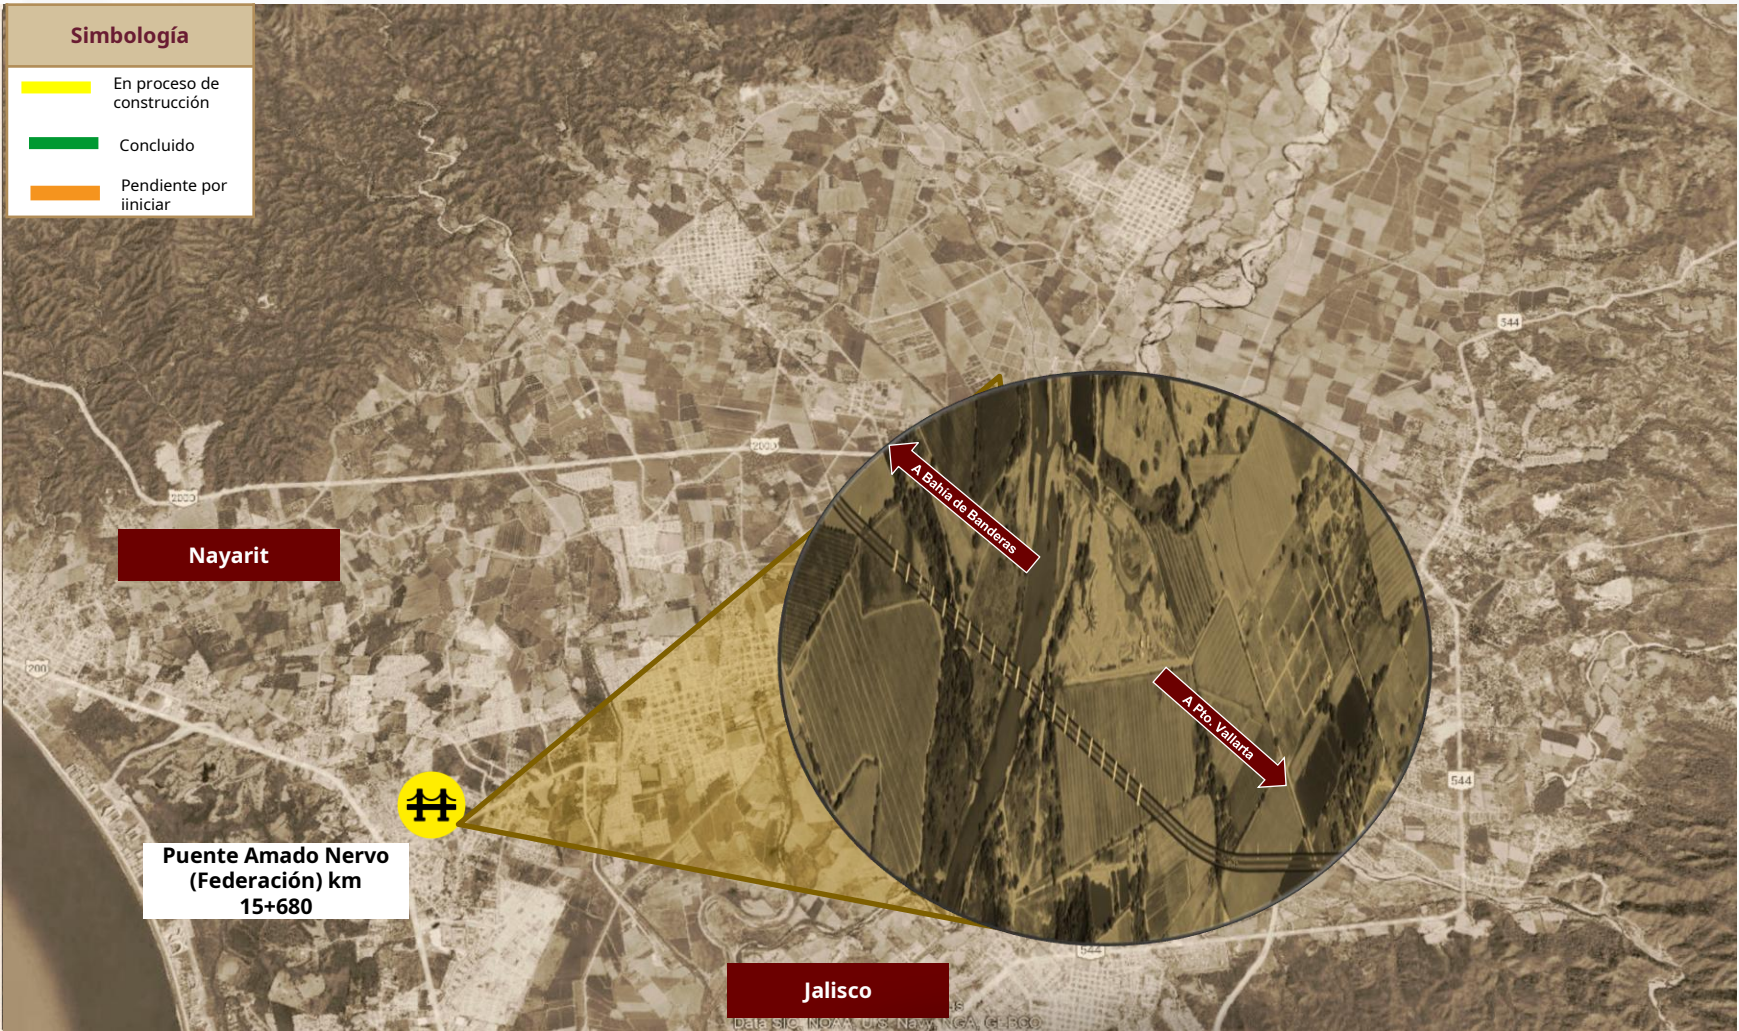

Inversión total 2025-2026: 900.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | 0.4 km de Puente

Meta total: 1 Puente | 0.798 km
Accesos | 1.222 km

Inicio: 14 de julio de 2025
Término: 31 Diciembre de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre

479,471 habitantes beneficiados

2,700 empleos generados

25 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo(Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 14 al 20/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	7,689.00	54.8%	6,353.0	1,270.60	0	Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco
Cortes	m3	10,823.0	0	0.0%	10,823.0	2,164.60	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	30,145	18.7%	130,972.0	3,881.00	0	Se continuan trabajos de pedraplén en lado Jalisco.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	0.00	0	
Losa de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	0.00	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	0.00	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	116	92.1%	10	2	2	Se tienen armados 12 pilotes adicionales
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	66	52.4%	60	5	3	Se tienen coladas 66 columnas del apoyo 14 al 21
Cabezales	pza.	21	8	38.1%	13	1	2	Se tienen colados los cabezales de los apoyos del 14 al 21
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	7	4.4%	153	6	6	Se tienen coladas 7 trabes y se trabaja en los armados de 2 adicionales.
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	0	0.0%	160	8	0	
Losas y Diafragmas	m3	4,450.40	0	0.0%	4,450.40	0	0	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	0	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	0	0.0%	4.00	1	0	Llegada de cajones prefabricados al sitio de los trabajos
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	0.8	40.0%	1.20	1.2	0.1	Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

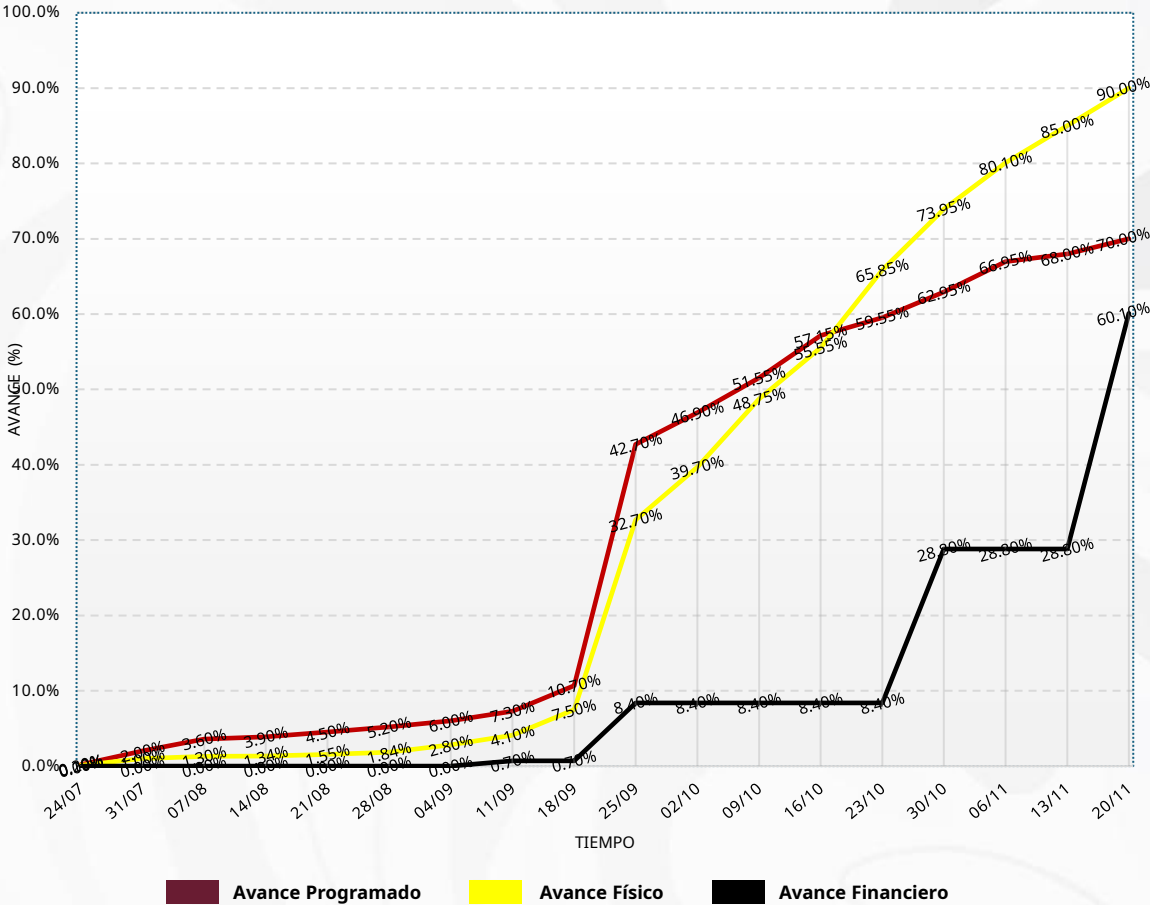

	07 de noviembre al 13 de Noviembre	14 de noviembre al 20 de Noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	86	77
Maquinaria	19	19
