

PSV Arco Norte Colima

Avance global

- Programado: 22.18%
- Real: 35.47%
- Semanal: 1.21%
- Financiero: 25.92%

Avance 2025

- Programado: 65.06%
- Real: 100.00%
- Semanal: 3.55%
- Financiero: 76.00%

 **Inversión total 2025-2026:** 369.7 mdp
Inversión 2025: 127.4 mdp

 **Meta total:** 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.
Meta 2025: 200.6 m (34.1% (cimentación y subestructura))

 **Inicio:** 10 de junio de 2025
Término: 09 de junio de 2026
Término meta 2025: diciembre

 **306,810** habitantes beneficiados

 **1,109** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular “Arco Norte”	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V
	• Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V



Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

PSV Libramiento Arco Norte

Colima


Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	14/11/25 al 20/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos						
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00	
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00	
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00	
Terracerías						
Corte (m³)	9,295.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	
Terraplén (m³)	9,292.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	
Subyacente (m³)	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	
Subrasante (m³)	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	
Subestructura						
Pilas (pza)	76.00	65.00	11.00	4.13	6.00	
Zapatas (pza)	20.00	16.00	4.00	1.25	1.00	
Columnas (pza)	42.00	32.00	10.00	2.63	0.00	
Cabezales (pza)	22.00	16.00	6.00	1.38	2.00	



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

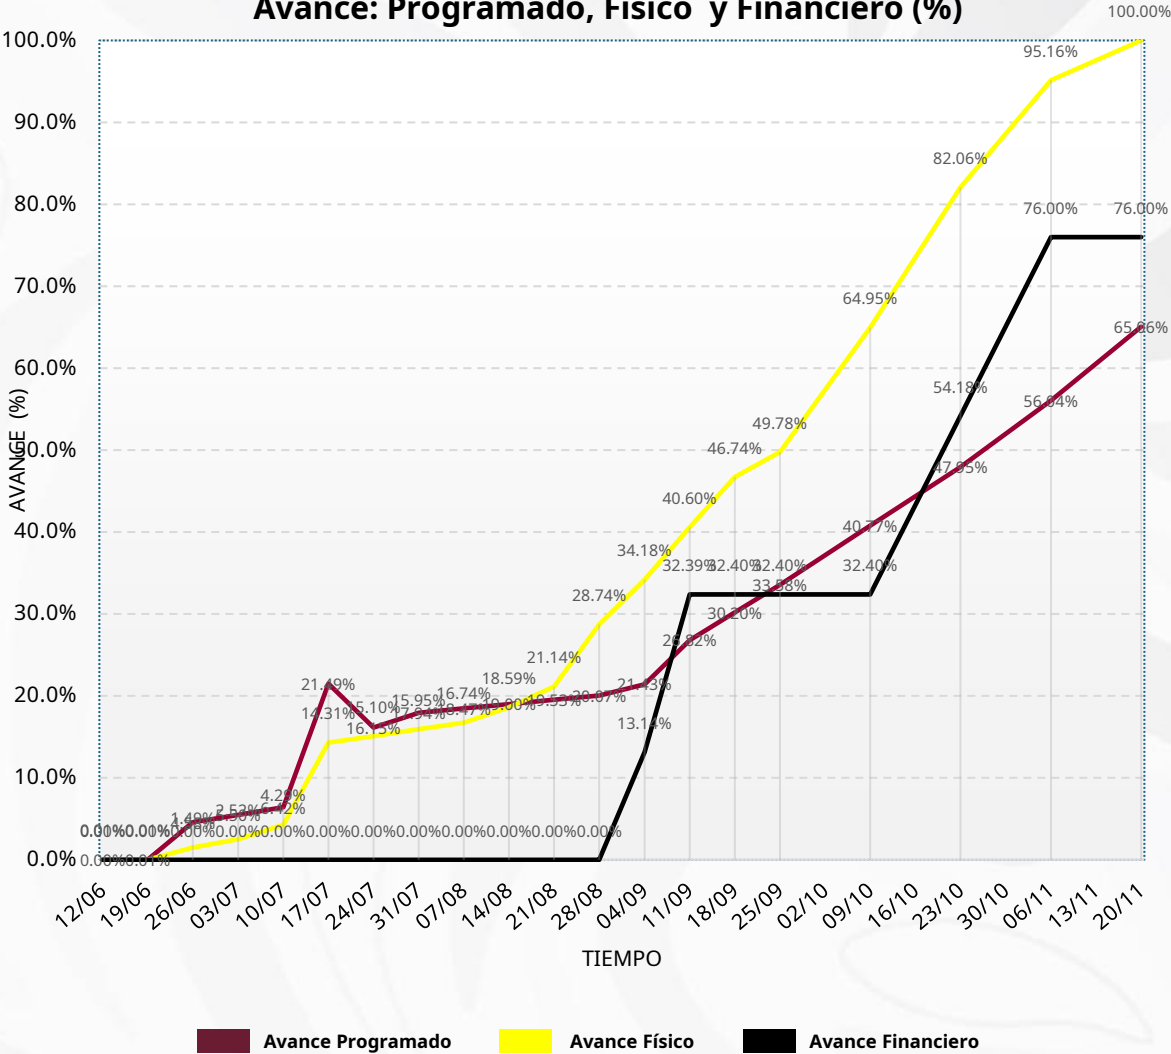

	07 al 13 de noviembre	14 de noviembre al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	80	85
Maquinaria	17	18
