

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

- Programado: 27.99%
- Real: 45.04%
- Semanal: 1.40%
- Financiero: 26.30%

Avance 2025

- Programado: 60.55%
- Real: 97.43%
- Semanal: 3.03%
- Financiero: 45.04%

 **Inversión total 2025-20265:** 575.4 mdp
Inversión 2025: 227.4 mdp

 **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)
Meta 2025: 0.55 km (**46% del puente (cimentación y subestructura)**)

 **Inicio:** 03-Julio de 2025
Término: Julio de 2026
Término meta 2025: Diciembre

 **157,048** habitantes beneficiados

 **1,431** empleos generados


 **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

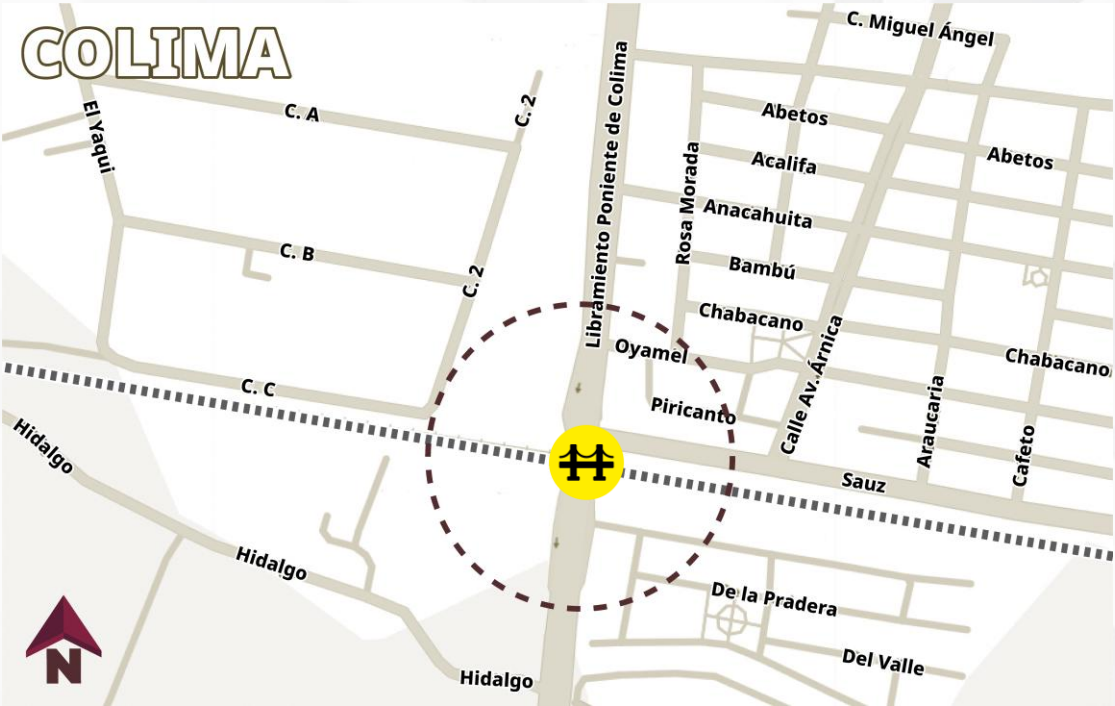

PSF Arco Sur
Colima




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	14/11/25 al 20/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.0	117.32	136.68	2.32	0.68	
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2, 322.01	155.54	192.54	0.00	
Construcción de cruce prov. FCCC (pza)	223.00	216.57	6.43	14.58	0.00	
Losa plana para mantenimiento CONAGUA (m3)	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	
SUBESTRUCTURA PUENTE LATERAL						
Pilas (pza)	4.00	4.00	0.00	0.19	0.00	Partida concluida.
Cabezales (pza)	2.00	2.00	0.00	0.17	0.00	Partida concluida.
Accesos (m3)	210.02	12.45	197.57	14.16	0.00	
Superestructura puente lateral (pza)	4.00	4.00	0.00	0.43	0.00	Partida concluida
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	962.25	32.31	50.62	0.00	
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	737.76	52.66	33.01	20.32	
Accesos al PSF (m)	896.00	58.66	837.34	35.12	17.03	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

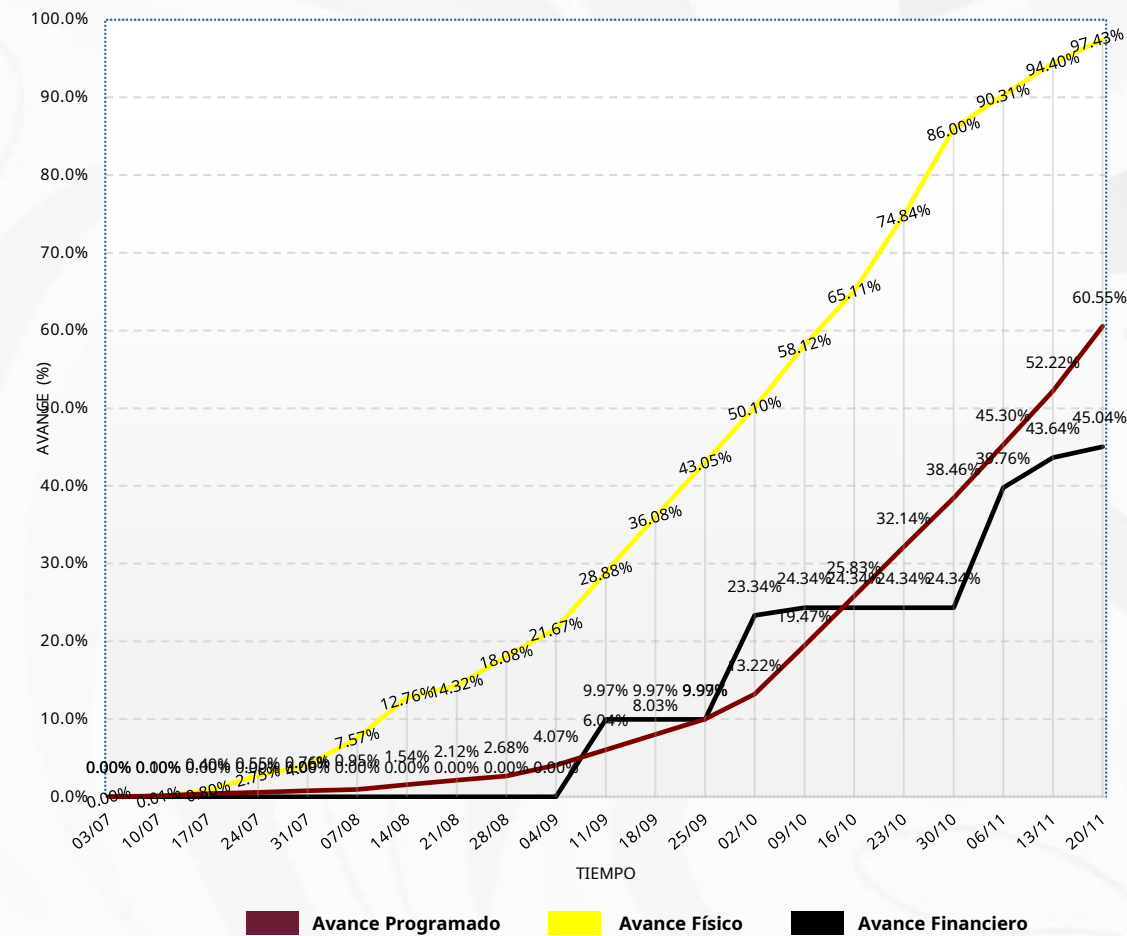

	07 de al 13 de noviembre	14 de al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	258	268
Maquinaria	52	45
