

Puente El Chical

Colima

Avance global

• Programado: 15.12 %	• Semanal: 5.85 %
• Real: 33.01 %	• Financiero: 19.50 %

Avance 2025

• Programado: 66.32%	• Semanal: 10.22 %
• Real: 100.0 %	• Financiero: 85.52%

 **Inversión total 2025-2026:** 110 mdp
Inversión 2025: 20.6 mdp


 **Meta total:** 0.736 km
Meta 2025: 24.0 % del Puente

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: 10 de agosto, 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre, 2025

 **4,053** habitantes beneficiados

 **330** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

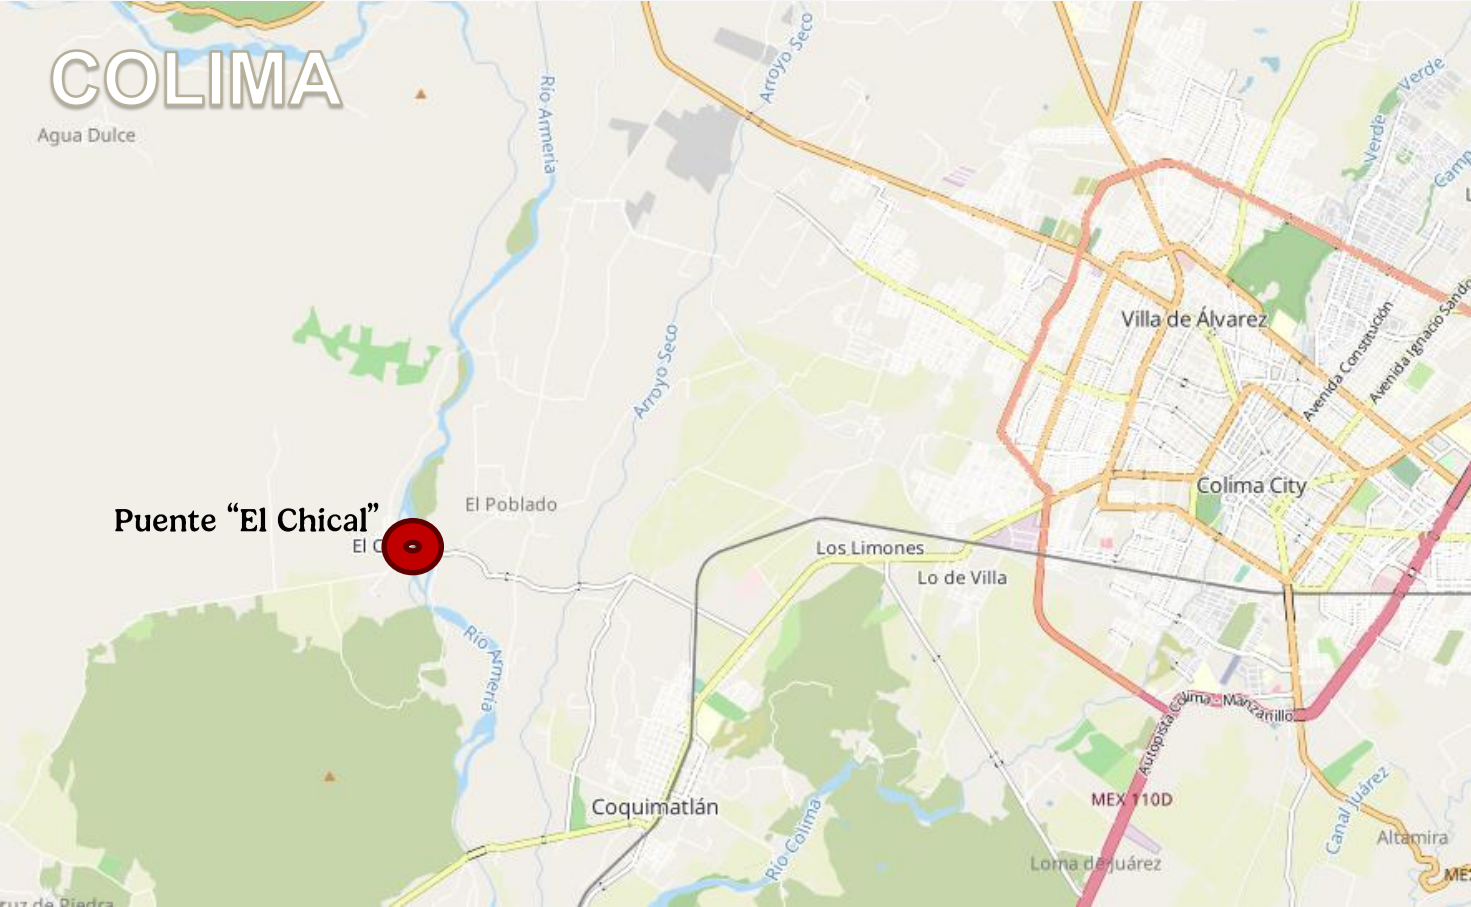


Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ---

Puente El Chical

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	14/11/25 al 20/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	
Columnas (Pza)	30.0	30.0	0.0	3.0	6.0	
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	7.0	3.0	1.0	1.0	
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	15.0	30.0	5.0	4.0	
Montaje de trabes (Pza)	45.0	0.0	45.0	10.0	0.0	
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	0.0	648.0	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	0.0	720.0	0.0	0.0	
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	99,850.0	25,150	8,000	13,000	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

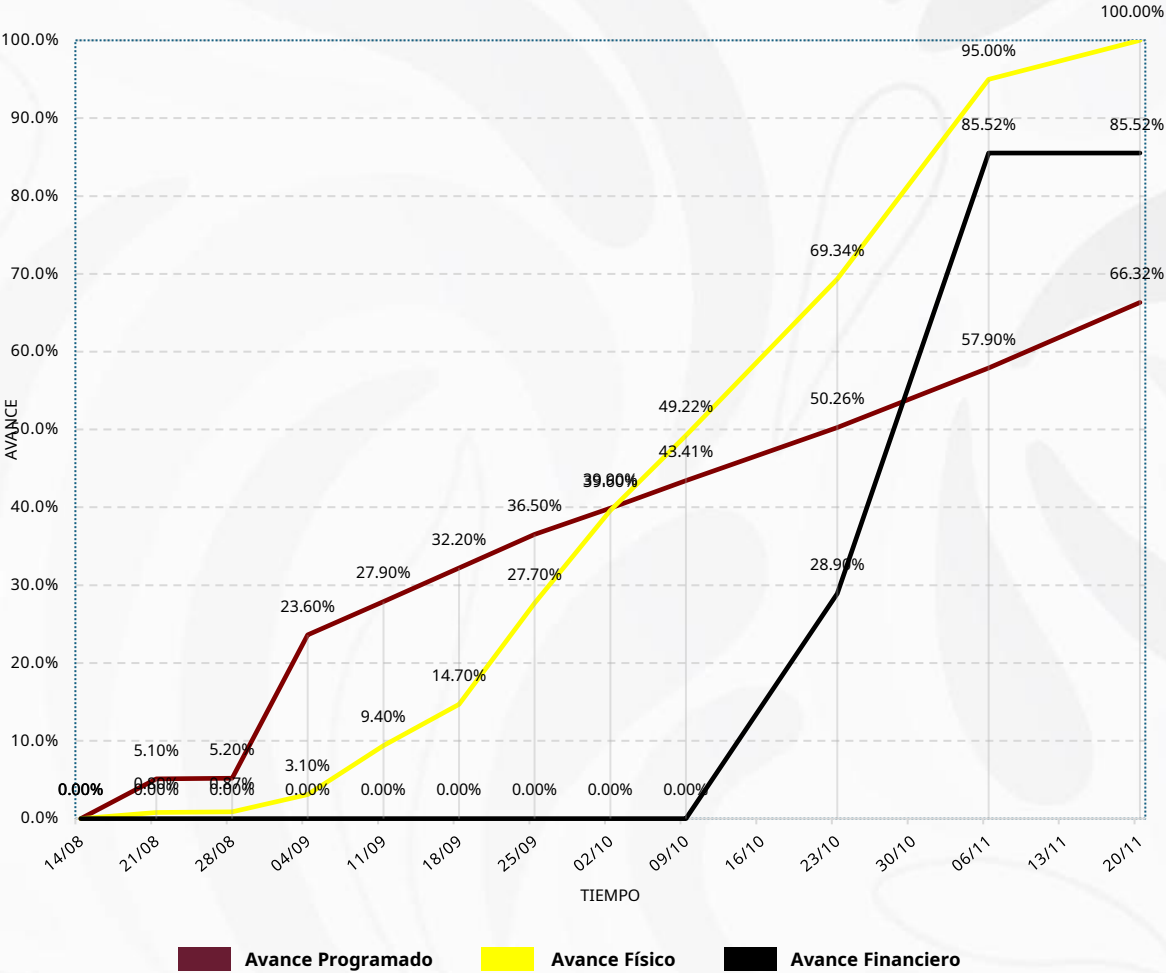

	07 de Noviembre al 13 de Noviembre	14 de Noviembre al 20 de Noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	35	33
Maquinaria	7	6
